Gestión de Proyectos

Introducción

PUCP

¡Hola, soy Pierre!



- Magister en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología e Ingeniero Industrial con 12 años de experiencia liderando proyectos Agile de transformación digital en el sector financiero y mejora continua de procesos productivos aplicando la filosofía Lean.
- Soy Senior Program Manager en el BBVA, Docente PUCP y Consejero de Carrera de Ingeniería Industrial en la PUCP.
- He trabajado en Opplus Perú, Fimar, Backus, Belcorp y el Diario El Comercio.

Actividad


Presentación

Identificación de ~~expectativas~~




Objetivo del curso

- Reconocer la importancia de las prácticas de gestión de proyectos para la obtención de los resultados esperados.
- Desempeñarse adecuadamente como miembro de un equipo en un proyecto de gran alcance.
- Aplicar prácticas de gestión de proyectos en la dirección de proyectos de mediano alcance.




PUCP

Metodología

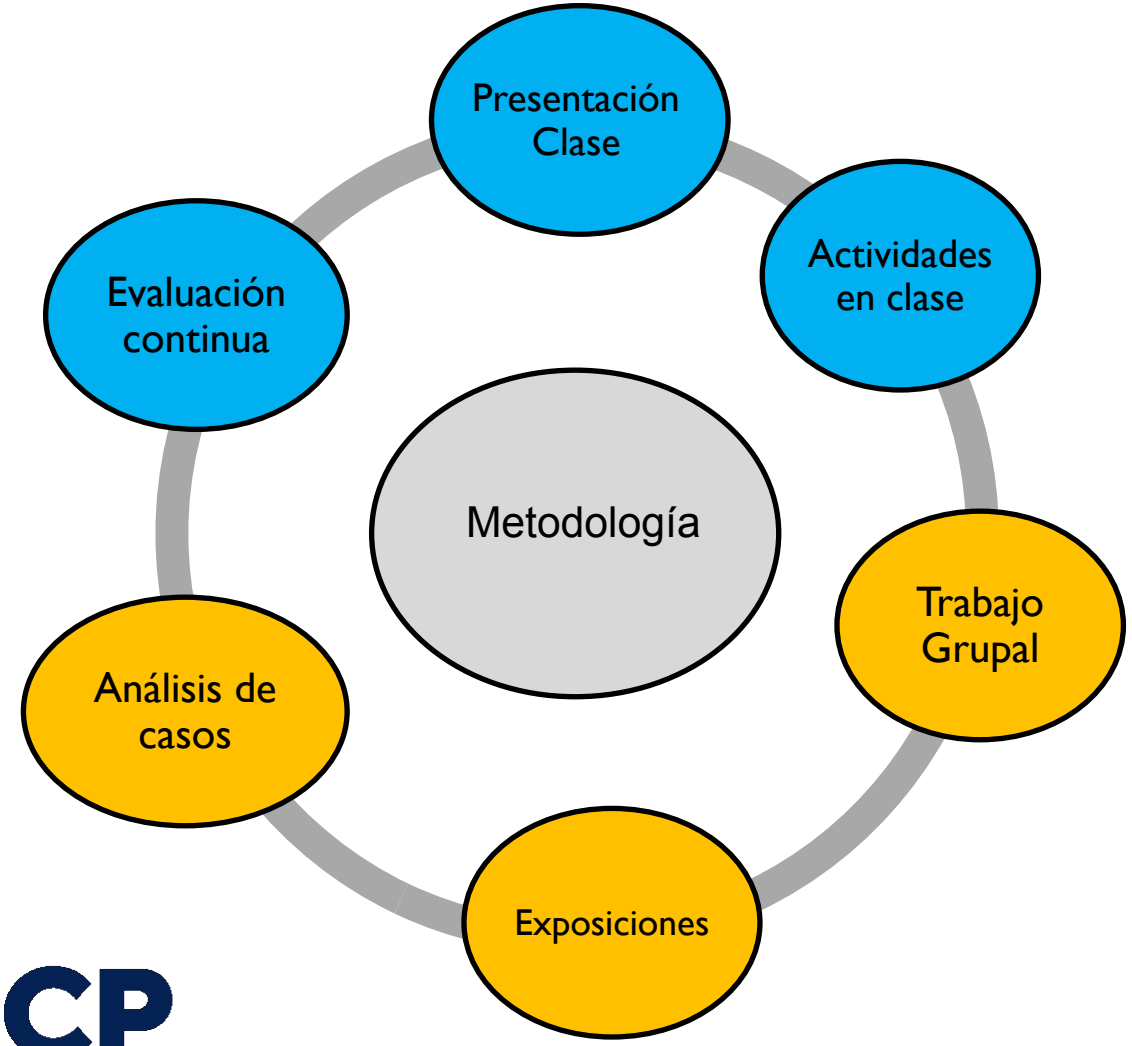


PUCP

Sesión de Clase

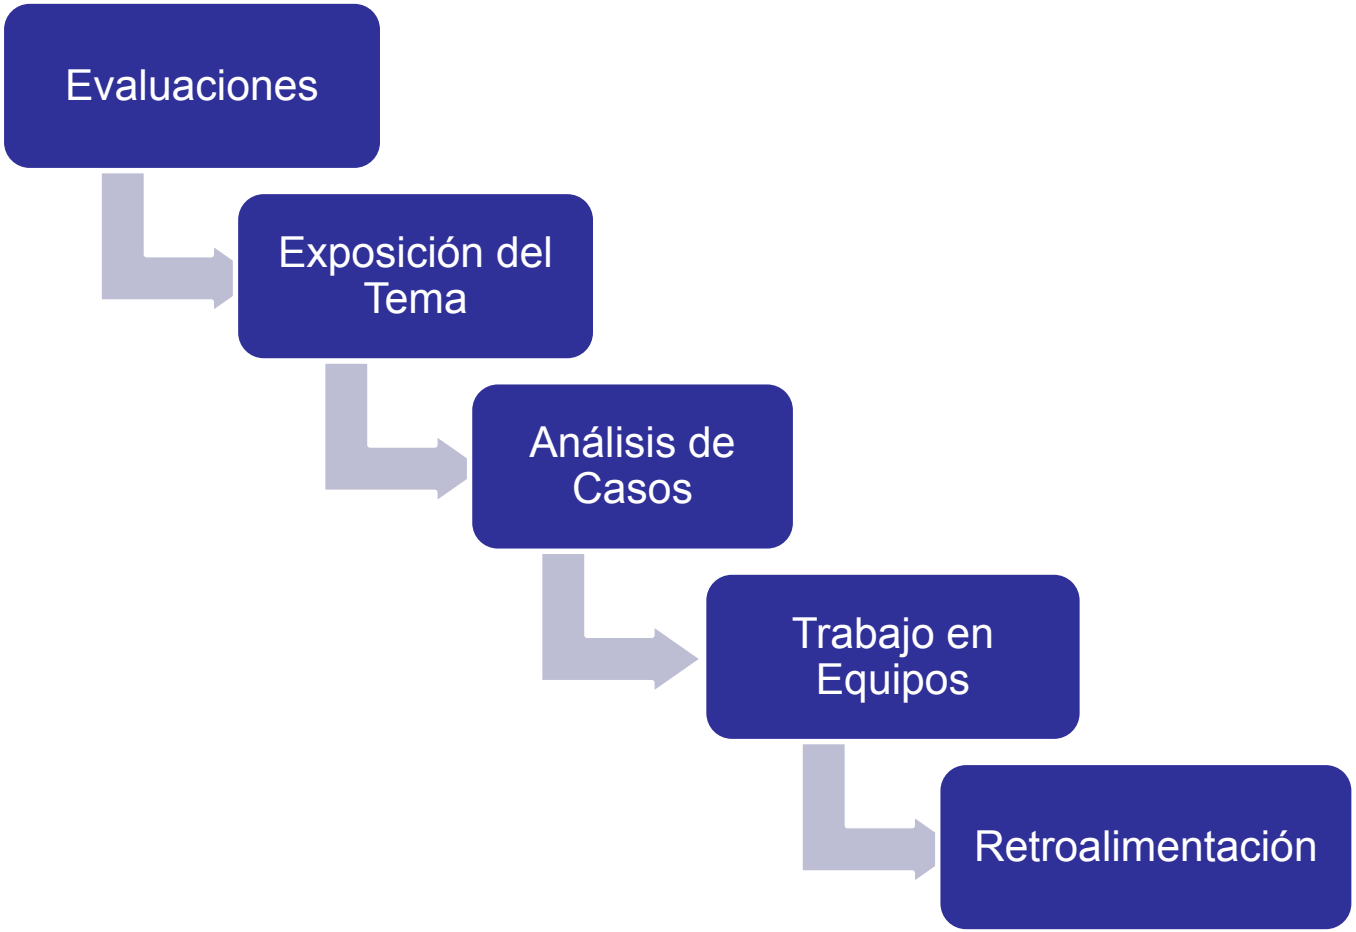

PUCP

Proyecto del Curso

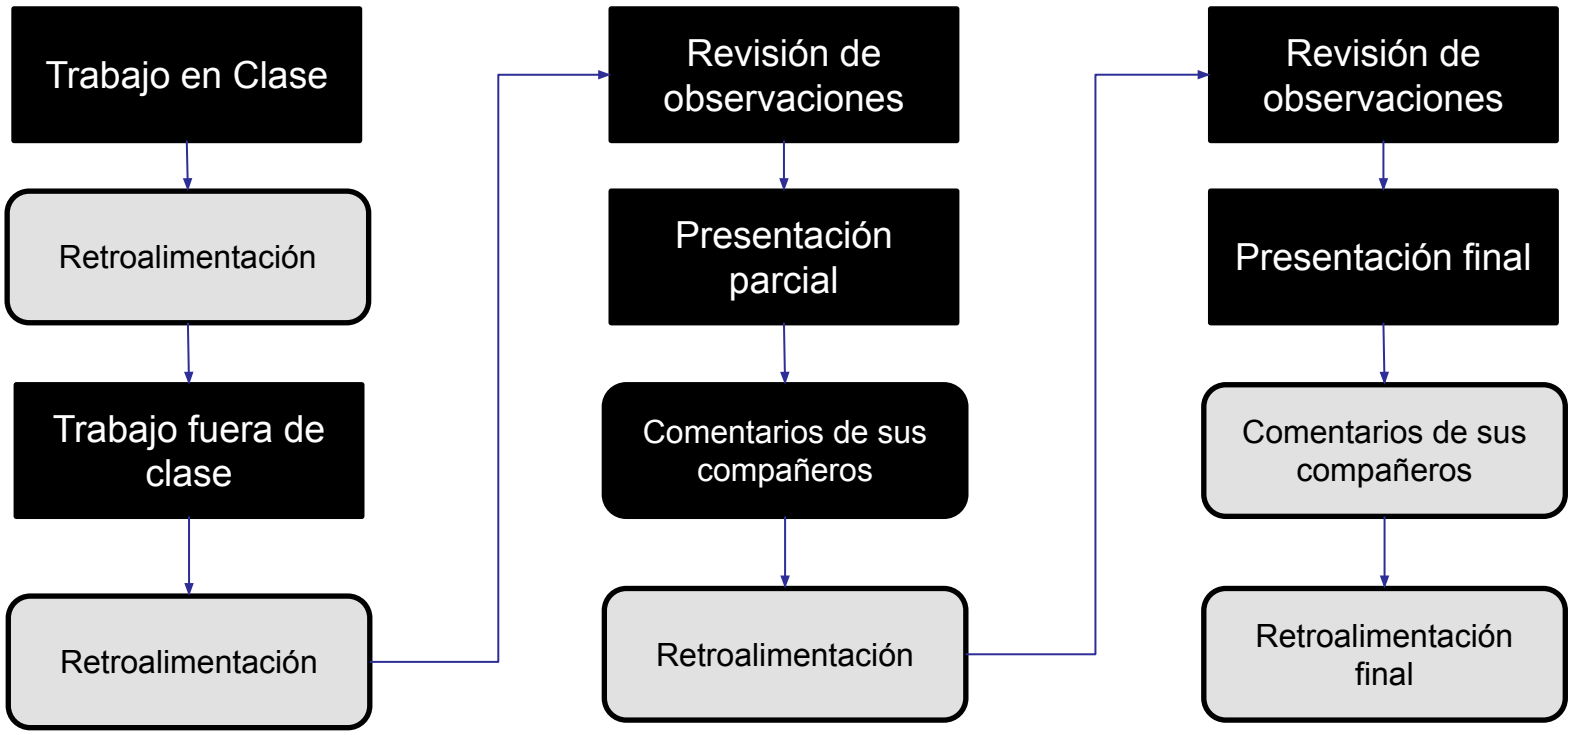

PUCP

Proyecto del Curso

- Equipos de 5 personas
- Entrega según el cronograma (ver enlace en Paideia).
- Retroalimentación antes del siguiente entregable.
- Se debe indicar si algún miembro del equipo no aportó al avance.
- Las observaciones corregidas se entregarán en la presentación parcial; sin embargo, las consultas pueden realizarse en cualquier momento.
- La presentación final incluirá todo el trabajo desarrollado durante el curso.


PUCP

Evaluación continua

- Evaluaciones cada dos semanas en clase (5 evaluaciones)
- Cuestionarios de opción múltiple
- Evaluación parcial y final (en semana de exámenes)

PUCP

Esquema de evaluación

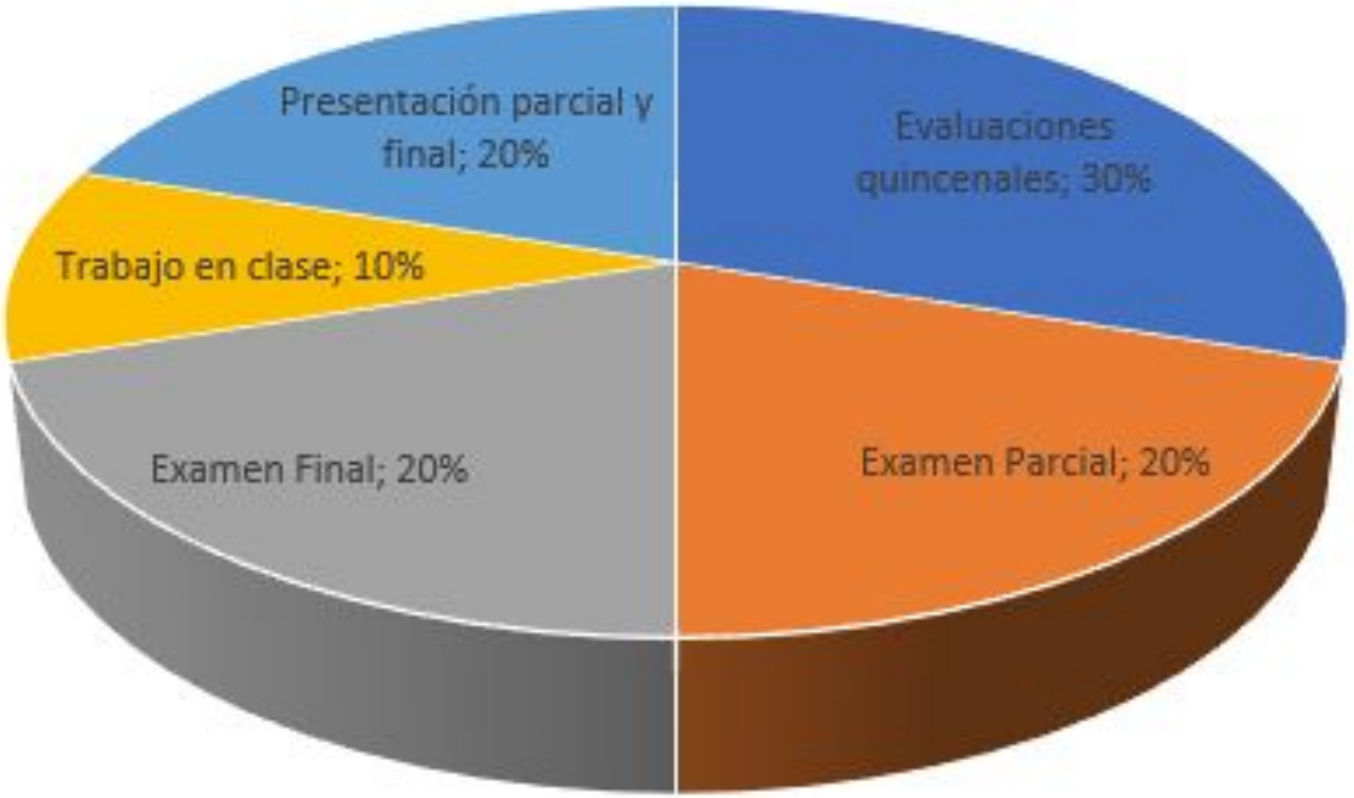


PUCP

Indicaciones









PUCP

Gestión de Proyectos

Conceptos Básicos de Gestión de Proyectos

Sesión 1

PUCP

Actividad

Conceptos

Pensemos en proyectos






¿Qué observan en la imagen?


Parecen iguales... pero
cada proyecto es único

Un **proyecto** es un esfuerzo temporal llevado a cabo para generar un producto, servicio o resultado único.

(**PMBOK** 2021)



PUCP

Un **proyecto** es un esfuerzo temporal para alcanzar uno o más objetivos definidos

(ISO 21506:2024)




PUCP

Una iniciativa temporal en un contexto único, emprendida para crear valor

(**PMBOK** 2025)



PUCP

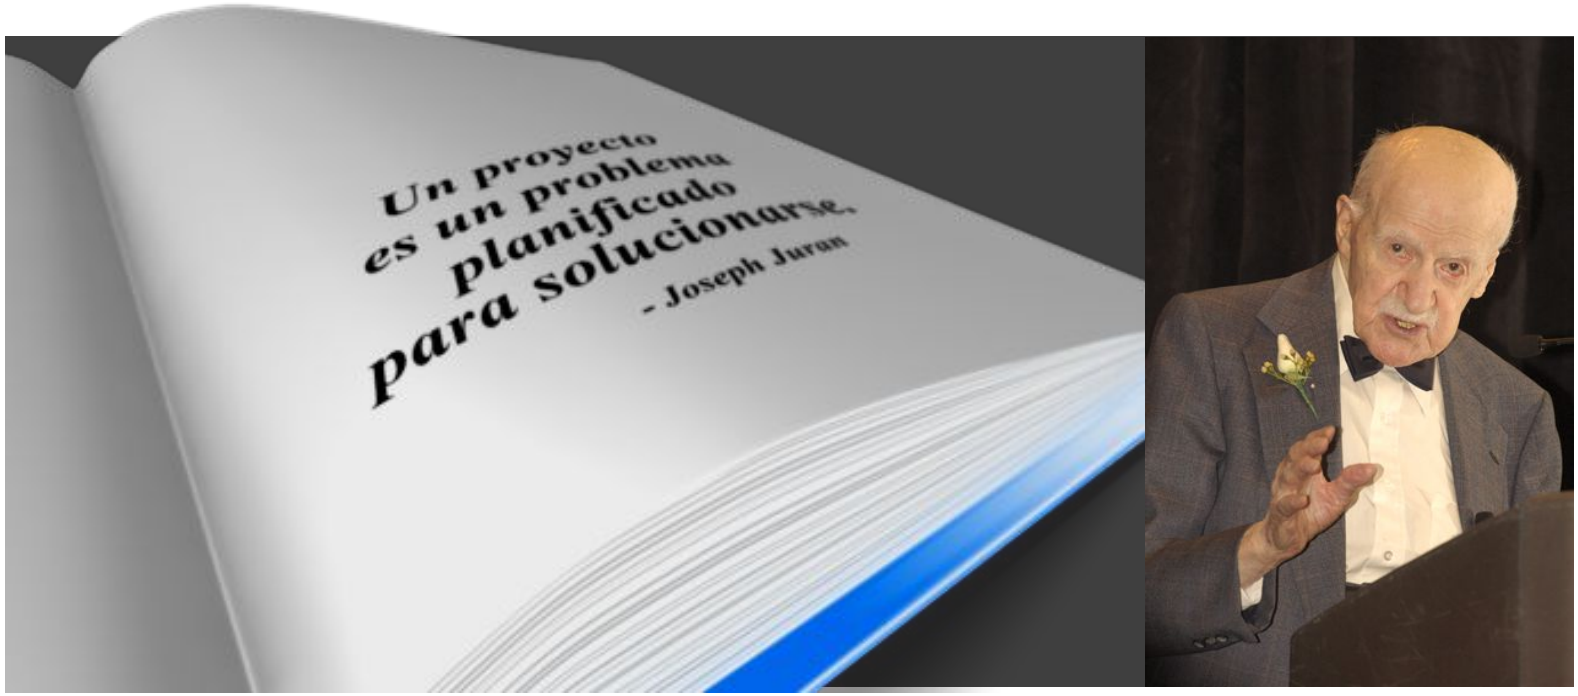
Un proyecto
es un problema
planificado
para solucionarse.
- Joseph Juran

PUCP


Gestión de Proyectos



- **Gestión de proyectos** es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para alcanzar o supercar el valor previsto

(PMBOK 2025)

PUCP

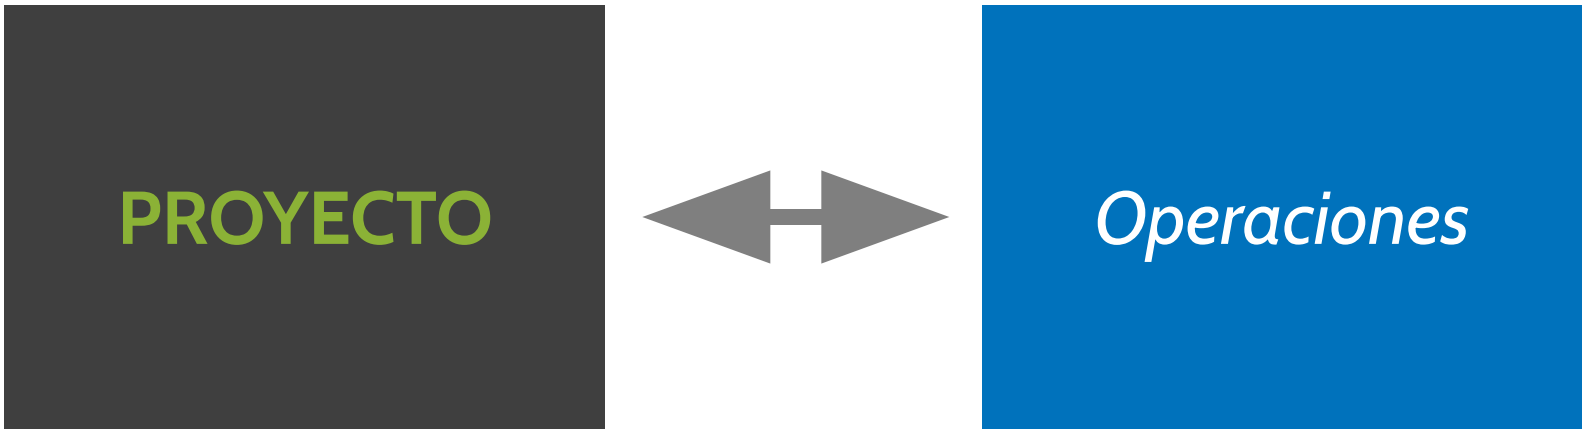

PUCP

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Requisitos → Diseño → Construcción → Pruebas → Entrega

Entrega → Operación → Mantenimiento → Retiro




PUCP

Enfoques de desarrollo



PUCP

Ciclo de Vida

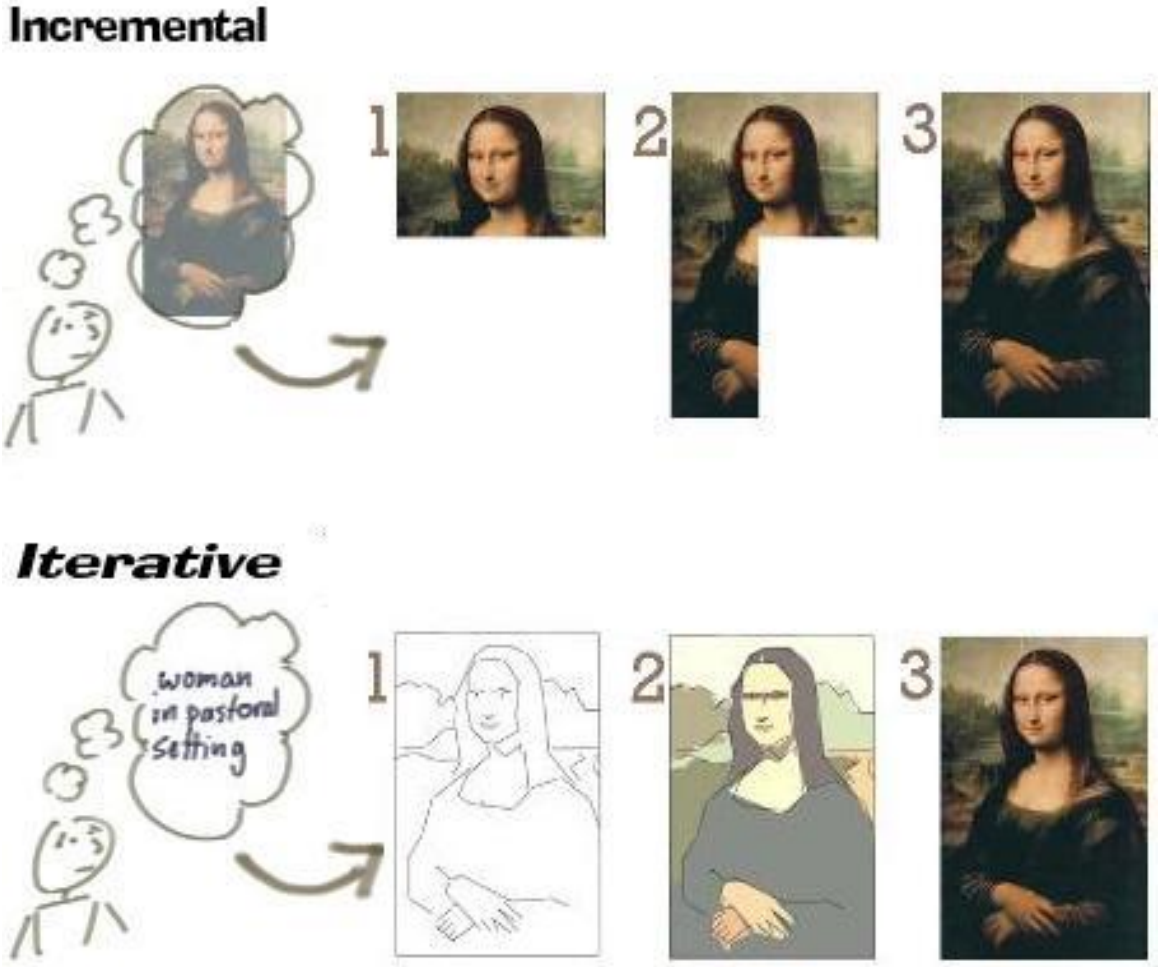


PUCP

Jeff Patton Iterative and Incremental

Roles

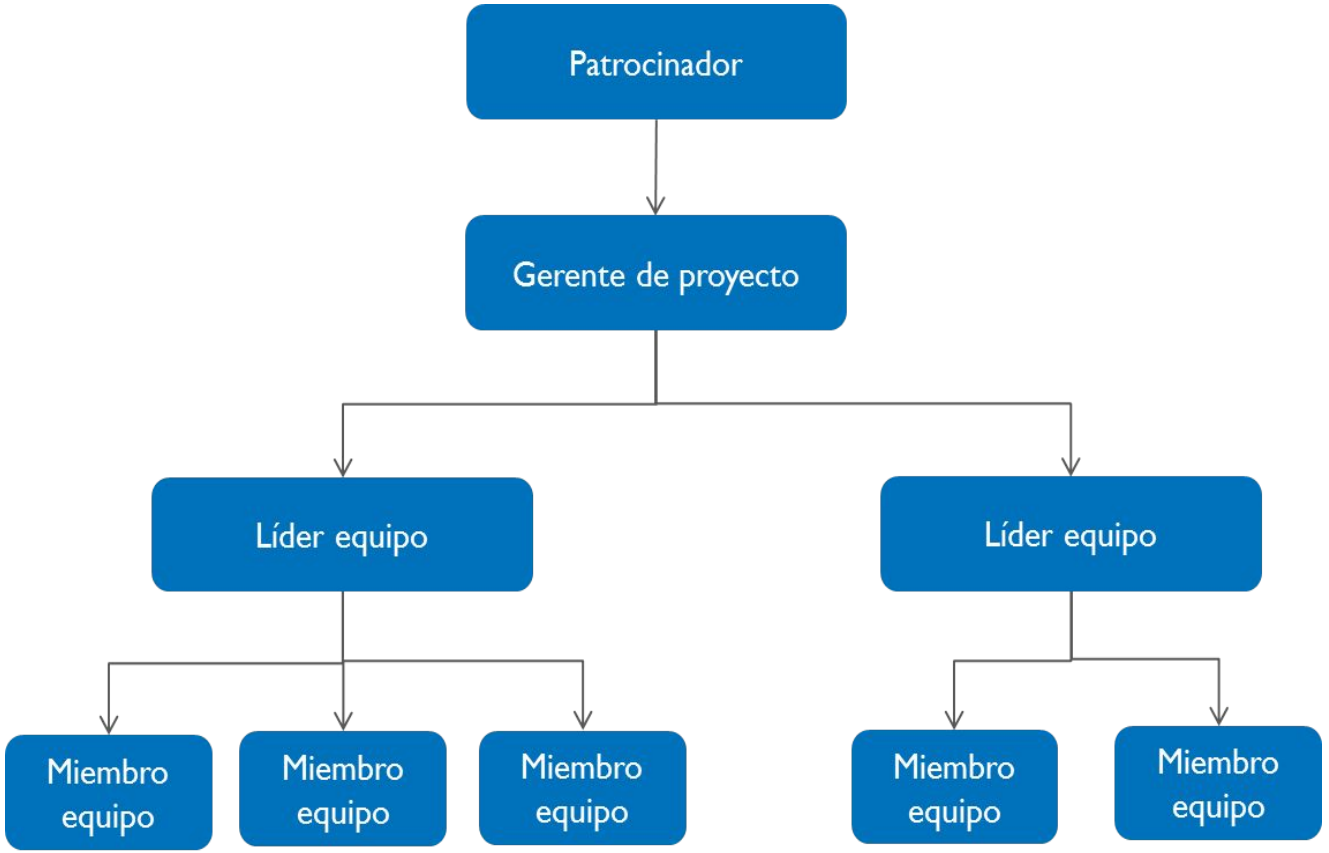


Patrocinador
Gerente de proyecto
Líder equipo
Líder equipo
Miembro equipo
Miembro equipo
Miembro equipo
Miembro equipo
Miembro equipo


PUCP

Interesados



Un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse afectado por una decisión, actividad o resultado de un portafolio, programa o proyecto.

- Individuos u organizaciones que participan activamente en el proyecto.

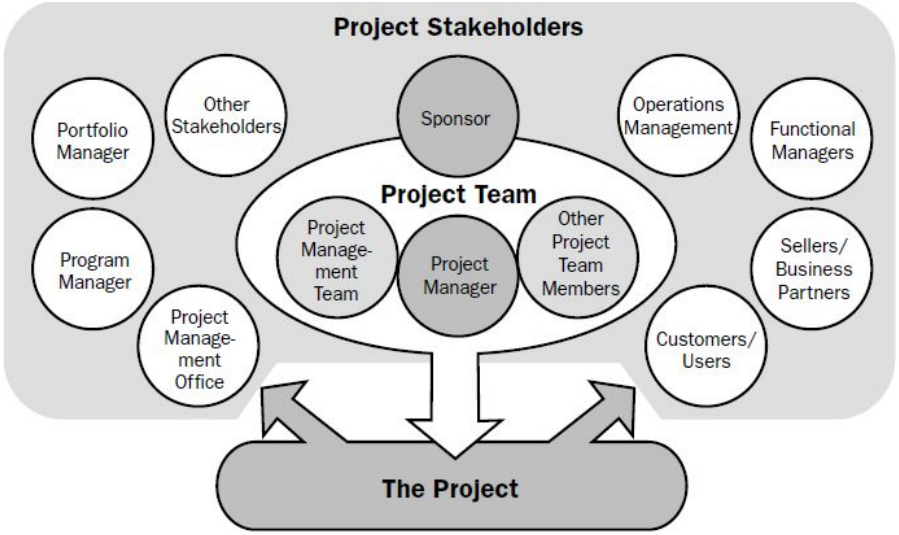

PUCP



SPONSOR

Es la persona o grupo que **ofrece recursos** financieros, monetarios o en especies para el proyecto.

Es la persona nombrada por la organización ejecutante para **lograr los objetivos** del proyecto.



GERENTE DE PROYECTO

PUCP

Plan de Proyecto



Documento formal y aprobado que define cómo se **ejecuta**, **monitorea** y **controla** el proyecto.

Puede ser resumido o detallado.

Puede incluir uno o más planes subsidiarios y otros documentos de planificación.


PUCP

Adaptación (tailoring)

- La adaptación consiste en la adecuación deliberada del enfoque, la gobernanza y los procesos de la dirección de proyectos para que resulten más adecuados para el entorno y el trabajo en cuestión.

PUCP

Factores para la adaptación

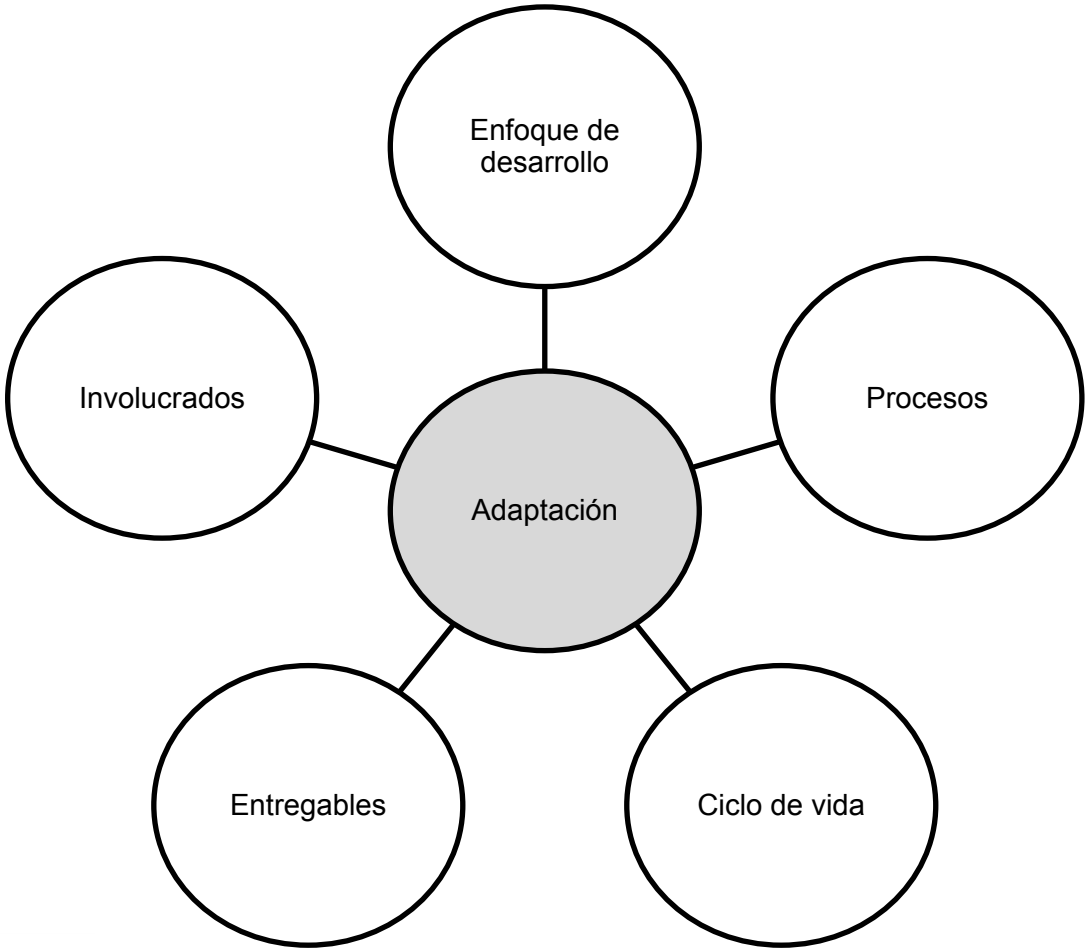

PUCP


Beneficios de la adaptación

- Compromiso de los miembros del equipo que ayudaron a adaptar el enfoque.
- Enfoque orientado al cliente
- Uso más eficiente de los recursos del proyecto



PUCP

La conexión entre la estrategia, los proyectos y la entrega de valor

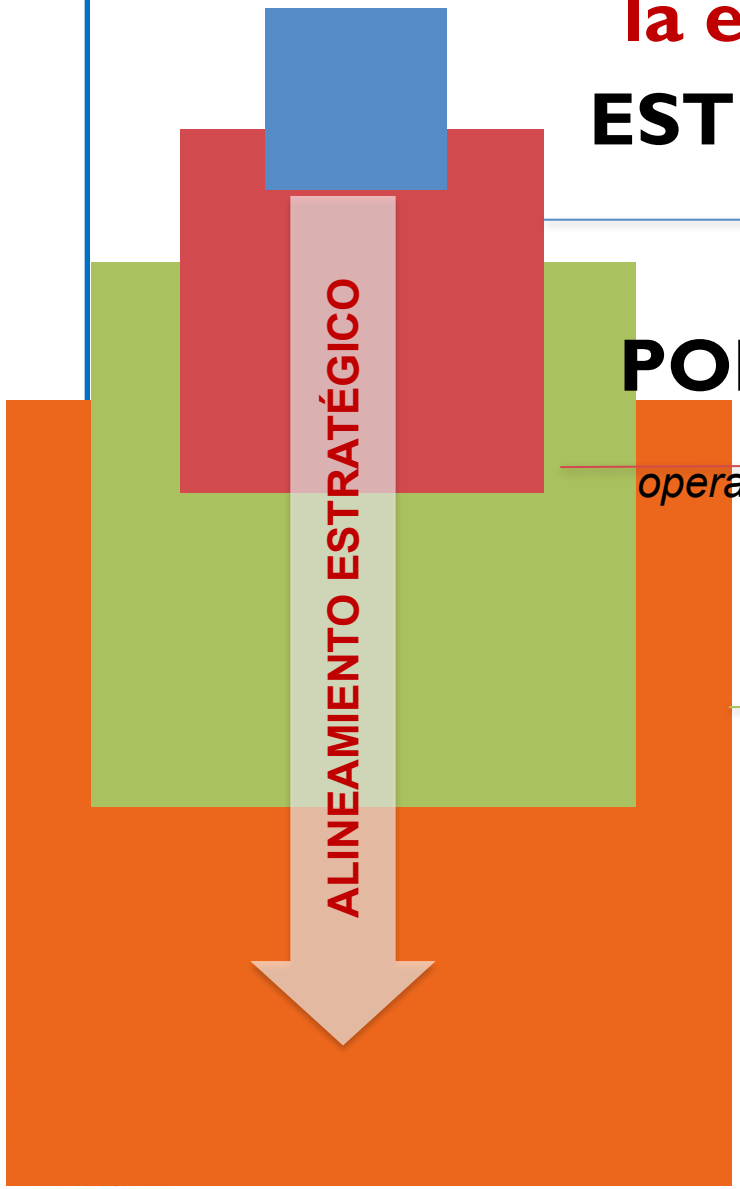

ESTRATEGIA

Define la dirección de la organización, sus objetivos estratégicos y la forma en que busca crear valor

PORTAFOLIO

Agrupa, prioriza y balancea programas, proyectos y operaciones para maximizar la entrega de valor y lograr los objetivos estratégicos

PROYECTOS


Son iniciativas temporales en un contexto único, emprendidas para crear valor

OPERACIONES

Sostienen y amplían el valor generado por la organización a través de la producción continua de bienes y servicios


La estrategia se traduce en ejecución mediante un sistema de entrega de valor, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Entorno

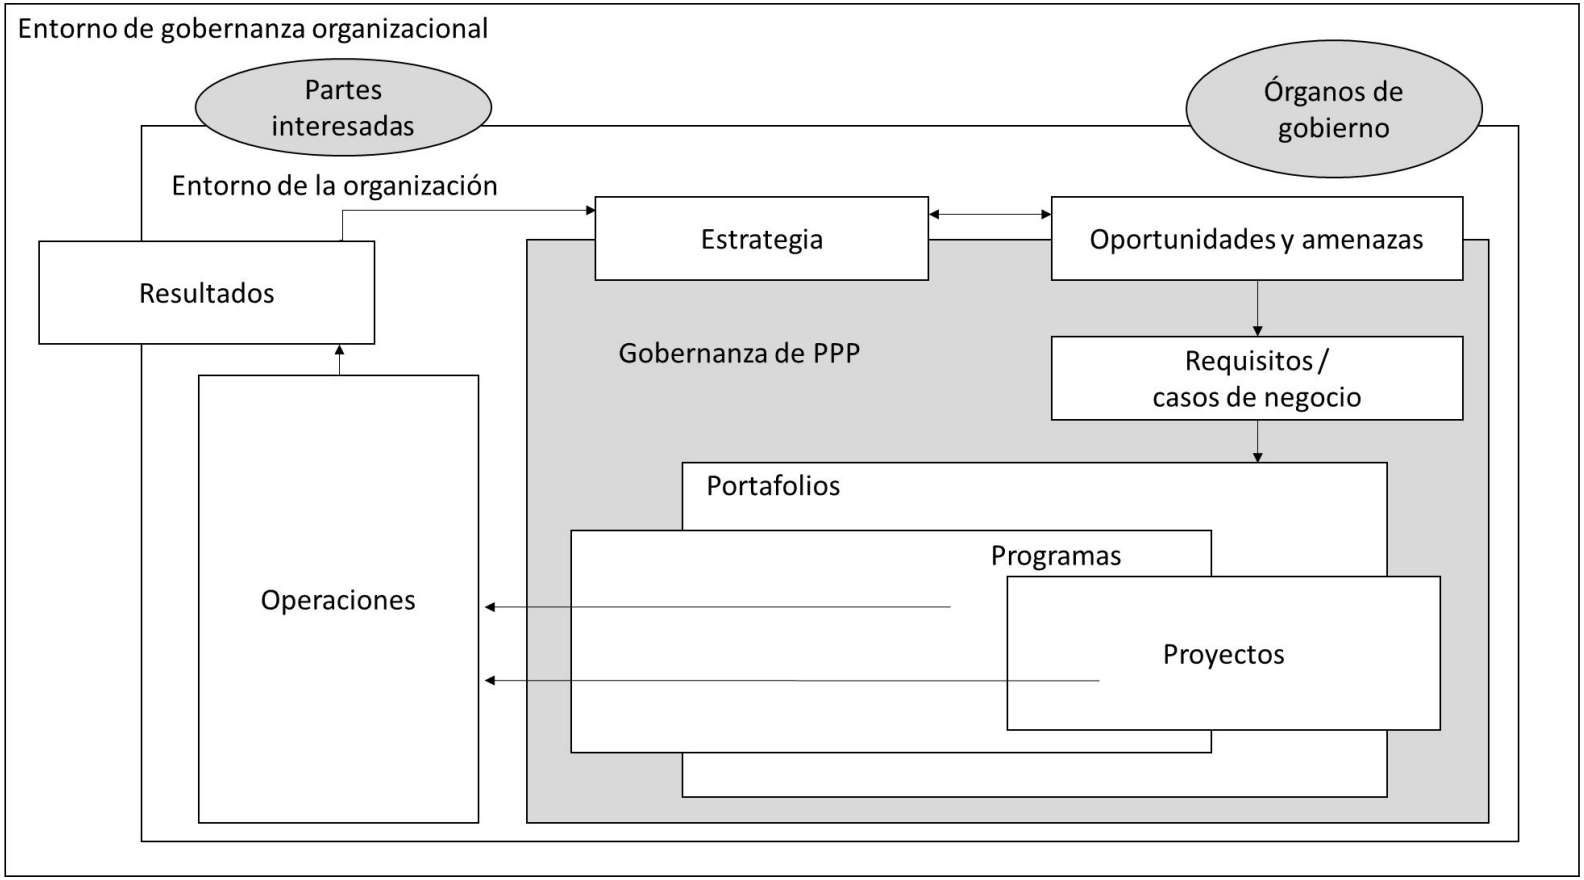

NTP ISO 21505:2017

La Oficina de Dirección de Proyectos

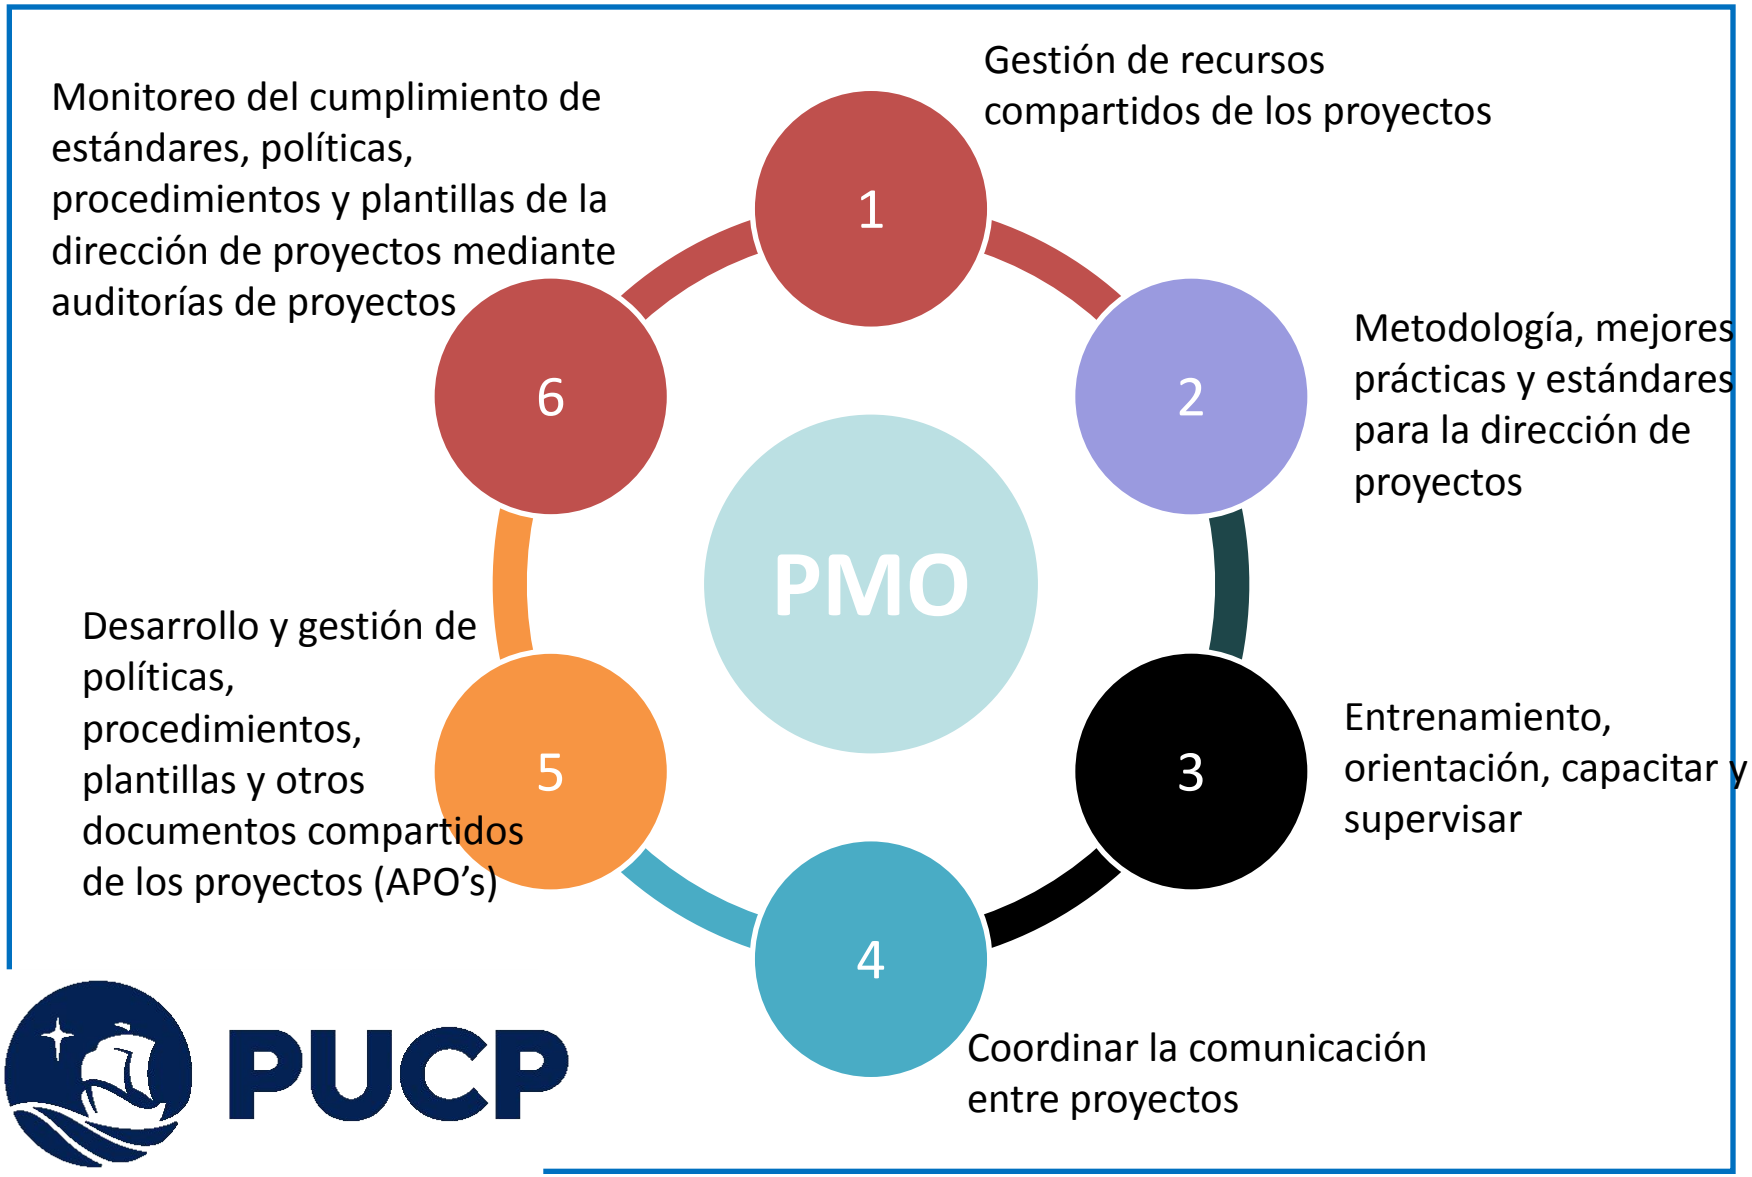

PUCP

La Oficina de Dirección de Proyectos


Tipo de PMO	Descripción
Apoyo	Desempeñan un rol consultivo para los proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de proyectos. Esta PMO ejerce un grado de control reducido
Control	Proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes medios. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. Este cumplimiento puede implicar: • La adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos; • El uso de plantillas, formularios y herramientas específicos; y • La conformidad con los marcos de gobernanza
Directiva	Ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de los mismos. Los directores de proyecto son asignados por la PMO y rinden cuentas a ella. Estas PMOs ejercen un grado de control elevado

PUCP

El Entorno del Proyecto

- Los proyectos existen y operan en entornos que pueden influir en ellos. Estas influencias pueden tener un impacto favorable o desfavorable en el proyecto.

- Dos categorías principales de influencias son los factores ambientales de la empresa **(FAE)** y los activos de los procesos de la organización **(APO)**.

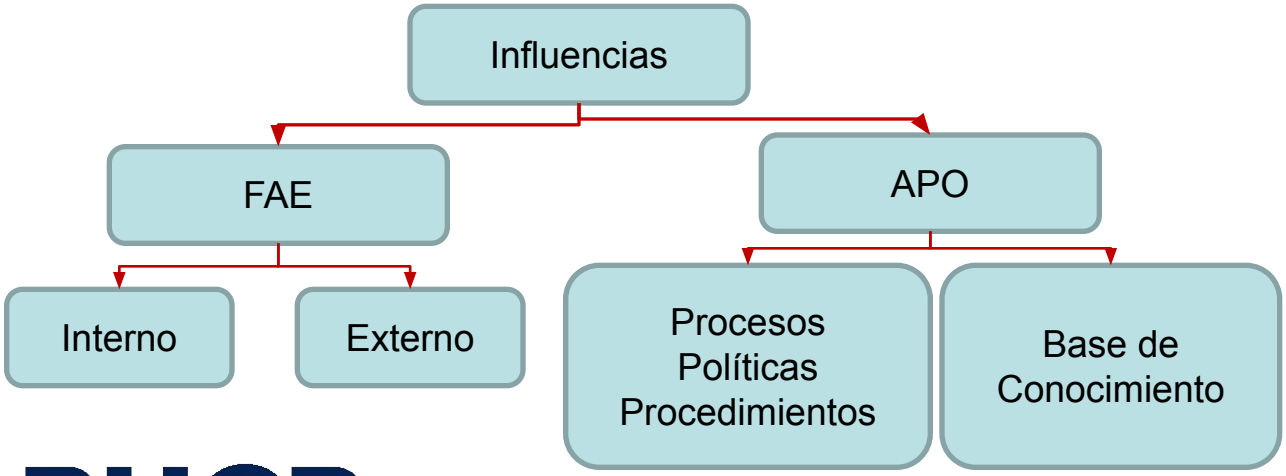

PUCP

PMBOK Guide (Sixth Edition)

3. Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos.

4. Gestión de la integración.



5. Gestión del alcance

6. Gestión del tiempo.

7. Gestión de costos.

8. Gestión de la calidad.

9. Gestión de recursos humanos.

10. Gestión de comunicaciones.


11. Gestión de riesgos.

12. Gestión de adquisiciones.

13. Gestión de interesados.

PUCP

Grupos de Procesos

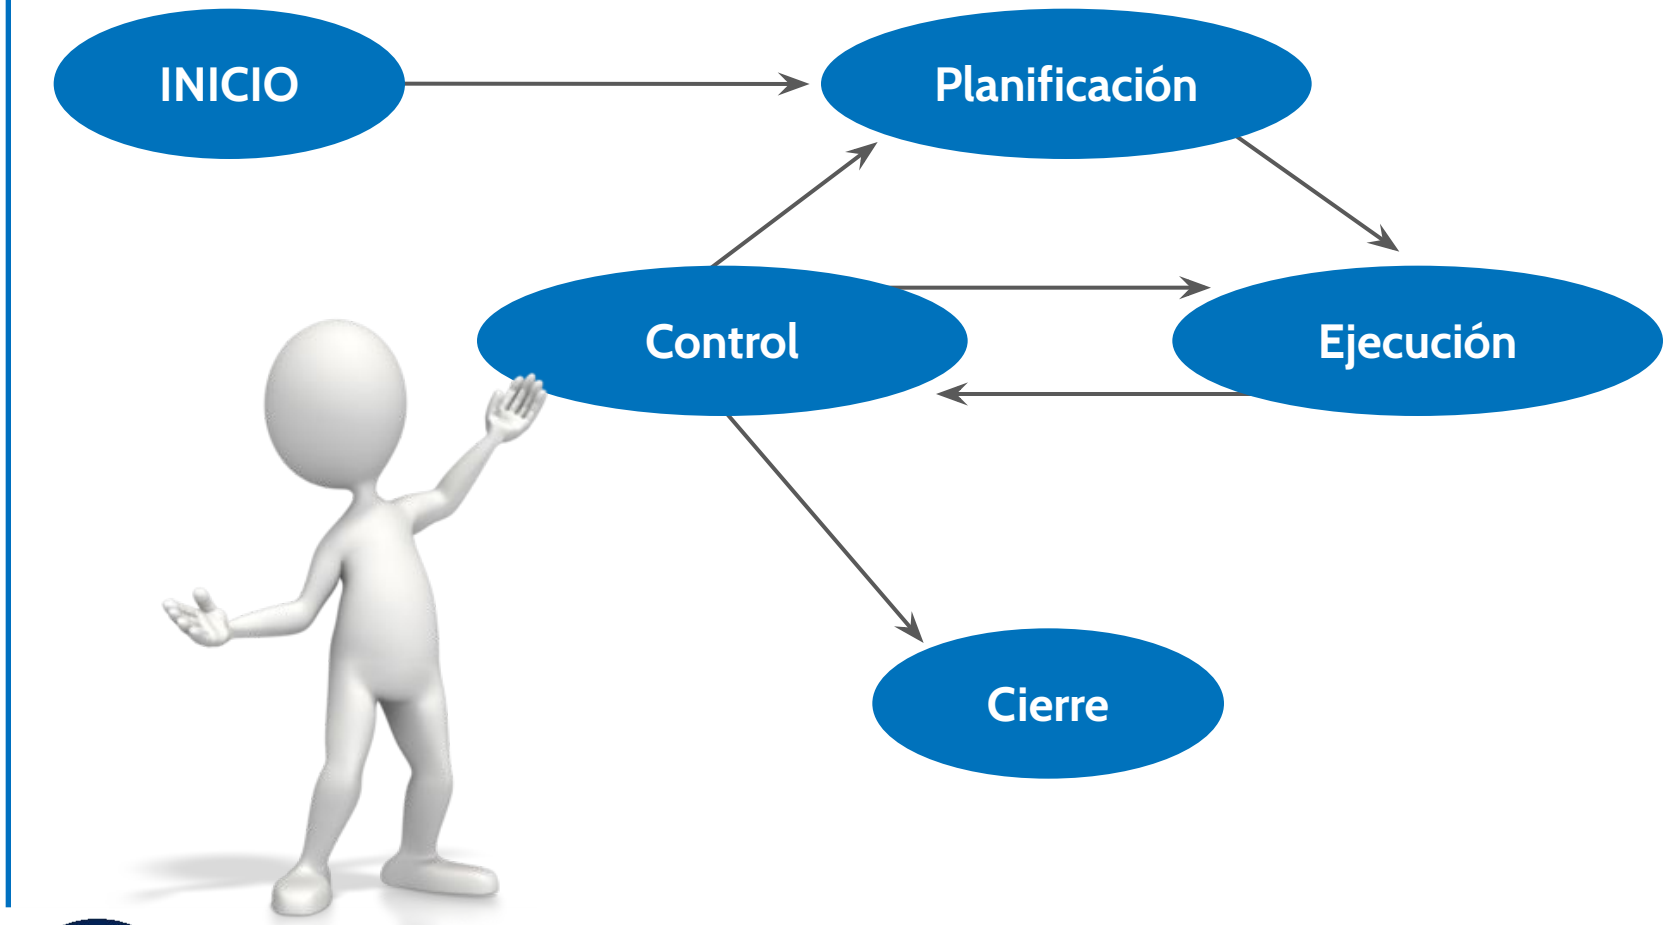

PUCP

TRES ETAPAS GENERALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANTEPROYECTO, PROYECTO Y POSTPROYECTO

ETAPA 1



Anteproyecto

Es la etapa donde planificamos y definimos nuestros objetivos. En esta fase, identificamos las necesidades del proyecto, establecemos metas y objetivos claros, y consideramos los recursos necesarios

ETAPA 2



Proyecto

Es la etapa donde ponemos en práctica la planificación y ejecutamos el trabajo real

ETAPA 3




Postproyecto

Implica la evaluación de lo que se hizo y se aprendió. En esta etapa, analizamos el rendimiento del proyecto, documentamos lecciones aprendidas y evaluamos su éxito


Este curso se centra en la gestión del proyecto, con énfasis en la planificación, la ejecución y el control, y no en la formulación completa del anteproyecto ni en el seguimiento postimplementación.

PUCP

PMBOK Guide

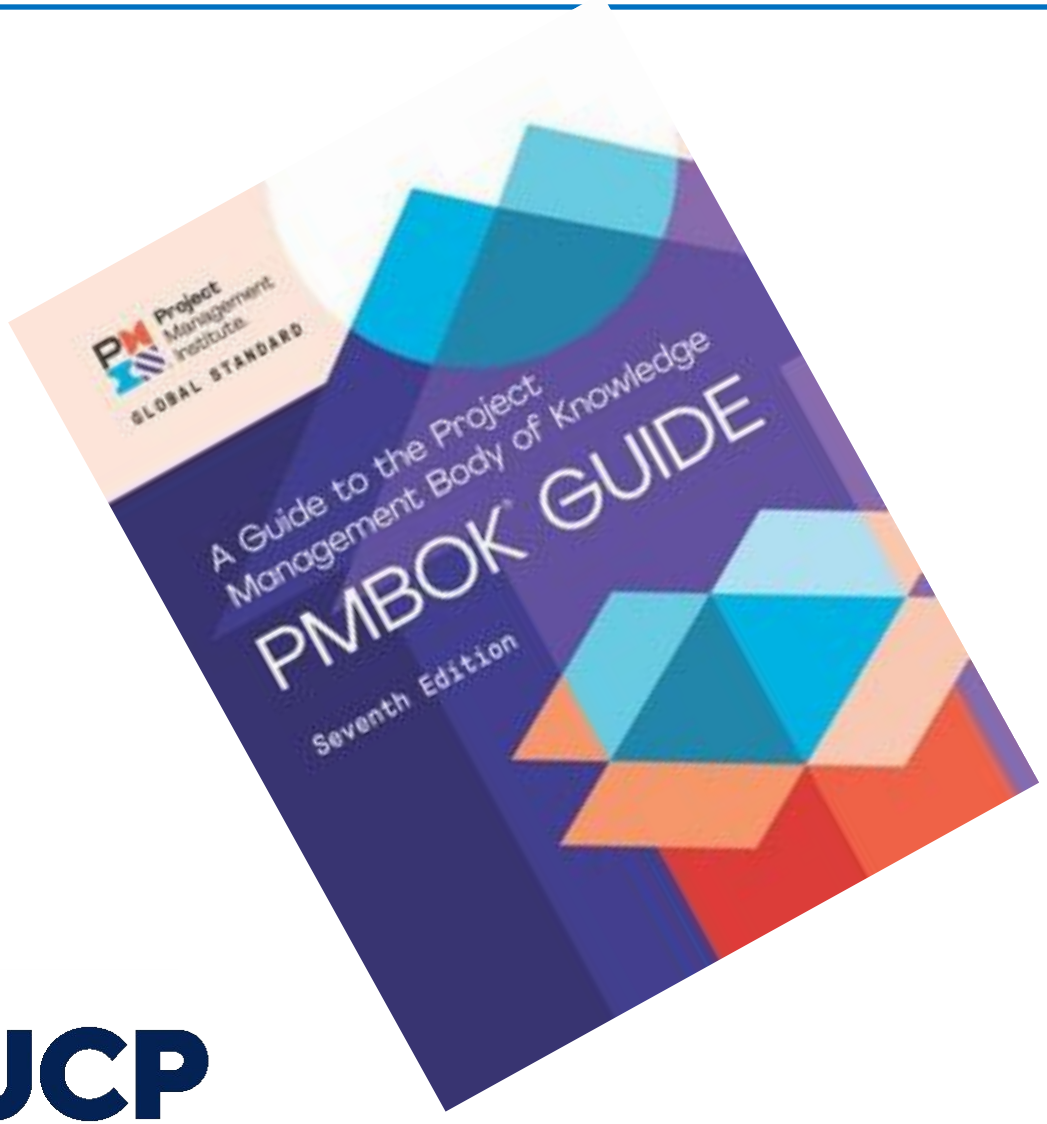

PUCP

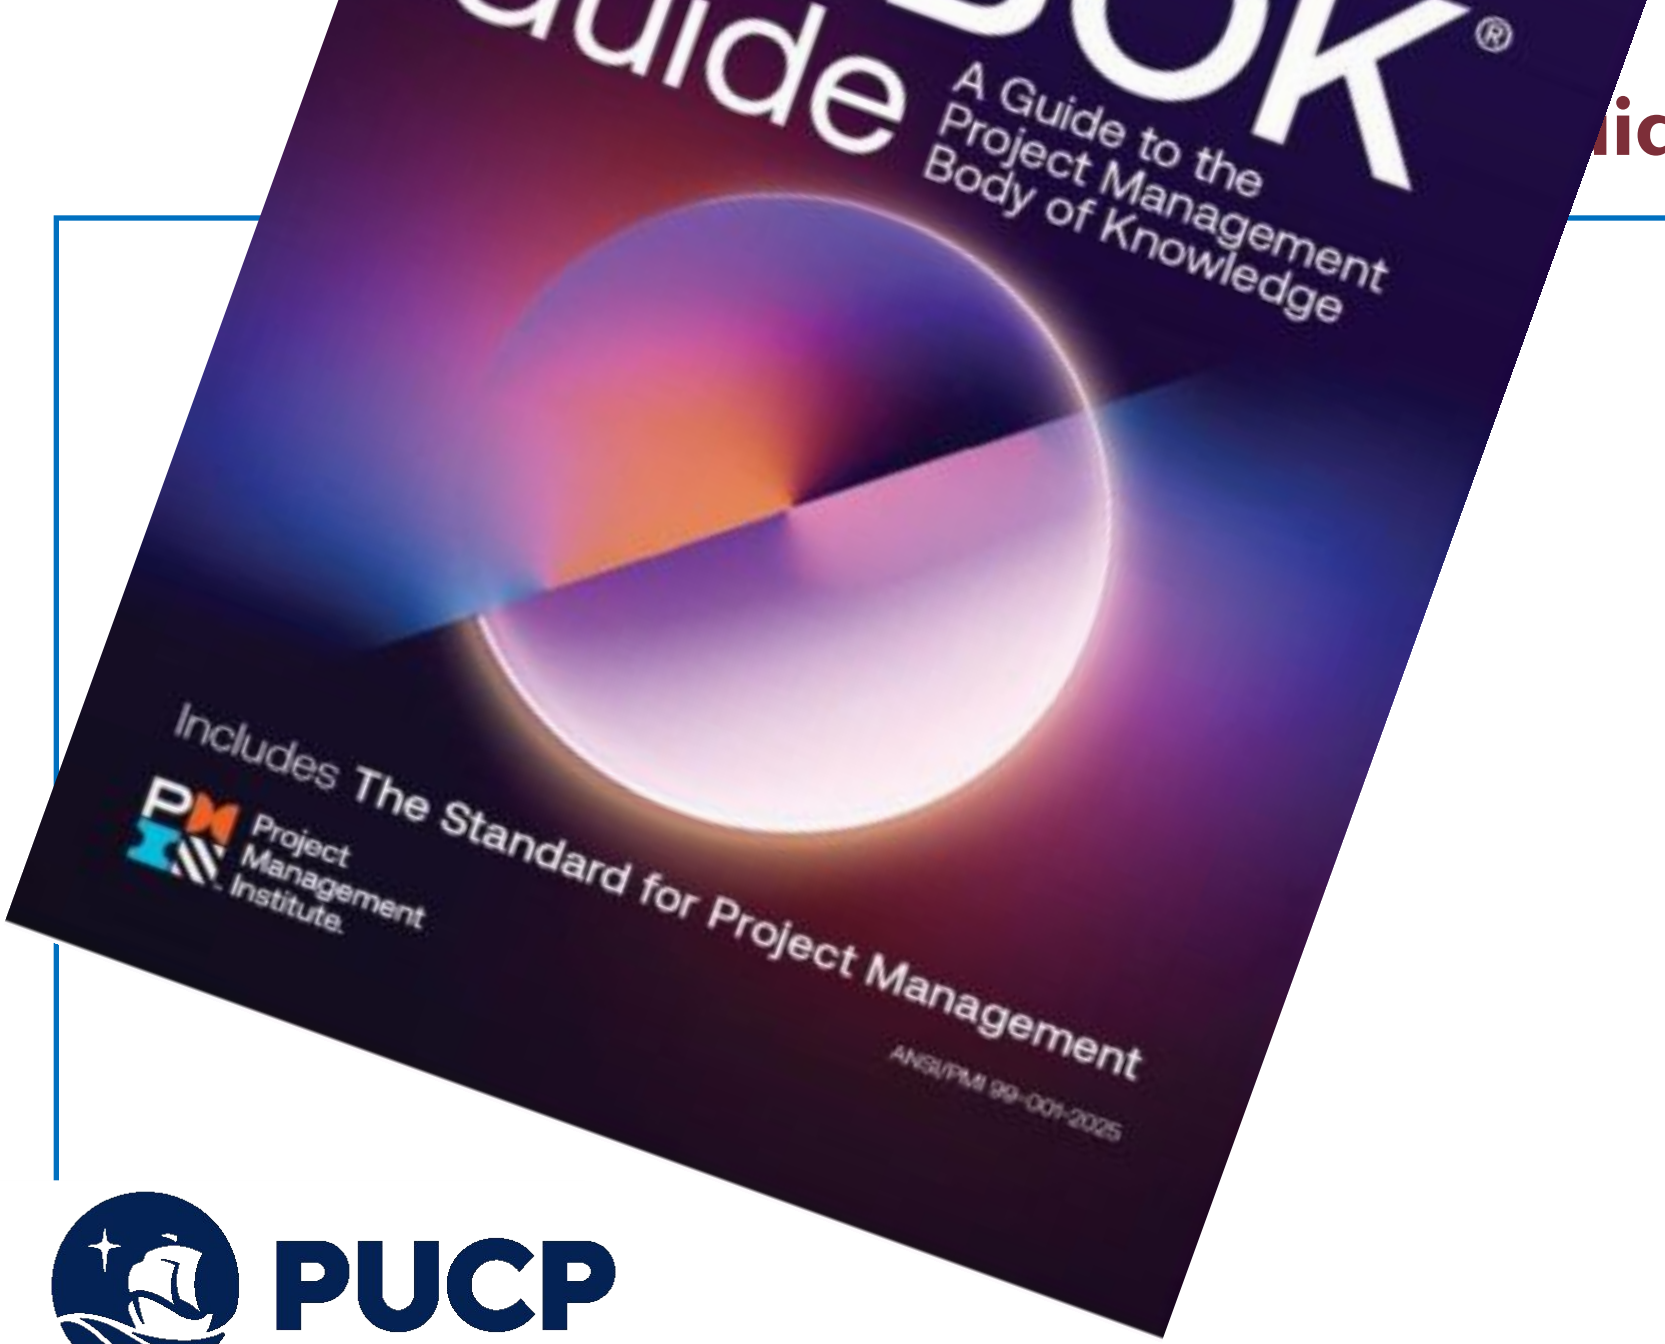
uide
BOK®
A Guide to the
Project Management
Body of Knowledge
Includes The Standard for Project Management
Project
Management
Institute.
ANSI/PMI 99-001-2025

lide

PUCP


Familia de normas ISO 21500



PUCP

ISO 21500

Encontrarán más información sobre este tema en la última sección de Paideia: Material adicional

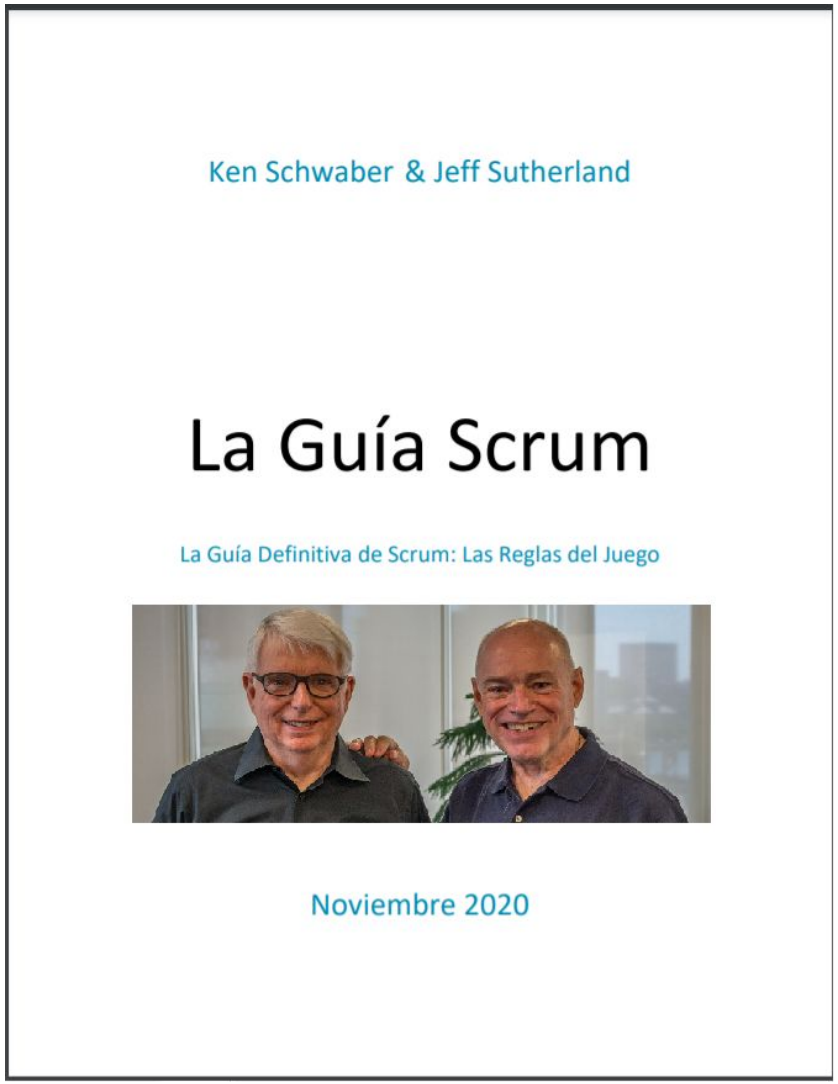

PUCP

FIN DE LA SESIÓN

PUCP
