
Gestión de Proyectos


Principios de la Gestión de Proyectos

Sesión 2

PUCP



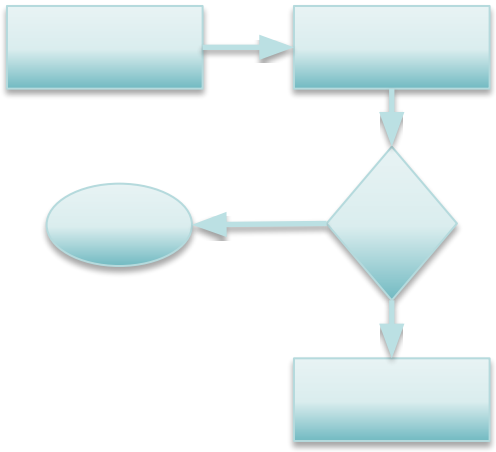

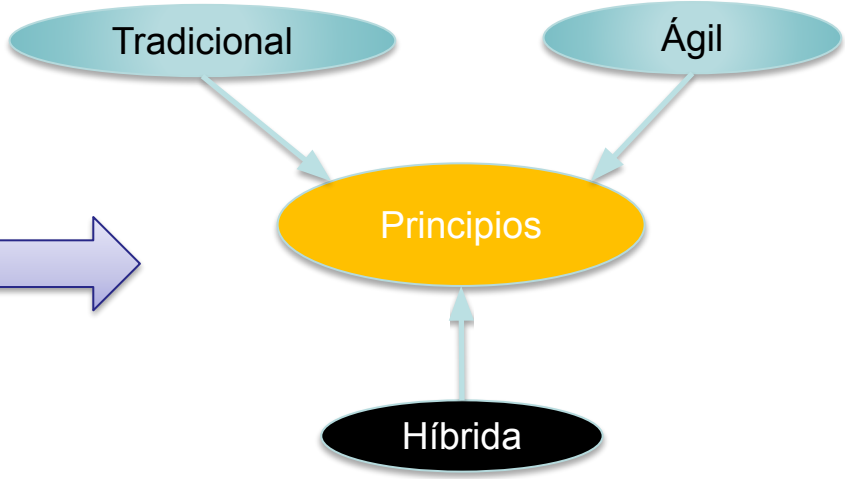


Procesos

Principios

- Un principio no es un procedimiento detallado.
- Un procedimiento te dice más o menos "haz esto, luego esto otro".
- En cambio, un principio, te da una guía de comportamiento o de criterio.

PUCP

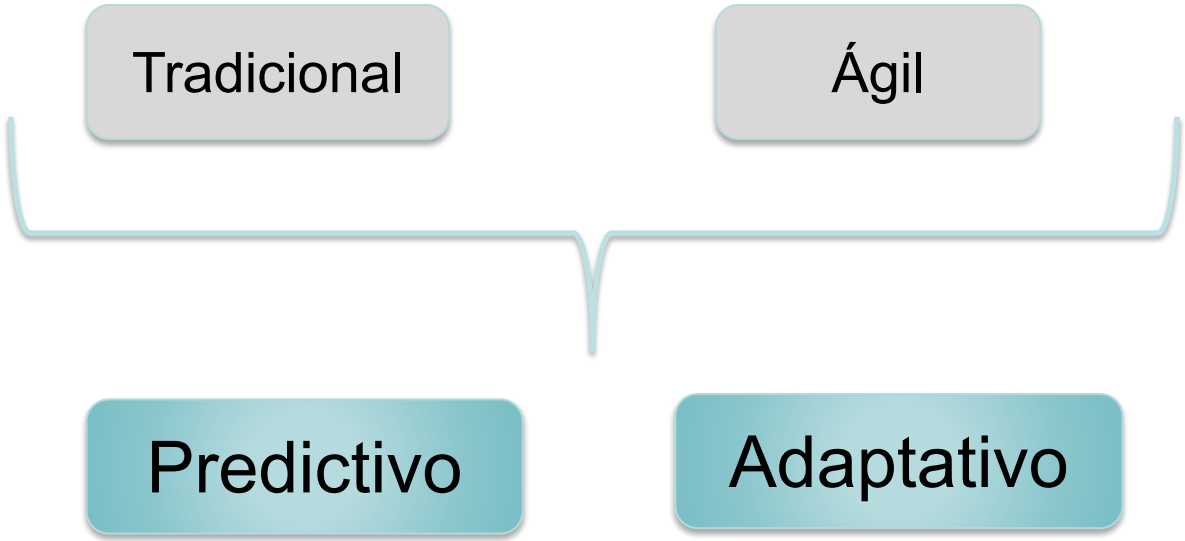

PUCP

PMBOK® Guide – Sixth Edition

A Guide to the Project Management Body of Knowledge:

- Introduction, Project Environment, and Role of the Project Manager
- Knowledge Areas
  - Integration Management
  - Scope
  - Schedule
  - Cost
  - Quality
  - Resources
  - Communications
  - Risk
  - Procurement
  - Stakeholders

The Standard for Project Management:

- Initiating
- Planning
- Executing
- Monitoring and Controlling
- Closing

Appendices, Glossary, and Index



PMBOK® Guide – Seventh Edition

The Standard for Project Management:

- Introduction
- Project Delivery Principles
  - Stewardship
  - Team
  - Stakeholders
  - Value
  - Holistic thinking
  - Leadership
  - Value Delivery System
  - Tailoring
  - Quality
  - Complexity
  - Opportunities and threats
  - Adaptability and resilience
  - Change management

A Guide to the Project Management Body of Knowledge:


- Performance Domains:
  - Team
  - Stakeholders
  - Life cycle
  - Planning
  - Navigating Uncertainty and Ambiguity
  - Delivery
  - Performance
  - Project Work
- Tailoring
- Models, Methods, and Artifacts

Appendices, Glossary, and Index

Se pasa de una lógica más prescriptiva a una más adaptable.


- Antes: ¿Qué proceso debo seguir?
- Ahora: ¿Qué enfoque necesita este proyecto para generar valor en este contexto?

PUCP

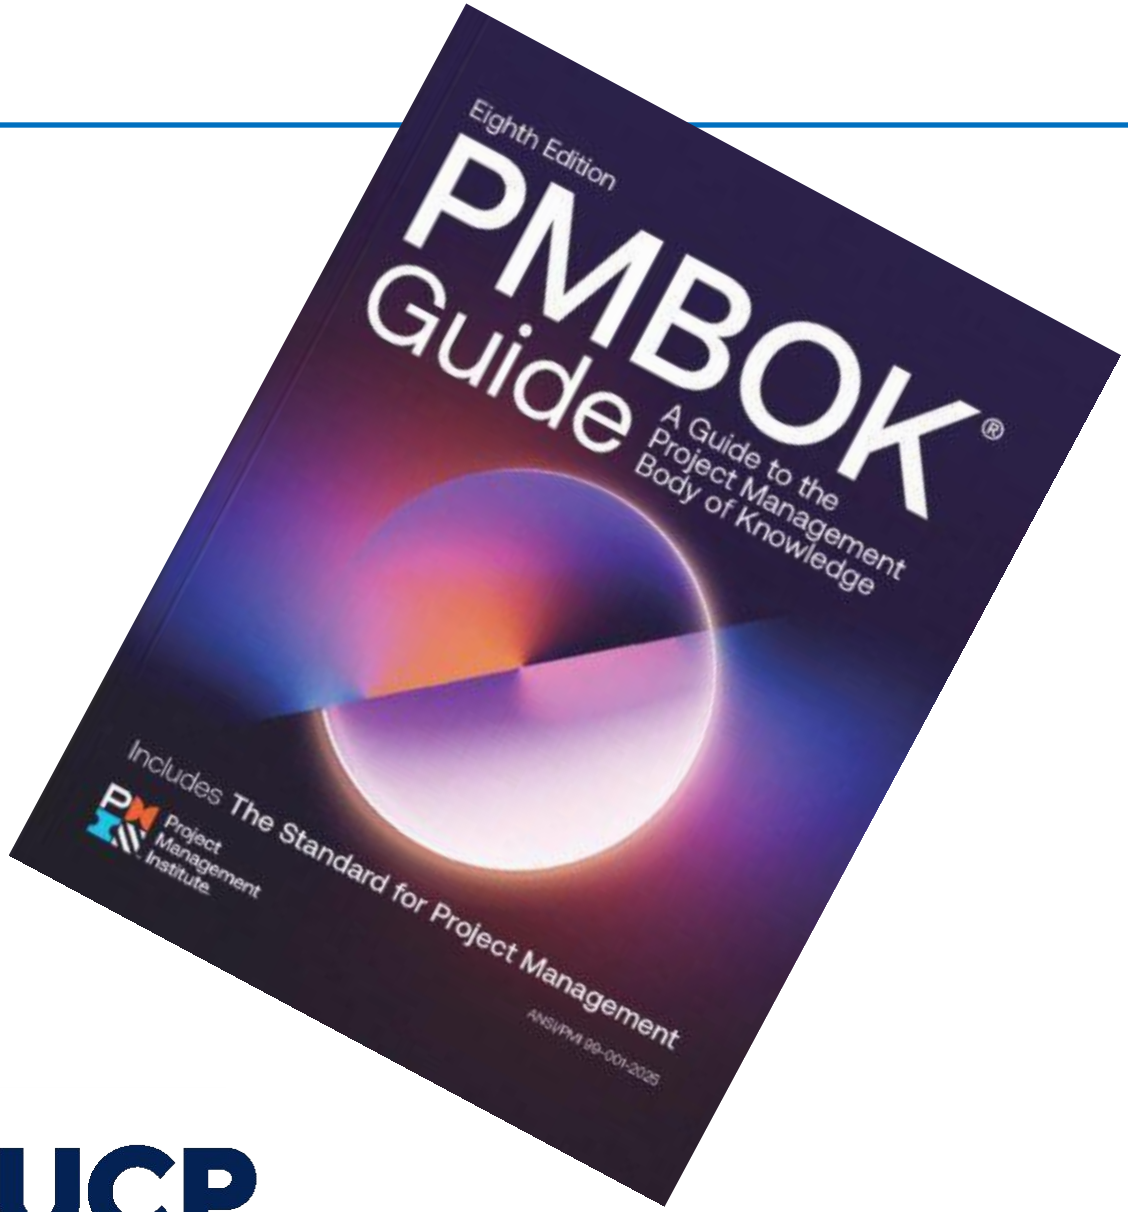
Eighth Edition
PMBOK® Guide
A Guide to the Project Management Body of Knowledge
Includes The Standard for Project Management
Project Management Institute
ANSI/PMI 99-001-2025

PUCP

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

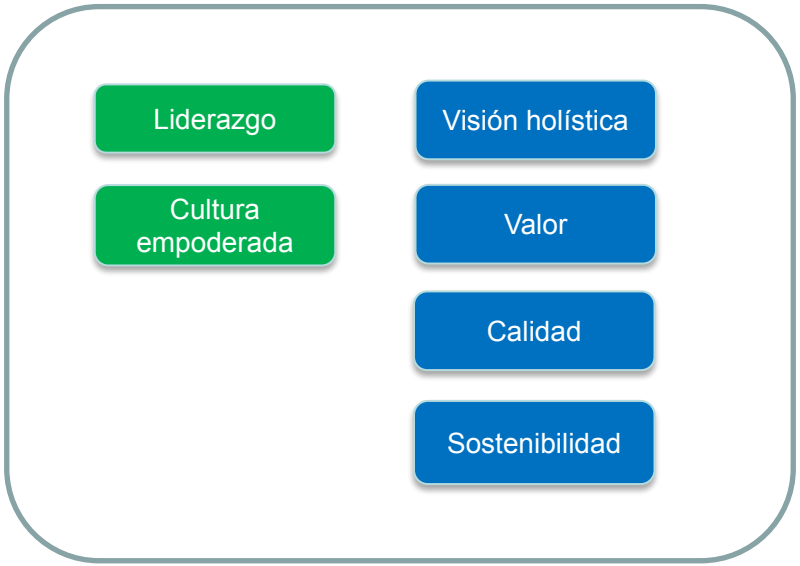

PUCP


PROJECT
MANAGEMENT
plan
success
manager
development
process
diagram
organization
corporate
work
professional
concept
business
leadership
strategy
company
chart
discipline
resources
collaboration
information
schedule
objectives
competitors
goals
marketing
teamwork
solution
presentation
definition
people
graph
word
conceptual
market
finance
idea
control

PUCP


Project
Delivery
plan
success
manager
development
diagram
process
work
corporate
organization
concept
business
leadership
strategy
company
chart
discipline
definition
idea
finance
control
resources
collaboration
information
manage
professional
schedule
objectives
competitors
goals
people
graph
marketing
teamwork
solution
presentation
analyze
word
market

PUCP



Comprender y gestionar proyectos considerando todos los componentes y sus interdependencias como parte de un sistema más amplio.

PUCP



El valor representa el valor general de los resultados del proyecto y los beneficios netos para las partes interesadas.

El valor se puede expresar de diversas maneras, como contribuciones financieras a la organización patrocinadora o receptora, beneficios sociales o los beneficios percibidos por el cliente a partir del resultado del proyecto.

PUCP



La calidad integrada incluye la capacidad de satisfacer las necesidades, expresadas o implícitas, de los clientes y las partes interesadas de forma sistemática, alcanzando o superando los niveles de eficiencia objetivo.

La calidad del entregable y los procesos utilizados para lograrlo se miden por la conformidad con los criterios de aceptación, la definición de terminado (DoD), la idoneidad para el uso y la eficiencia general.

PUCP



El liderazgo responsable implica ser responsable y asumir la responsabilidad de los objetivos comerciales del proyecto, así como de las acciones y decisiones tomadas.

- ✔ Integridad, honestidad y equidad
- ✔ Autoconocimiento
- ✔ Respeto, humildad y disponibilidad
- ✔ Flexibilidad y adaptabilidad

PUCP



Sostenibilidad Integral

Satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Este principio implica considerar estrategias para abordar cualquier externalidad que el proyecto pueda generar. Dichas estrategias pueden clasificarse como de impacto creciente, desde al menos compensar a las partes interesadas por los resultados negativos generados, hasta minimizarlos o incluso evitarlos por completo.

PUCP



Cultura Empoderada

Para desarrollar una cultura de proyecto empoderada, el entorno del proyecto debe promover la confianza mutua entre las partes interesadas y los miembros del equipo.

Debe haber total claridad sobre los roles individuales, las responsabilidades, los acuerdos de equipo y los procesos rectores.

Estos factores permiten que las personas trabajen juntas y generan sinergias en sus interacciones, lo que puede permitir que las partes interesadas colaboren de forma más eficaz y eficiente para impulsar el éxito del proyecto.


PUCP

Actividad

Principios de la Gestión de Proyectos



DOMINIOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

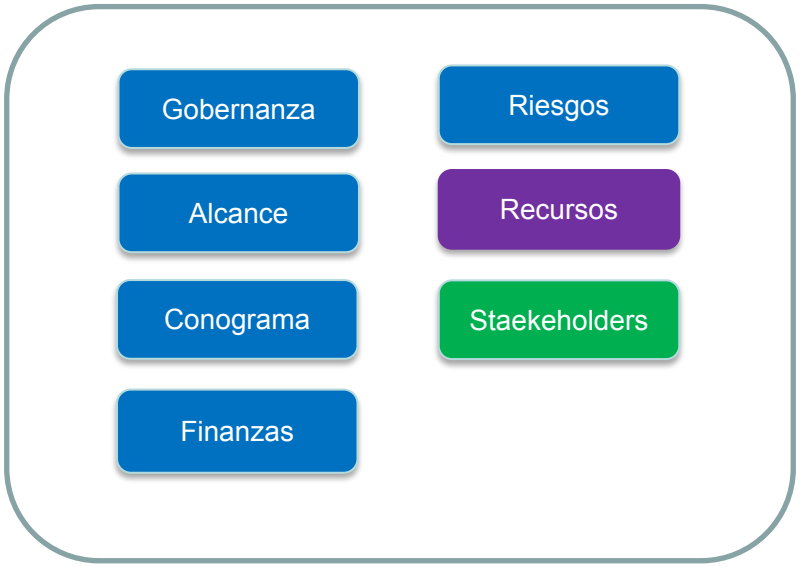


Los dominios de desempeño del proyecto son actividades esenciales que garantizan el éxito de los proyectos y reemplazan lo que anteriormente se conocía en la sexta edición como las 10 áreas de conocimiento de la gestión de proyectos.

PUCP

La gobernanza consiste en el marco, las funciones y los procesos que guían las decisiones y actividades de gestión de proyectos para optimizar la generación de valor.

Este marco de gobernanza es holístico e integrador, considerando todos los demás ámbitos de desempeño.

Está determinada por el modelo de gobernanza de la organización ejecutora, así como por las partes interesadas, como los clientes y los organismos reguladores.

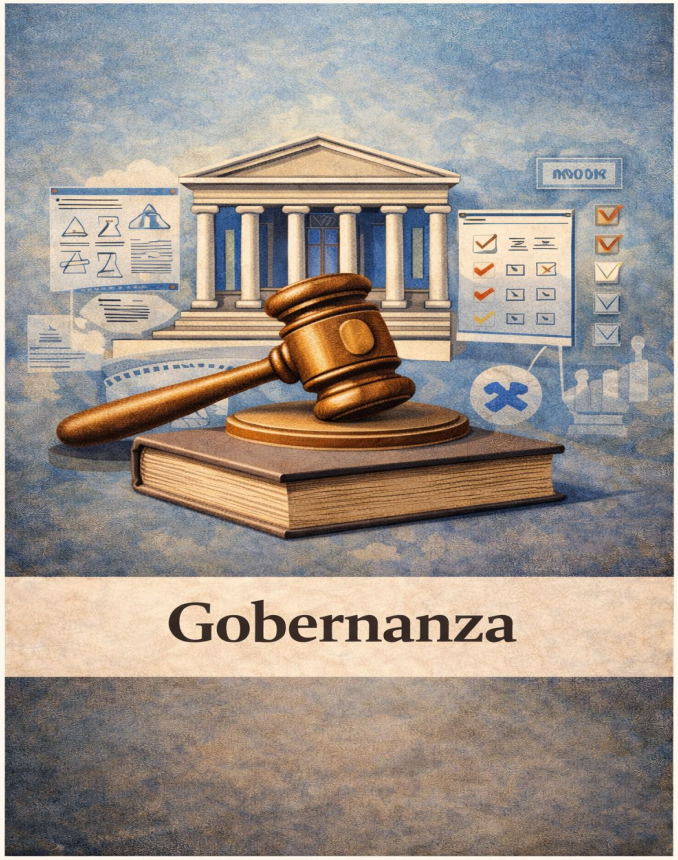

PUCP

Procesos necesarios para garantizar que el proyecto abarque todo el trabajo necesario para completarlo con éxito, que solo se mapee el trabajo requerido y que no se realice trabajo innecesario, lo que ayuda a optimizar los costos y el cronograma para maximizar el valor del proyecto.

También se centra en la calidad del proyecto. garantizando que los entregables cumplan con los criterios de aceptación especificados y que los procesos utilizados para producirlos sean eficaces y eficientes.

Enfatiza la mejora continua de los procesos, lo que ayuda a garantizar que tanto el alcance como la calidad estén alineados y cumplan consistentemente con los objetivos y estándares del proyecto.



PUCP

Representa cómo y cuándo el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance.

El cronograma sirve como herramienta de comunicación y gestión de las expectativas de las partes interesadas, y proporciona la base para la elaboración de informes de rendimiento.

El cronograma del proyecto también facilita la identificación proactiva de posibles retrasos y riesgos, lo que permite tomar medidas correctivas oportunas para mantener el proyecto en marcha.



PUCP

Procesos y herramientas relacionados con el uso y la asignación de recursos monetarios, tanto internos como externos, a la organización ejecutora.

El desempeño financiero se relaciona con los costos, la financiación y, en algunos casos, la propuesta de valor del proyecto.

Los procesos en este dominio incluyen:

- Planificación
- Estimación
- Presupuesto
- Financiamiento
- Gestión
- Medición y control de costos.




Finanzas

Representa un enfoque integral para crear resiliencia en proyectos mediante la gestión de riesgos.

Enfatiza la capacidad del equipo del proyecto para anticipar, prepararse, responder y adaptarse a diversos riesgos e interrupciones, lo que ayuda a garantizar la continuidad y el éxito ante diversas incertidumbres.

Aboga por una postura proactiva en la planificación de los riesgos e interrupciones identificados del proyecto, junto con mecanismos de respuesta adaptativos y flexibles en caso de que ocurran.

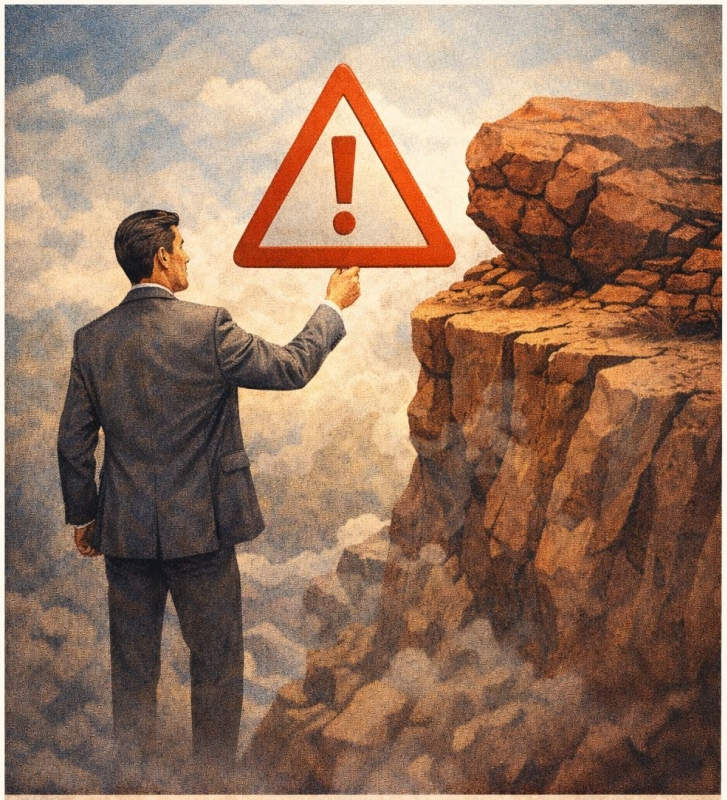


PUCP

Se refiere a la eficacia y eficiencia con la que un equipo de proyecto planifica y utiliza los recursos disponibles.

Abarca tanto los recursos humanos (el propio equipo del proyecto) como los recursos físicos o virtuales (equipos, materiales, suministros, instalaciones, infraestructura, software, entornos de prueba, licencias, servicios, información o documentos).

También abarca la disponibilidad, utilización y mantenimiento de los recursos.

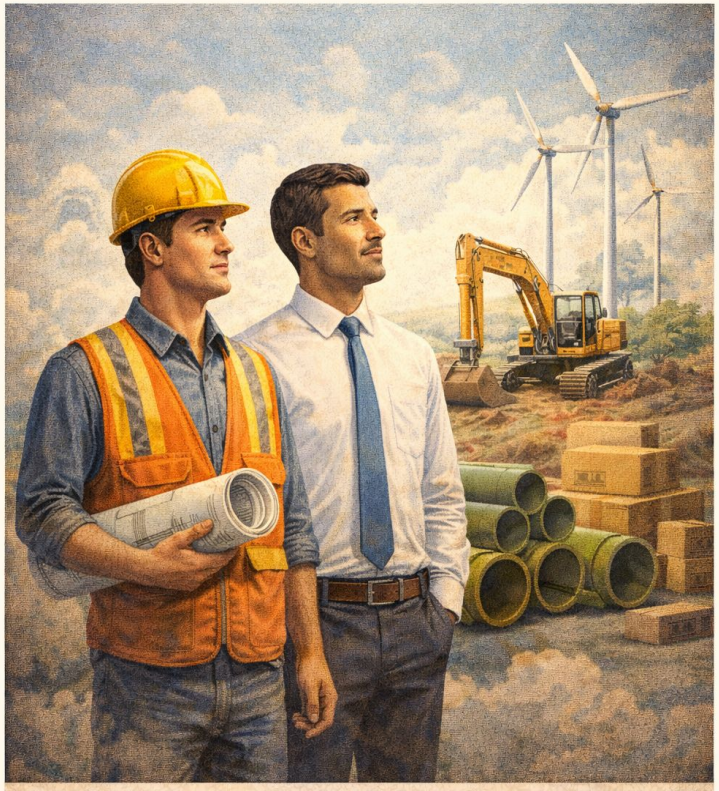

Recursos

Procesos y herramientas relacionados con la participación de las partes interesadas, desde su identificación hasta el seguimiento de su participación durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Pueden ser internos o externas e incluyen individuos, grupos y organizaciones.

Un proyecto puede tener un pequeño grupo de stakeholders o potencialmente millones.

Puede haber diferentes partes interesadas en las distintas fases del proyecto, y su influencia, poder o intereses pueden cambiar a medida que el proyecto avanza.



Stakeholders

PUCP

FIN DE LA SESIÓN

PUCP
