# Gestión de Proyectos

Definición y entorno del proyecto

**Sesión 3**


PUCP

## Actividad

Conversemos

Tenemos que iniciar un proyecto, ¿cómo empezaríamos?

# La conexión entre la estrategia, los proyectos y la entrega de valor

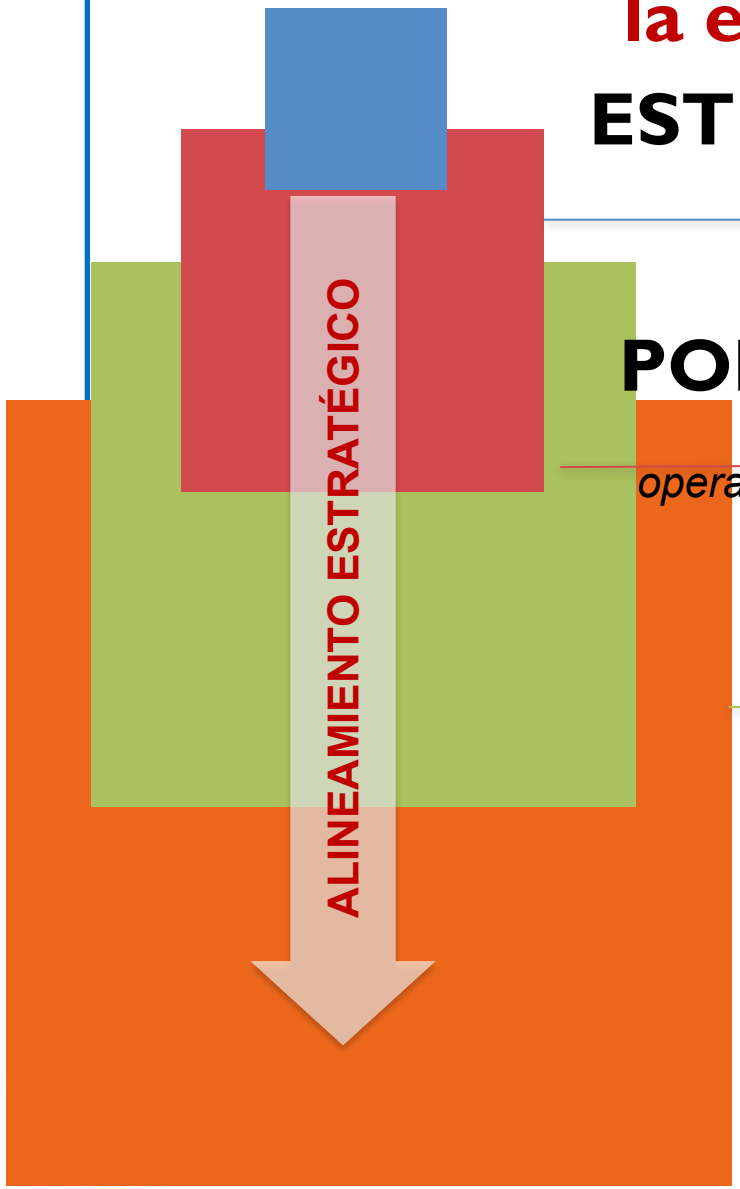


## ESTRATEGIA

*Define la dirección de la organización, sus objetivos estratégicos y la forma en que busca crear valor*

## PORTAFOLIO

*Agrupa, prioriza y balancea programas, proyectos y operaciones para maximizar la entrega de valor y lograr los objetivos estratégicos*

## PROYECTOS

*Son iniciativas temporales en un contexto único, emprendidas para crear valor*


## OPERACIONES

*Sostienen y amplían el valor generado por la organización a través de la producción continua de bienes y servicios*


**La estrategia se traduce en ejecución mediante un sistema de entrega de valor, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de la organización.**

# La Dirección de Portafolios

La dirección de portafolios conecta la estrategia organizacional con la selección y gestión de iniciativas.




Un Portafolio es una colección de programas, proyectos y operaciones gestionados como un grupo para maximizar la entrega global de valor, alcanzar objetivos estratégicos, cumplir obligaciones o generar flujos de ingreso.





La gestión del portafolio permite: priorizar iniciativas, asignar recursos de manera más estratégica, balancear riesgo y valor, y asegurar alineamiento con la estrategia.





PUCP

# ¿Cuándo es recomendable emplear la Dirección de Portafolios?

Organizaciones medianas y grandes con estrategia institucionalizada

Restricciones de capacidad y recursos

Necesidad de alinear iniciativas con los objetivos estratégicos


Múltiples proyectos y programas en paralelo

Visión consolidada de iniciativas bajo enfoques predictivos, adaptativos e híbridos

PUCP

# Selección del enfoque de desarrollo

La selección del enfoque de desarrollo depende del contexto del proyecto, del nivel de incertidumbre, del grado de cambio esperado y de la frecuencia con la que se necesita entregar valor.

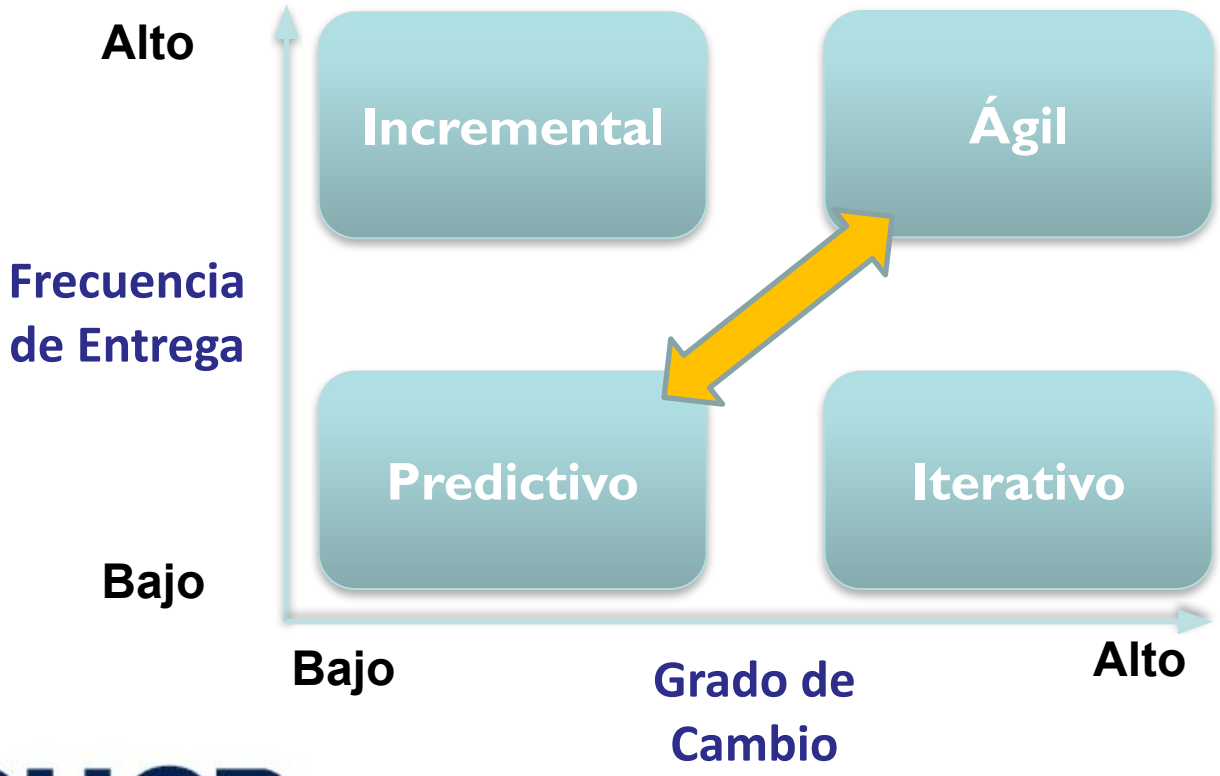


PUCP

## Enfoque predictivo
## Bajo Grado de Cambio, Baja Frecuencia de Entrega

Este enfoque es adecuado cuando los requisitos son relativamente estables y es posible planificar con mayor detalle desde etapas tempranas.

**Características:**

- El alcance se define con mayor claridad al inicio.
- La planificación es más detallada.
- Los cambios suelen gestionarse de manera más controlada.
- La entrega principal suele concentrarse hacia etapas posteriores.

**Ejemplos:**

- Construcción de una edificación.
- Implementación de infraestructura.
- Despliegues con alta regulación o baja tolerancia al cambio.

PUCP

## Entrega incremental
## Bajo Grado de Cambio, Alta Frecuencia de Entrega

La entrega incremental permite que el proyecto entregue valor en componentes o porciones utilizables, en lugar de esperar a una única entrega final.

**Características:**

- Existe una dirección general relativamente clara.
- El producto o solución puede liberarse por partes.
- Cada incremento añade funcionalidad o capacidad.
- Facilita mostrar avances tempranos al usuario o cliente.

**Ejemplos:**

- Expansión por etapas de una red.
- Liberación por módulos de una solución.
- Despliegue progresivo de funcionalidades.

PUCP

## Desarrollo iterativo
## Alto Grado de Cambio, Baja Frecuencia de Entrega

El desarrollo iterativo es útil cuando la solución necesita refinarse progresivamente a partir de pruebas, aprendizaje y retroalimentación.

**Características:**

- El trabajo evoluciona a través de ciclos sucesivos.
- Cada iteración permite aprender y ajustar.
- Puede existir una entrega final consolidada o hitos mayores.
- Es útil cuando no todo puede definirse con precisión desde el inicio.

**Ejemplos:**

- Diseño de prototipos.
- Investigación aplicada.
- Soluciones complejas que requieren validación progresiva.

PUCP

## Enfoque adaptativo
## Alto Grado de Cambio, Alta Frecuencia de Entrega

Este enfoque es apropiado cuando existe incertidumbre, evolución frecuente de necesidades y necesidad de entregar valor de manera continua.

**Características:**


- Ciclos cortos de trabajo.
- Priorización continua.
- Retroalimentación frecuente.
- Adaptación constante del producto o servicio.
- Fuerte cercanía con usuarios o stakeholders.

**Ejemplos:**

- Desarrollo de aplicaciones.
- Productos digitales.
- Campañas de marketing altamente dinámicas.


PUCP

# Comparación de enfoques de desarrollo

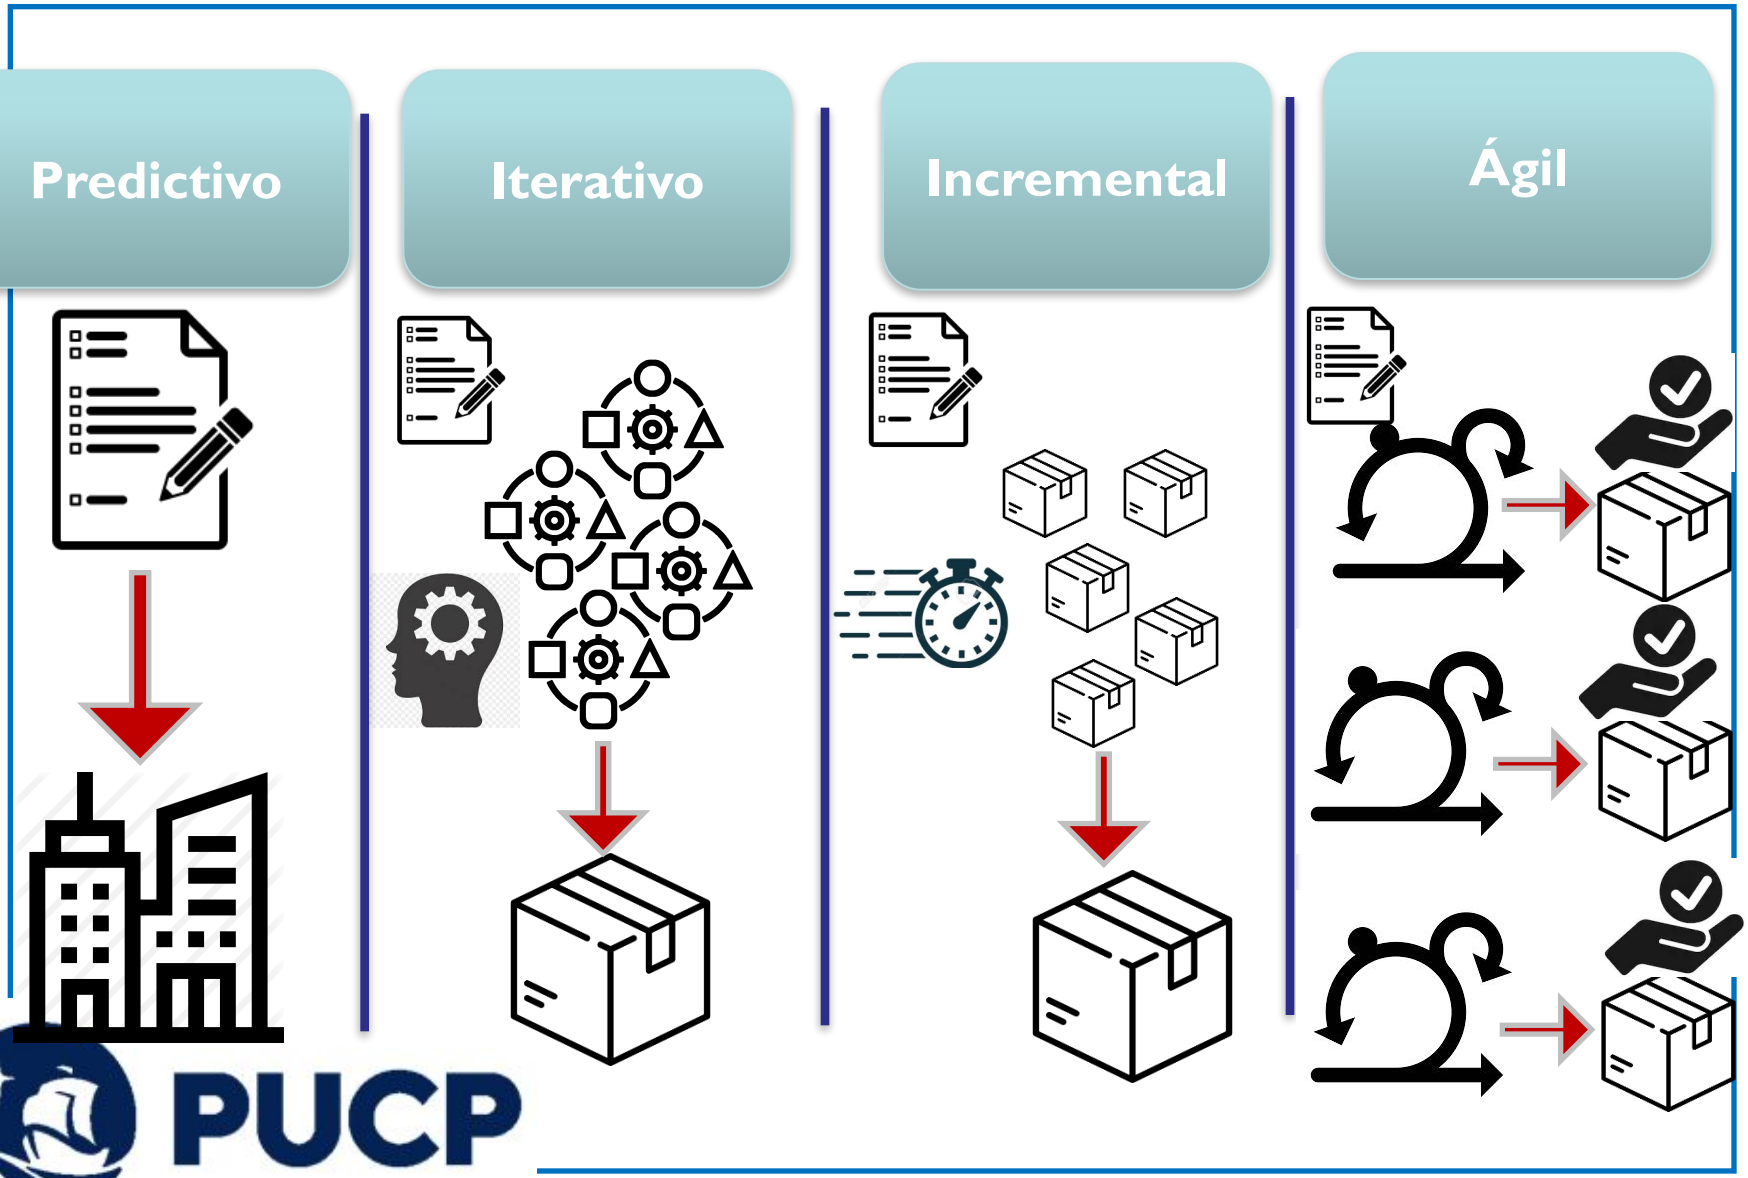


PUCP

# Fases del proyecto y ciclo de vida del proyecto



***Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culmina con uno o más entregables y/o resultados.***

## Fases del Proyecto




***Serie de fases o actividades por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre.***

## Ciclo de Vida del Proyecto

**Ejemplo:** en un proyecto de biblioteca virtual, las fases pueden ser diagnóstico, diseño, desarrollo, pruebas y cierre. El conjunto de estas fases conforma el ciclo de vida del proyecto.

PUCP

# Áreas de enfoque de la gestión del proyecto

**Inicio:**

- Clarificar el propósito del proyecto.
- Autorizar formalmente el trabajo.
- Identificar stakeholders clave.
- Establecer una base inicial de dirección.

**Planificación:**

- Definir cómo se organizará y gestionará el proyecto.
- Establecer alcance, cronograma, recursos, costos, riesgos, comunicaciones y otros elementos relevantes.
- Adaptar el nivel de planificación al contexto del proyecto.

**Ejecución:**

- Realizar el trabajo planificado.
- Coordinar personas, recursos y actividades.
- Producir entregables y avanzar hacia los resultados esperados.

PUCP

# Áreas de enfoque de la gestión del proyecto

**Monitoreo y Control:**

- Dar seguimiento al desempeño.
- Comparar avance real con lo planificado.
- Gestionar cambios, riesgos, problemas y calidad.
- Apoyar la toma de decisiones oportunas.

**Cierre:**


- Formalizar la aceptación y cierre del trabajo.
- Transferir entregables cuando corresponda.
- Documentar lecciones aprendidas.
- Liberar recursos y cerrar administrativa u operativamente el proyecto o fase.

Estas áreas de enfoque pueden manifestarse de manera distinta según el enfoque predictivo, adaptativo o híbrido, y desarrollarse a lo largo de una o varias fases del proyecto.

PUCP

# Ejemplo de ciclo de vida bajo enfoque predictivo


En un enfoque predictivo, el proyecto avanza por fases más definidas, con una planificación más detallada desde etapas tempranas.

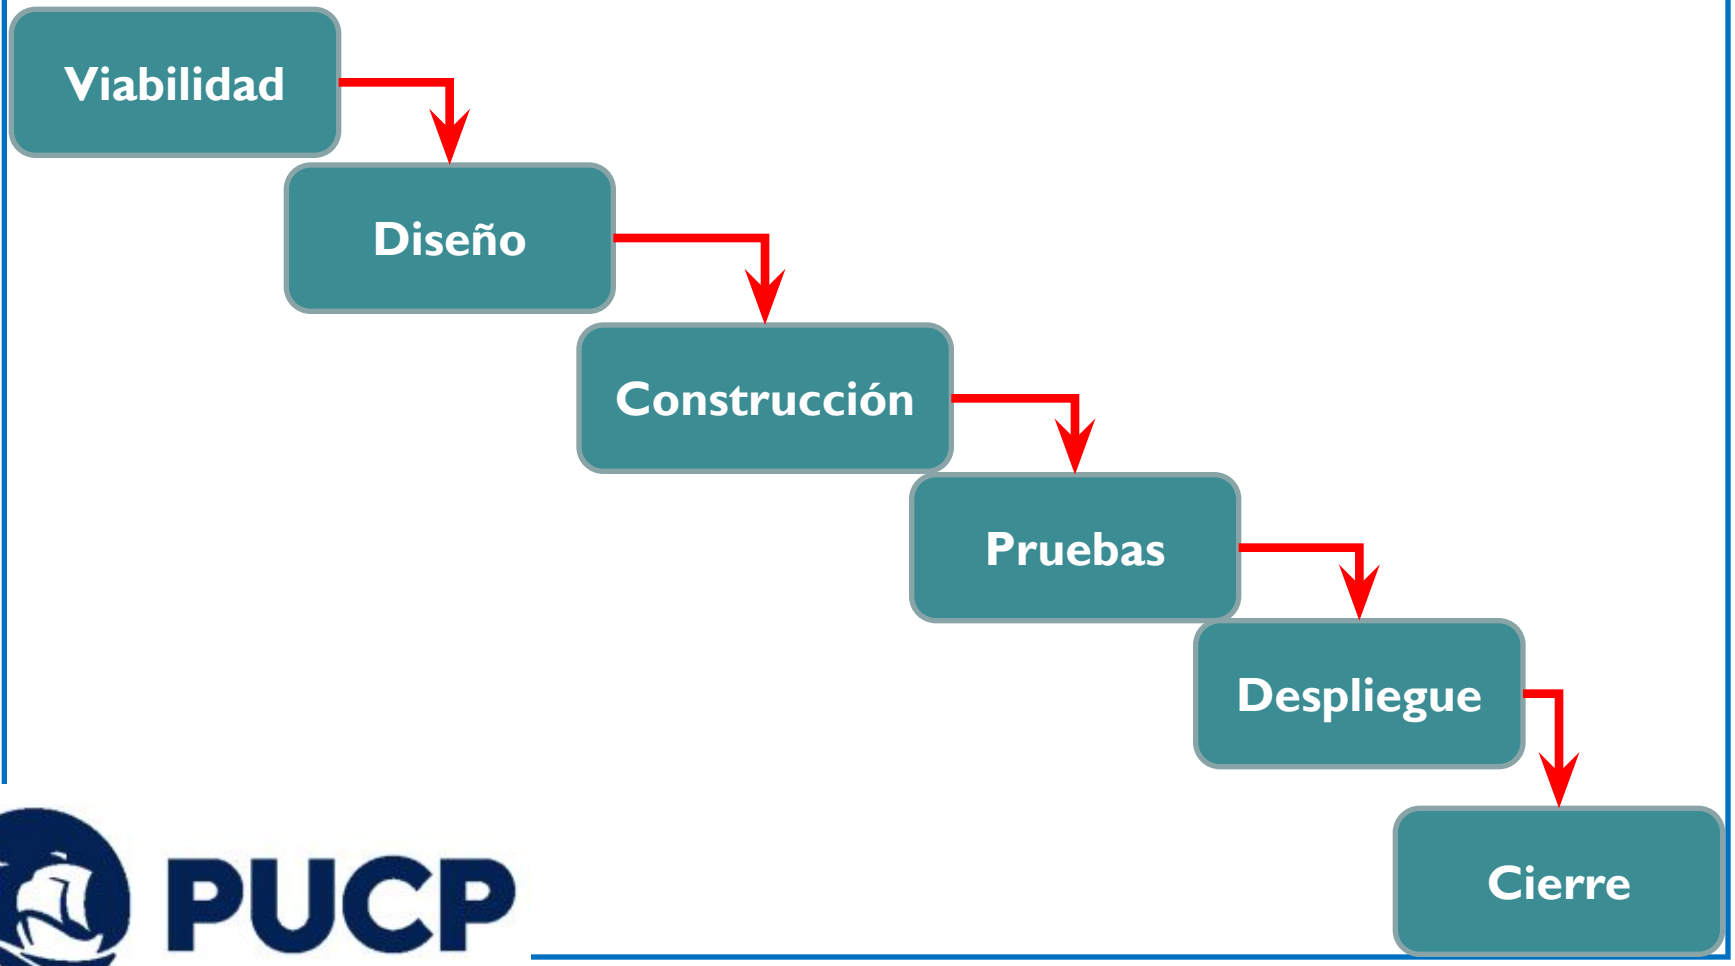


PUCP

# Ejemplo de ciclo de vida con lógica incremental e iterativa

En algunos proyectos, el trabajo se desarrolla en ciclos sucesivos que combinan: refinamiento progresivo de la solución, aprendizaje continuo y entregas parciales de valor.

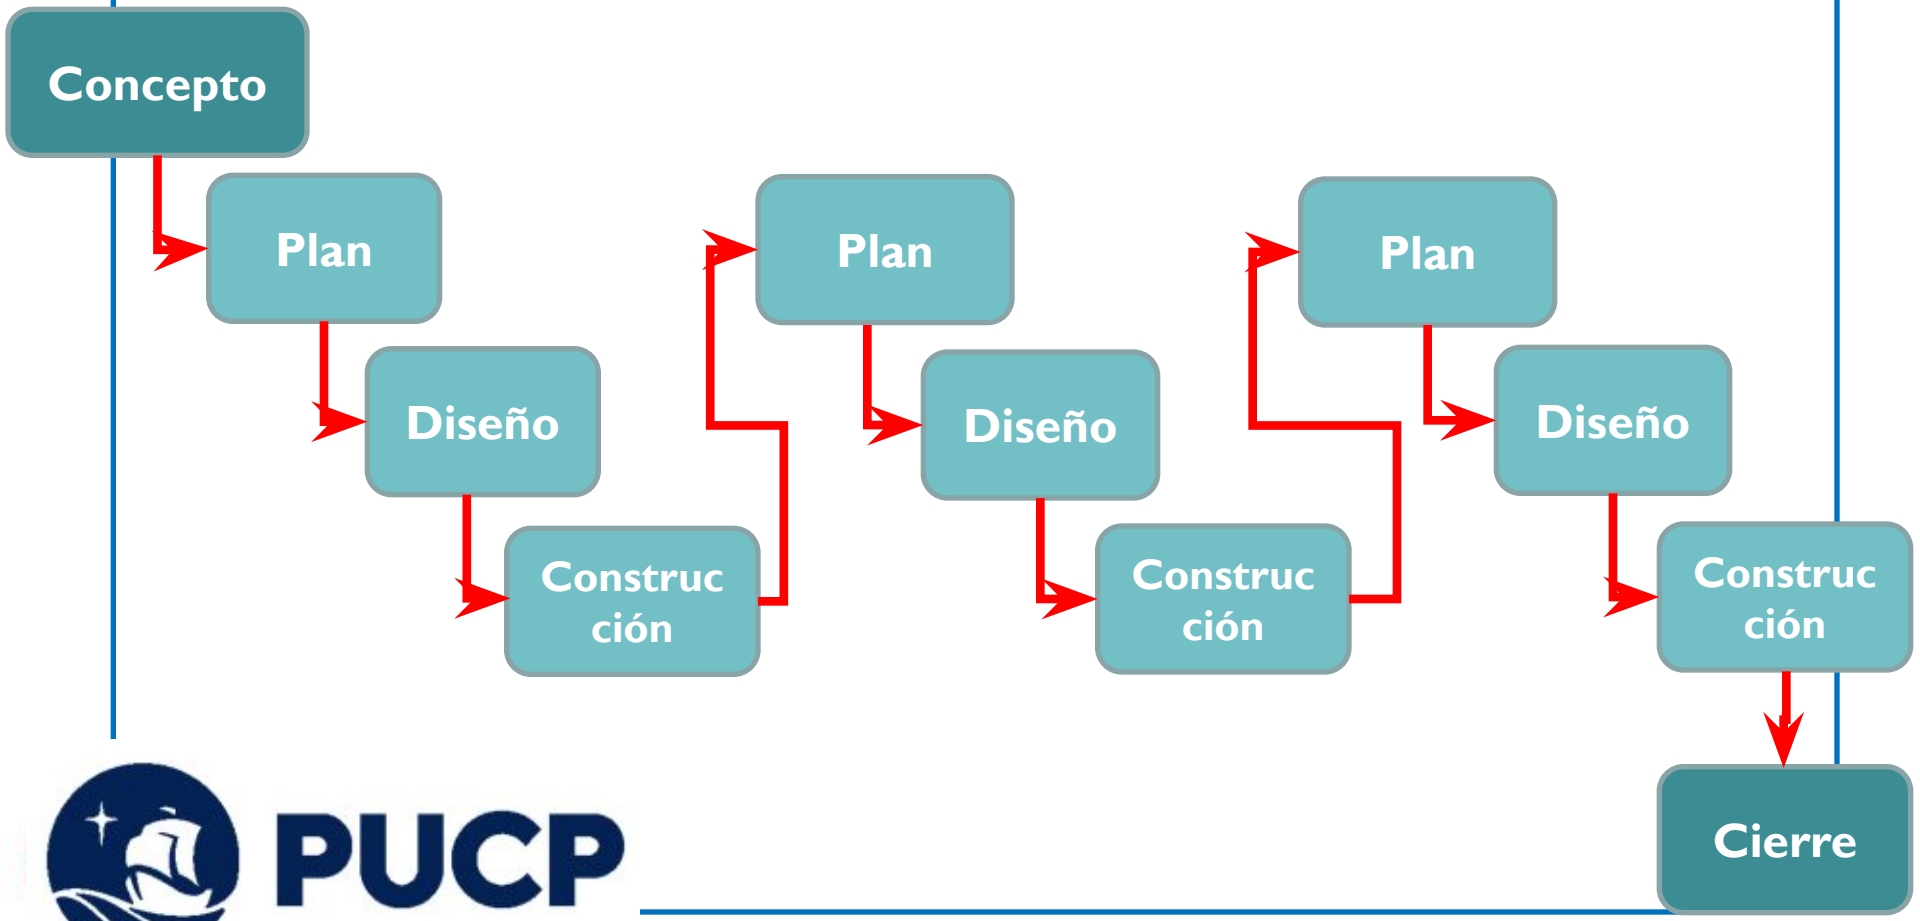



PUCP

# Ejemplo de ciclo de vida bajo enfoque adaptativo

En un enfoque adaptativo, el proyecto parte de una visión y avanza mediante ciclos cortos de trabajo, priorización y retroalimentación frecuente.

**Visión de Proyecto y de Producto**

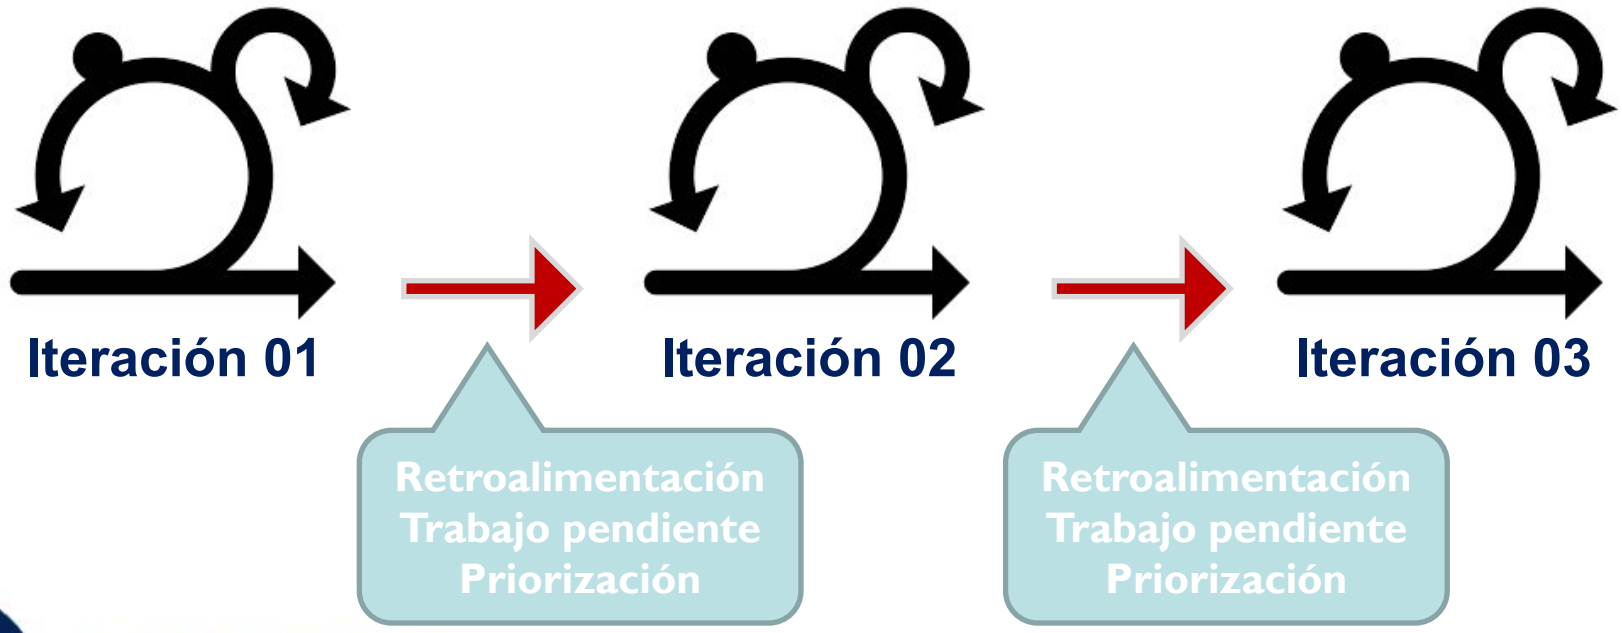



PUCP

# El entorno del proyecto

Los proyectos existen y operan en entornos que influyen en sus decisiones, desempeño y capacidad de generar valor. Estas influencias pueden ser favorables o desfavorables.

Dos categorías principales de influencias son los factores ambientales de la empresa **(FAE)** y los activos de los procesos de la organización **(APO)**.

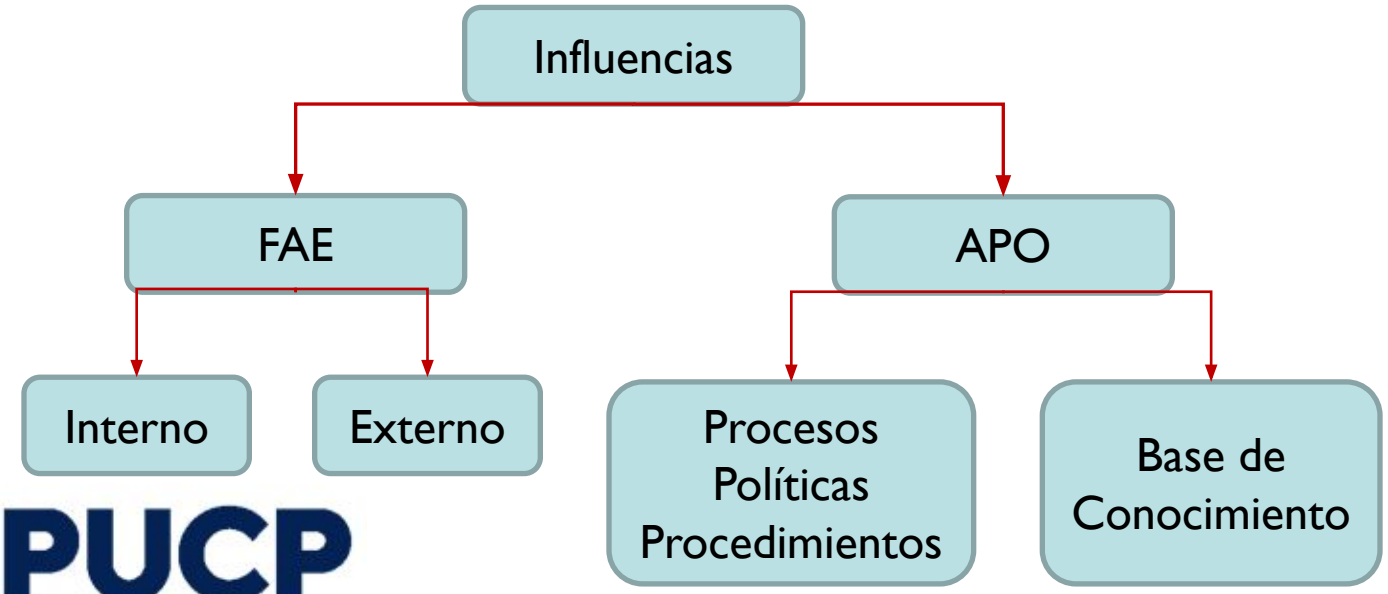


PUCP

# Ejemplos de influencias del entorno del proyecto

## Factores Ambientales de la Empresa (FAE / EEF)

Son condiciones internas y externas que influyen en cómo se planifica, ejecuta y gestiona el proyecto. Generalmente, no están bajo control directo del equipo del proyecto, pero deben ser consideradas.

## Ejemplos externos

Leyes y regulaciones, condiciones del mercado, contexto social y cultural, disponibilidad tecnológica, avances en inteligencia artificial y situación económica o sectorial.

## Ejemplos internos

Cultura organizacional, estructura organizacional, clima interno, herramientas disponibles, capacidades del talento, nivel de madurez en gestión de proyectos.

# Ejemplos de influencias del entorno del proyecto

## Activos de los Procesos Organizacionales (APO / OPA)

Son recursos internos que ayudan a orientar, estandarizar y mejorar la gestión del proyecto.

## Incluyen

- Políticas.
- Procesos y procedimientos.
- Plantillas y formatos.
- Bases históricas.
- Lecciones aprendidas.
- Repositorios de conocimiento.
- Lineamientos metodológicos.

PUCP

# Identificación de Interesados



**Personas**, **grupos** u **organizaciones** que pueden impactar, verse impactados o percibirse impactados por el proyecto, sus entregables o sus resultados.

***Pasos para el análisis de interesados***

**1º - Identificarlos**
Roles, área, intereses, conocimientos, expectativas, influencia

**2º - Impacto**
Clasificar según: influencia, intereses, participación, etc.

**3º - Evaluación**
¿ Cómo podrían reaccionar o influir sobre el proyecto?

PUCP

# Identificación de Interesados

## Ejemplo: Identificando a los interesados del Proyecto Metro de Lima



METRO DE LIMA Y CALLAO


línea 1 Metro de Lima

PUCP

# Identificación de Interesados

| Prefactibilidad | Diseño e Ingeniería | Construcción | Puesta en Marcha | Cierre/Entrega |
|---|---|---|---|---|
| • MTC (Ositran).<br>• Ministerios (Cultura, Ambiente, Economía, Energía y Minas).<br>• Consultora.<br>• Municipalidades.<br>• Rep. Gob. Central.<br>• Comunidad.<br>• Ministerio Trabajo. | • Postores.<br>• MTC (Ositran).<br>• Postores (Ingeniería, Procura y Obras).<br>• Controloría.<br>• OSCE.<br>• SEACE.<br>• Equipo de Proyecto.<br>• Proveedores Servicios.<br>• Comunidad.<br>• Ministerio Trabajo. | • Medios de Comunicación.<br>• Contratistas.<br>• Proveedor de Tren.<br>• Aduanas.<br>• Equipo de Proyecto.<br>• Entidad Supervisora.<br>• Contraloría.<br>• Negocios aledaños.<br>• Proveedores de Servicios.<br>• Comunidad.<br>• Sindicatos.<br>• PNP.<br>• Municipalidades.<br>• Medios de Transporte.<br>• Ministerio Trabajo.<br>• Ministerio Economía. | • Medios de Comunicación.<br>• Contratistas.<br>• Proveedor de Tren.<br>• Equipo de Proyecto.<br>• Equipo de Puesta en Marcha.<br>• Entidad Supervisora.<br>• Contraloría.<br>• Negocios aledaños.<br>• Proveedores de Servicios.<br>• Comunidad.<br>• Usuarios Finales.<br>• PNP.<br>• Municipalidades.<br>• Medios de Transporte.<br>• Ministerio Trabajo.<br>• Ministerio Economía. | • Medios de Comunicación.<br>• Contratistas.<br>• Proveedor de Tren.<br>• Equipo de Proyecto.<br>• Entidad Supervisora.<br>• Contraloría.<br>• Comunidad.<br>• Usuarios Finales.<br>• PNP.<br>• Municipalidades.<br>• Ministerio Economía. |

# El Acta de Constitución de Proyecto

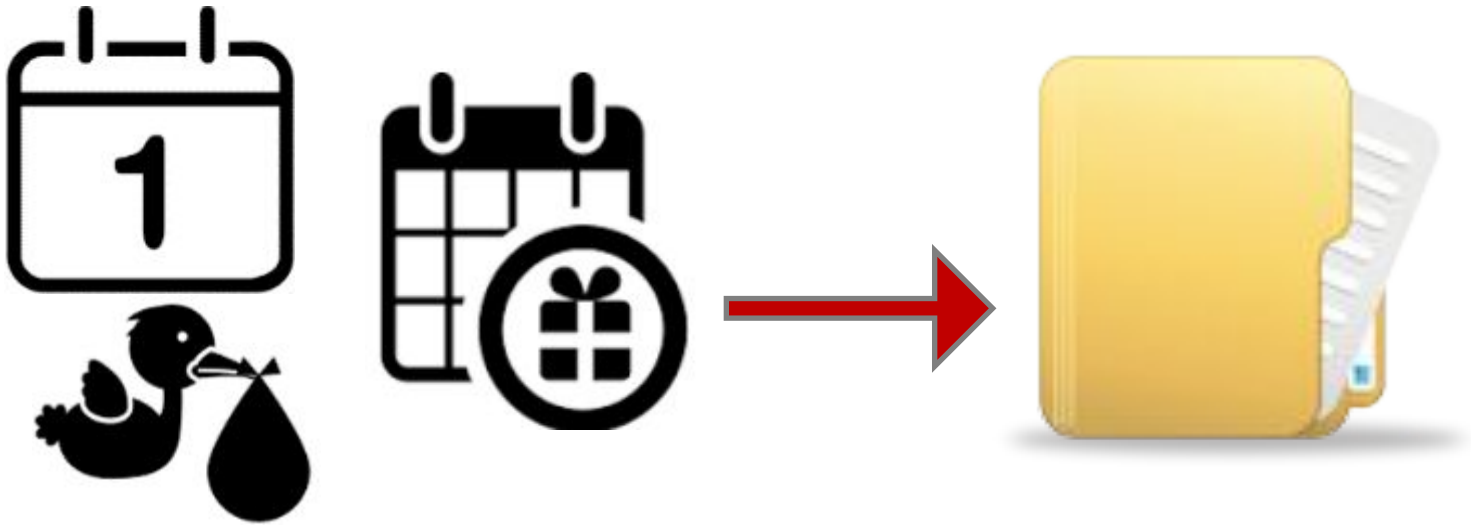

Tenemos que comunicar el inicio del proyecto...

- **¿Qué elementos debería incluir el Acta de Constitución del Proyecto?**
- **¿Cómo distinguimos la justificación del propósito del proyecto?**


PUCP

# El Acta de Constitución de Proyecto


El propósito del proyecto
EL valor esperado del proyecto
Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados
Los requisitos de alto nivel
La descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los entregables clave
El riesgo general del proyecto
El resumen del cronograma de hitos
Los recursos financieros pre-aprobados
La lista de interesados clave
Los requisitos de aprobación del proyecto
Los criterios de cierre o salida del proyecto
El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad
El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto

PUCP


# Control Integrado de Cambios




SOLICITUD DE CAMBIOS



COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS



Los cambios deben evaluarse según su impacto integral en el desempeño y el valor del proyecto.

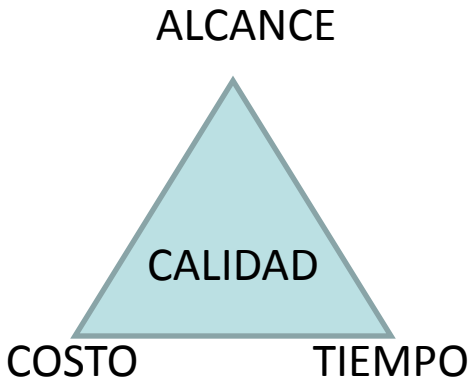


**TRIPLE RESTRICCION**

PUCP

# Tipos de Solicitudes de Cambio

**Acción correctiva**

Realinea el desempeño del proyecto con el plan de gestión.

**Acción preventiva**

Busca asegurar que el desempeño futuro esté alineado con el plan.

**Reparación de defectos**

Corrige una no conformidad en un entregable o producto.


**Actualizaciones**

Cambios en documentos, registros o planes del proyecto.

PUCP

**Tiempo: 40 min**

## Actividad



Trabajo Grupal

En equipos, elaborar el Acta de Constitución del Proyecto a desarrollar.

# FIN DE LA SESIÓN

PUCP
