Gestión de Proyectos

Gestión de Riesgos



Actividad

Conversemos

¿cómo podremos hacer frente a los eventos imprevistos del proyecto?

La Gestión de Riesgos - Conceptos

Riesgo



Disparador del Riesgo



Amenazas y Oportunidades





Riesgos Individuales y Generales





Propietario del Riesgo



PUCP

La Gestión de Riesgos

Estructura de Desglose de Riesgos

NIVEL 0 de RBS	NIVEL 1 de RBS	NIVEL 2 de RBS
0. TODAS TODAS LAS FUENTES DE RIESGO DEL PROYECTO	1. RIESGO TÉCNICO	1.1 Definición del alcance
		1.2 Definición de los requisitos
		1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones
		1.4 Procesos técnicos
		1.5 Tecnología
		1.6 Interfaces técnicas
		Etc.
	2. RIESGO DE GESTIÓN	2.1 Dirección de proyectos
		2.2 Dirección del programa/portafolio
		2.3 Gestión de las operaciones
		2.4 Organización
		2.5 Dotación de recursos
		2.6 Comunicación
		Etc.
	3. RIESGO COMERCIAL	3.1 Términos y condiciones contractuales
		3.2 Contratación interna
		3.3 Proveedores y vendedores
		3.4 Subcontratos
		3.5 Estabilidad de los clientes
		3.6 Asociaciones y empresas conjuntas
		Etc.
	4. RIESGO EXTERNO	4.1 Legislación
		4.2 Tasas de cambio
		4.3 Sitios/Instalaciones
		4.4 Ambiental/clima
		4.5 Competencia
		4.6 Normativo
		Etc.

Descripción del Riesgo

METALENGUAJE	
Causa	Debido a (causa)
Riesgo	Podría (evento incierto)
Consecuencia	Lo que impactaría (impacto)

La Gestión de Riesgos – Análisis Cualitativo

Probabilidad Medida del grado de certidumbre de que un evento pueda ocurrir

Impacto Efecto producido por la ocurrencia de un evento

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

			IMPACTO				
			Menor	Moderado	Significativa	Mayor	Catastrófica
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Muy Probable	5	5	10	15	20	25
	Probable	4	4	8	12	16	20
	Moderado	3	3	6	9	12	15
	Poco Probable	2	2	4	6	8	10
	Raro	1	1	2	3	4	5

RANKING DE RIESGOS


Riesgo	Prob	Impact	Severidad	Prioridad
R1	3	1	3	4ª
R2	4	3	12	2ª
R3	3	5	15	1ª
R4	2	2	4	3ª

PUCP

La Gestión de Riesgos – Análisis Cuantitativo

Análisis mediante árbol de decisiones


Definición de Decisión	Nodo de Decisión	Nodo de Oportunidad	Valor Neto de Ruta
Decisión a ser tomada	**Entrada:** Costo de cada decisión **Salida:** Decisión tomada	**Entrada:** Probabilidad de escenario, Recompensa si ocurre **Salida:** Valor Monetario Esperado (EMV)	**Calculado:** Beneficios menos costos a lo largo de la ruta

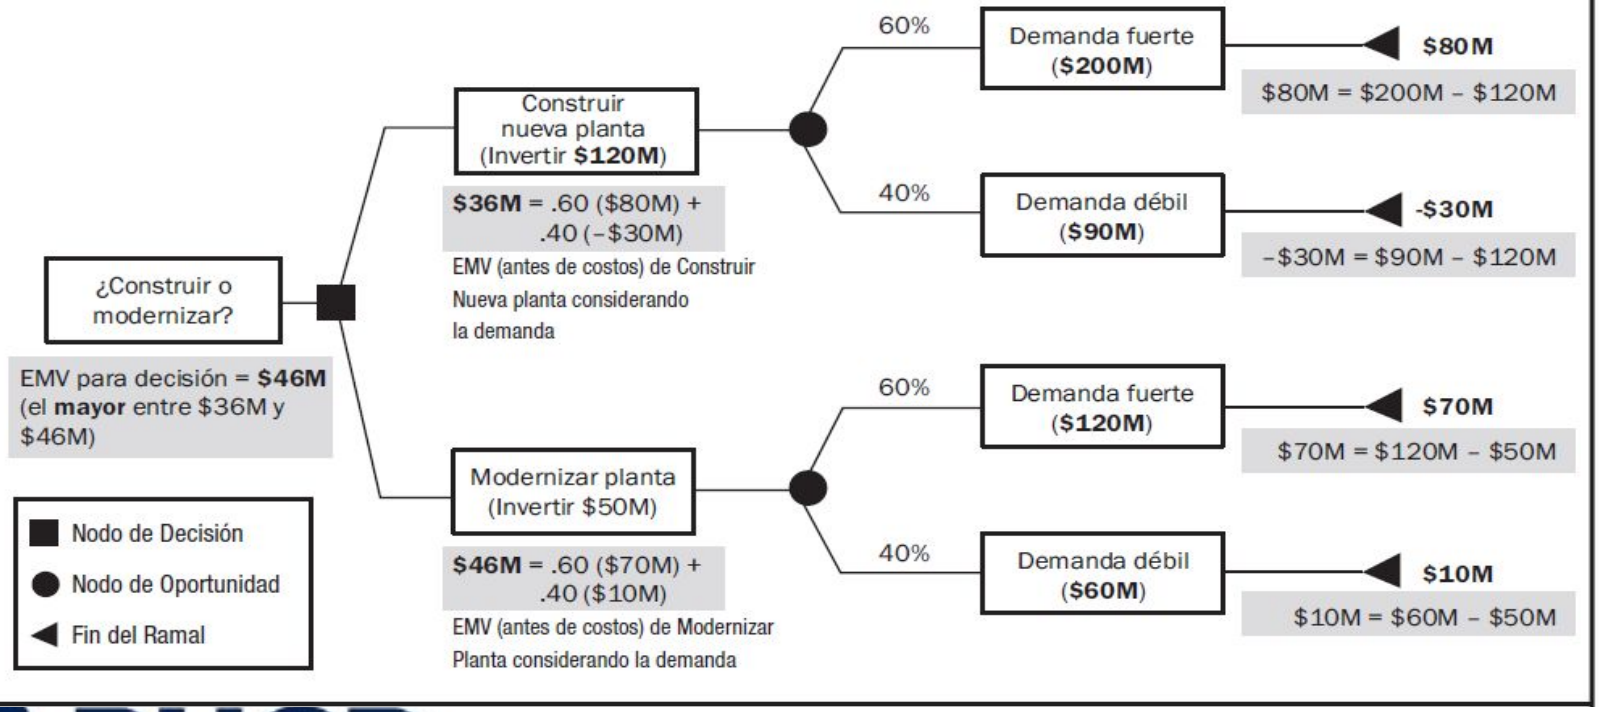


PUCP

La Gestión de Riesgos – Análisis Cuantitativo

Simulación - ¿Qué pasa Si?

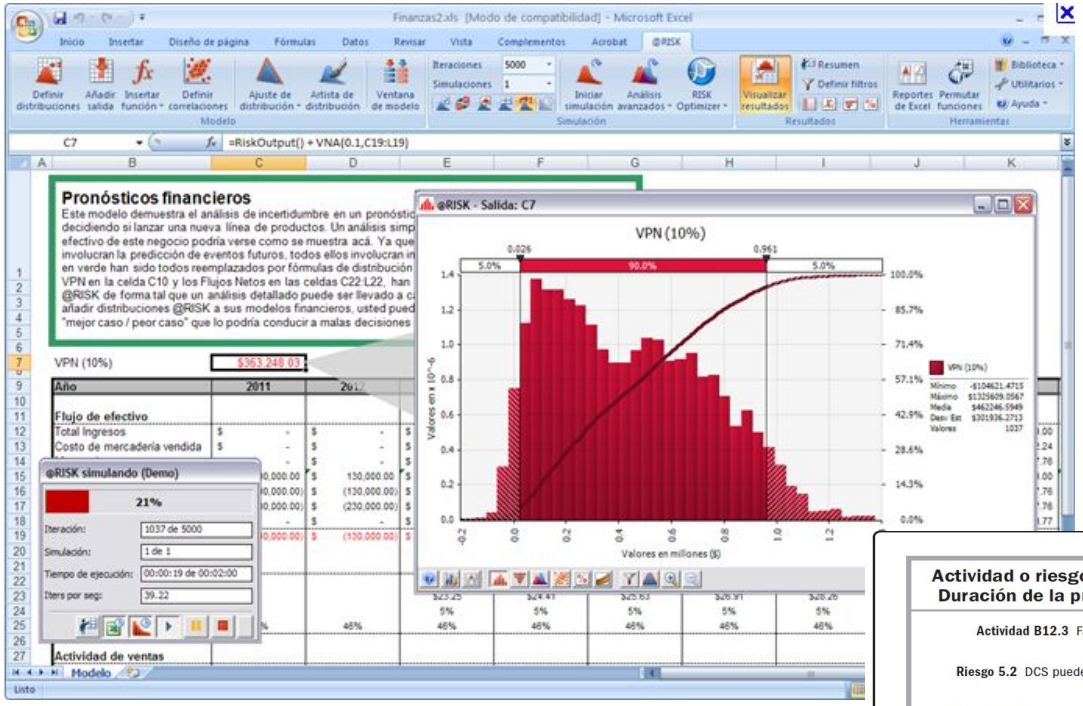


Análisis de Sensibilidad

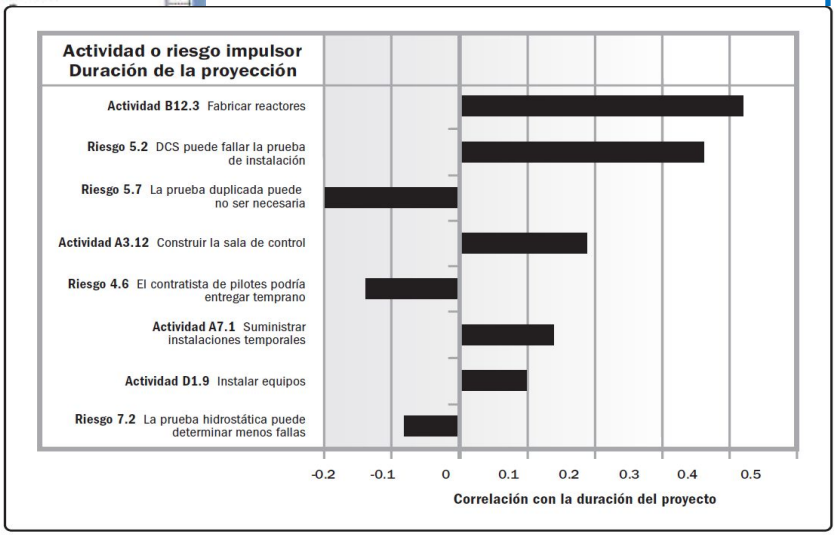

PUCP

La Gestión de Riesgos – Respuesta a los Riesgos

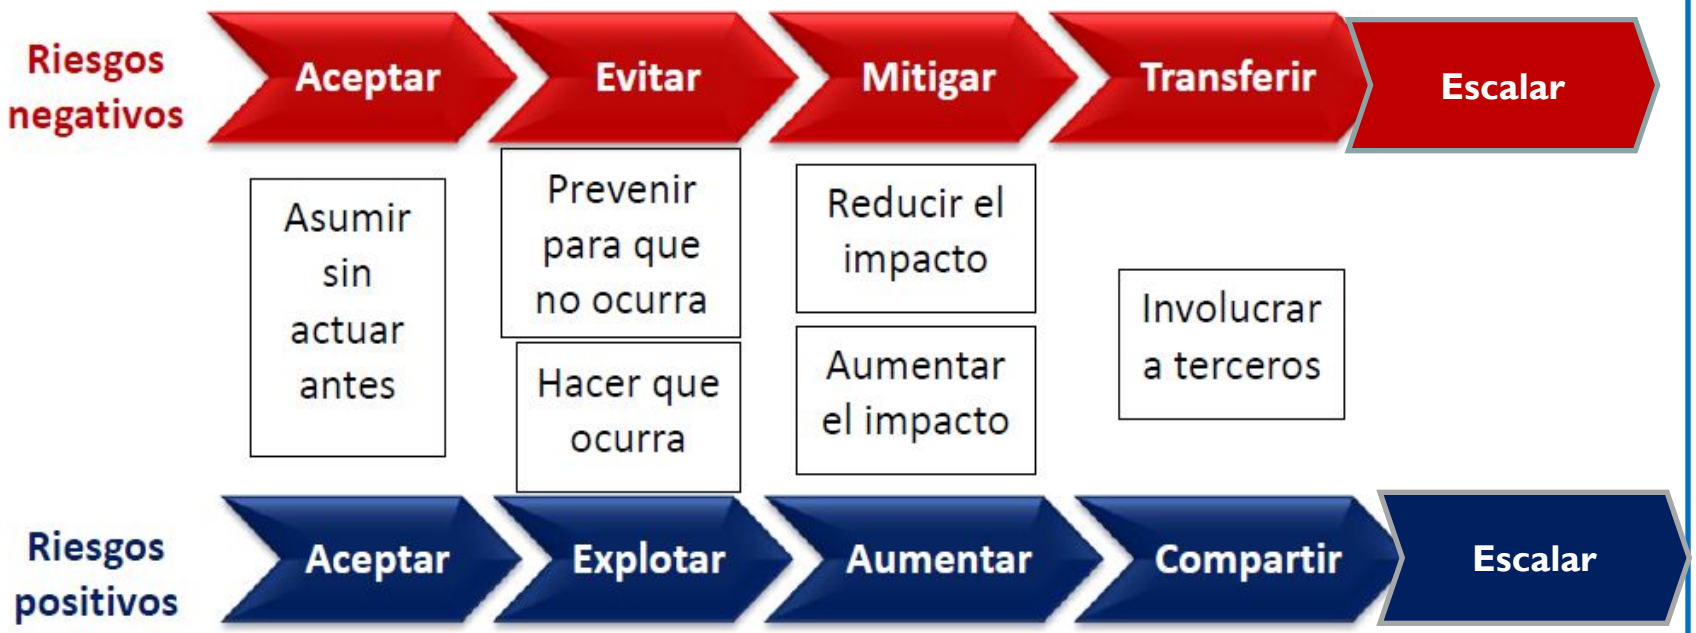

PUCP

La Gestión de Riesgos – Conceptos Adicionales y la Reevaluación de Riesgos

Workarounds



Riesgos Residuales y Secundarios





Reevaluación de los Riesgos



PUCP

Las Reservas de Contingencia y de Gestión

La Reserva de Contingencia

La **Reserva Contingencia**, se emplea para gestionar los riesgos identificados, para los que se quiere tener una protección desarrollando acciones de contingencia o mitigación, una vez que se presente el riesgo.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Reserva Contingencia
A	10%	US$ 20,000	
B	30%	US$ 45,000	
C	60%	US$ 18,000	

La Reserva de Gestión


La **Reserva Gestión**, que es responsabilidad de la organización, se utiliza para atender los riesgos no identificados, lo imprevisto. Se asigna un % adicional a la Línea Base del Proyecto (Costo, Cronograma) considerando Información Histórica de proyectos pasados

%

PUCP

Tiempo: 45 min

Actividad



Trabajo Grupal

En equipos:

- Definir un mínimo de 8 riesgos (6 amenazas y 2 oportunidades).
- Elaborar el Ranking de Riesgos.
- Definir las respuestas a los riesgos indicando estrategia de respuesta, acciones y responsable.

FIN DE LA SESIÓN

PUCP
