Gestión de Proyectos

Gestión de Adquisiciones y Recursos

PUCP

Actividad

Pensemos 15min

En grupo discutan y comenten que tipos de procesos de adquisiciones han visto en su experiencia durante sus practicas.



Gestión de las adquisiciones

Planificación de la Gestión de Adquisiciones

HACER	COMPRAR
• Es parte del "core" del negocio • Menos costoso • Fácil integración • Uso de capacidad existente • Control directo • Mantener secreto • Proveedores no confiables • Restricciones del proyecto	• No es parte del "core" • No siempre menos costoso Tiempo de entrega corto (algunas veces) • Uso del expertise del proveedor • Capacidad del proveedor



Gestión de las adquisiciones

Tipos de contratos

Un **contrato es un acuerdo vinculante** para las partes en virtud del cual el **proveedor** se compromete a brindar los productos, servicios o resultados especificados, y el **comprador** se compromete a pagar o aportar otra contraprestación válida.

Contratos de Precio Fijo (PF)

•El cliente y el contratista acuerdan un precio que no variará. Dentro de esta tipología estarían las Órdenes de Compra.

•Contrato por Costes Reembolsables (CR)

•El cliente acepta pagar a un contratista todos los costos reales en los que incurran durante el proyecto, más unos honorarios acordados.

•Contrato por Tiempos y Materiales (TM)

•Es una combinación de los anteriores, con un componente fijo (precio hora, precio por metro cuadrado, etc.) y un componente variable (la cantidad de horas, metros cuadrado, etc.) que serán finalmente necesarios para llevar a cabo el trabajo.

PUCP

Gestión de las Adquisiciones




Un contrato contiene:

- Comprador-vendedor
- Carácter vinculante
- Posee una implicancia legal

Precio Fijo - PF

Costo Reembolsable - CR

Tiempo y Material – T&M

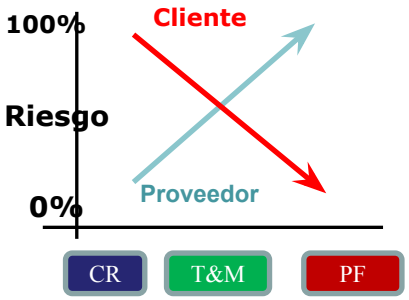

Contrato		Siglas	Ejemplo
Precio fijo	Cerrado	FFP	Comprar hierro por $150 el kilo.
	+ Incentivo	FPIF	Pagar $10.000 por el estudio de mercado más $100 por cada día de adelanto en la entrega en relación a la línea base.
	+ Ajuste	FPEPA	Pagar $2 millones por el edificio llave en mano más un ajuste inflacionario según el índice de precios de la construcción.
Reembolso	+ Honorario	CPFF	Re-integrar todos los gastos de una obra al contratista más un honorario de $3.000 por cada semana de trabajo.
	+ Incentivo	CPIF	Re-integrar todos los gastos de la construcción de una carretera, más un adicional del 50% sobre el ahorro de costos que consiga el contratista en relación a la línea base. El incentivo se basa en criterios objetivos (ahorro de costos, entrega temprana, etc.)
	+ Premio	CPAF	Re-integrar todas las horas de trabajo invertidas para el desarrollo de un software más un premio de $1000 en caso que el entregable final satisfaga las expectativas del cliente. El premio se basa en criterios subjetivos y no podrá tener reclamos legales por parte del vendedor.
Tiempo y materiales		T&M	Pagar $1000 por metro de perforación para un pozo de agua. Al desconocer la profundidad a la que se podría encontrar agua en las napas subterráneas, el precio final a pagar dependerá de los metros perforados.

PUCP

Gestión de las adquisiciones

Contratos y Riesgos

Nivel de riesgo de costo para el comprador

Muy bajo	Bajo		Medio	Alto		Muy alto
Precio fijo cerrado	Precio fijo más honorarios con incentivos	Precio fijo con ajuste económico de precio	Tiempo y materiales	Costos reembolsables más honorarios por cumplimiento de objetivos	Costos reembolsables más honorarios con incentivos	Costos reembolsables más honorarios fijos
Muy alto	**Alto**		**Medio**	**Bajo**		**Muy bajo**

Nivel de riesgo de costo para el proveedor

PUCP

Gestión de las adquisiciones

Conferencia de Oferentes



Análisis de Datos: Sistema de Ponderación

Criterio	Ponderación	Vendedor 1		Vendedor 2	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
Garantías	50%	7	3,5	9	4,5
Post-venta	30%	7	2,1	6	1,8
Precio	20%	7	1,4	5	1
TOTAL	**100%**	21	**7**	20	**7,3**

Administración de los Reclamos



Inspecciones



Auditorias



PUCP

Gestión de las adquisiciones

Tipos de contratos

Casos

SITUACIÓN	TIPO DE CONTRATO A USAR
Se necesita trabajar de inmediato.	Tiempo y Materiales
Se desea adquirir experiencia para determinar lo que hay que hacer.	Costos Reembolsables
Se sabe exactamente lo que hay que hacer	Precio Fijo
Se está obteniendo los servicios de un programador para aumentar personal.	Tiempo y Materiales
Se necesita tener realizado el trabajo, pero no se tiene tiempo para auditar las facturas en este trabajo	Precio Fijo

PUCP

Gestión de las adquisiciones

Contratos y Riesgos

El contrato es la mejor herramienta para transferir los riesgos. Los riesgos se transfieren por medio de las cláusulas contractuales.
LOS RIESGOS CUESTAN Y ALGUIEN TIENE QUEASUMIRLOS

- Si los asume el Comprador, se pagará menos al Vendedor.
- Si los asume el Vendedor, este cobrará más al Comprador.
- -Si se asignan excesivos riesgos al Vendedor, es probable que nadie esté dispuesto a asumirlos por un precio razonable.


Principio básico a tomar en cuenta: El riesgo debe asignarse a la parte que esté en mejor posición para manejarlo, para evitarlo o para mitigarlo de modo más eficiente.

PUCP

Gestión de las adquisiciones

Ejecución

Es un proceso de EJECUCION que busca llevara cabo la identificación inicial de los potenciales vendedores, trasmitir efectivamente la información sobre el trabajo necesario para ellos, recibir las respuesta de los vendedores, evaluar y seleccionar el mejor vendedor para el trabajo y firmar un acuerdo o contrato.

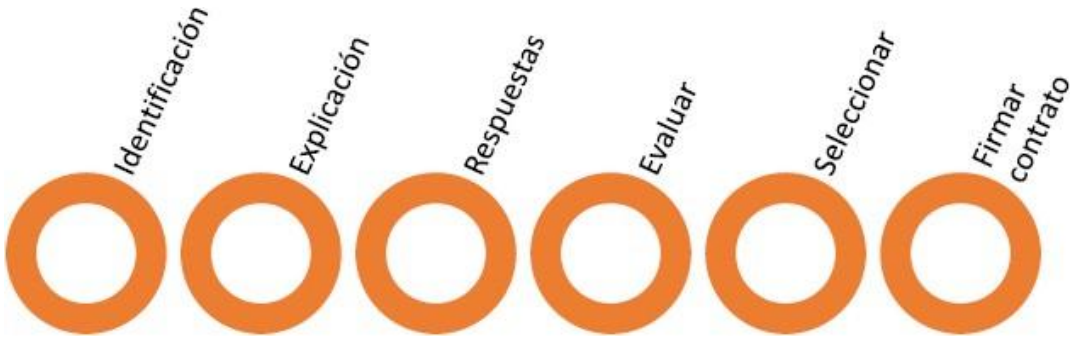

Ejecución - Herramientas

Ejemplo

		Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3	
CRITERIO	Peso	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje
1. Costo	20%	4	0,8	5	1	7	1,4
2. Tiempo de entrega	15%	8	1,2	7	1,05	4	0,6
3. Funcionalidad	25%	4	1	5	1,25	9	2,25
4. Mantenimiento	10%	6	0,6	6	0,6	4	0,4
5. Compatibilidad	10%	8	0,8	6	0,6	4	0,4
6. Garantía	20%	6	1,2	6	1,2	6	1,2
TOTAL	100%		5,6		5,7		**6,25**

Control

Asegura que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos contractuales. Se debe:

- Evaluar si los entregables están alineados a los términos contractuales.
- Monitorear si los pagos son acordes al trabajo realizado.

- Gestionar los cambios en el enunciado del trabajo y cerrar formalmente los contratos a medida que van culminando.

Cierre

Implica completar y resolver contratos y resolver cualquier elemento abierto. El equipo del proyecto debe:

- Determinar si todo el trabajo se completó correctamente y de manera satisfactoria.
- Actualizar registros para reflejar los resultados finales.
- Archivar información para uso futuro (Garantías, proceso de reclamo, mantenimientos, etc)
- El contrato en sí debe incluir requisitos para la aceptación formal y el cierre.

Actividad


Trabajo en Grupo

Construir la Matriz de Adquisiciones para su proyecto



La Gestión de los Recursos

Organigrama

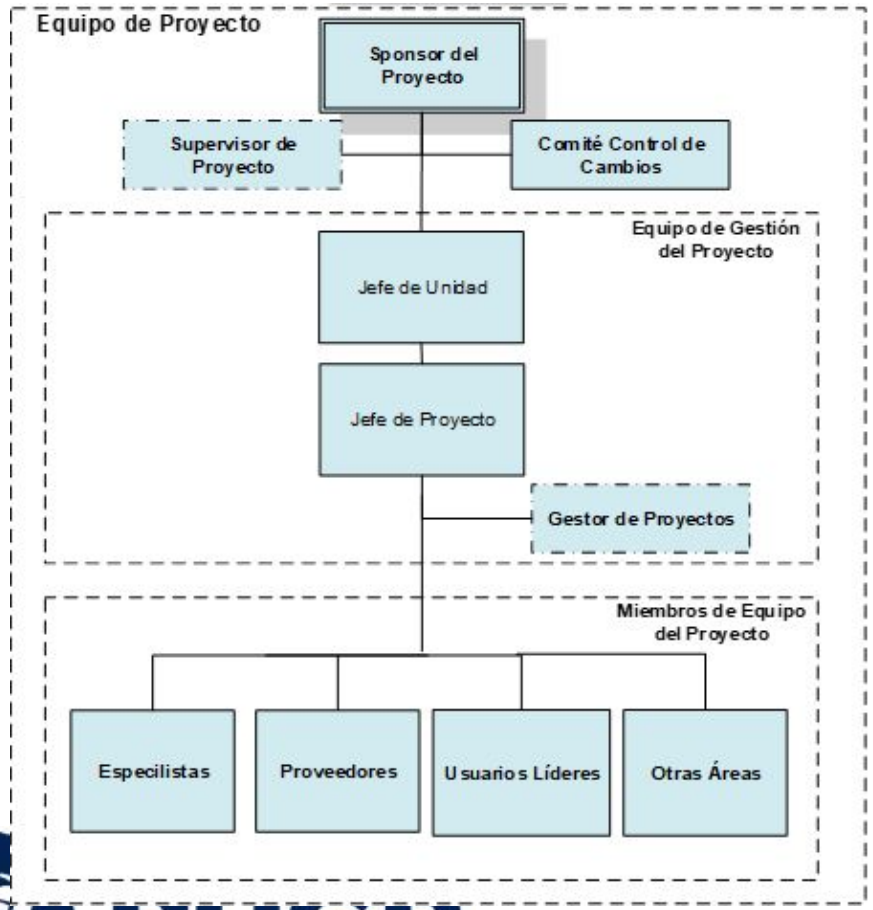

Matriz RACI

	Website Manager	Web Developer	Content Administrator	Web Administrator	Sales Manager
Project Planning	A	R	C	C	C
Website Construction	A	R	C	C	I
Content Review	I	C	A R	I	I
Usability Testing	I	A	C	R	
Installation of Tracking Software	I	A		R	
Ongoing Review of Visitors		A		R	I
Sales Follow-up to Frequent Users				I	A R

Perfil de Puesto



PERFIL DEL PUESTO

1- NOMBRE DEL PUESTO

OPERADOR

2- FUNCIONES GENERALES

La persona que se ocupe de esta posicion debera intervenir directamente a las actividades propias a la fabricacion de unidades(ensambles y su-enbsambles)

3- FUNCIONES ESPECIFICAS

1	Verificación de la localización, disposicion y condición adecuada de producto en proceso, materia prima y producto terminado relacionado con su celda de trabajo	7	Cumplir con las reglas de seguridad industrial y normas disciplinarias.
2	Realizarón de la operación de acuerdo a las instrucciones de trabajo, especificaciones y/o ayuda visuales que le apliquen y para los cuales sea	8	Garantizar el cumplimiento de las reglas del Justo a Tiempo
3	Verificación de la localización, disposicion y condición adecuada de los materiales, herramientas utiles de trabajo y equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones.	9	Suplir materiales a su estacion de trabajo desde los bines de materia prima
4	Mantener la limpieza y organización de su area de trabajo.		
5	Retrajar los rechazos inmediatamente estén disponibles y de acuerdo a la documentacion correspondiente.		
6	Documentar rechazos y productos en los registros de la lineas		

4- REQUERIMINETOS ACADEMICOS

1	Bachiller (No imprescindible)

5- OTROS REQUERIMIENTOS

N/A

6- REQUERIMIENTOS FISICOS

1	Se requiere que la persona permanezca la mayor parte del tiempo sentada

La Gestión de los Recursos

Plan de gestión de los Recursos


- **Identificación de recursos**.- Métodos para la identificación y cuantificación de los recursos del equipo y los recursos físicos necesarios.
- **Adquisición de recursos**.- Orientación sobre como adquirir los recursos del equipo y los recursos para el proyecto.
- **Roles y responsabilidades**
- **Organigramas del proyecto**
- **Gestión de los recursos del equipo del proyecto.-** Orientación sobre como definir, adquirir, gestionar y finalmente liberar los recursos del equipo.
- **Capacitación.-** Estrategias de capacitación para los miembros del equipo.
- **Desarrollo del equipo**.- Métodos para desarrollar el equipo del proyecto.
- **Control de recursos.-** Métodos para garantizar la disponibilidad de los recursos físicos.
- **Plan de reconocimiento**.- Tipos de reconocimientos y recompensas para el equipo.

Acta de Constitución de Equipo - Determina cómo el equipo internamente gestionará las comunicaciones, decisiones y conflictos junto con sus reglas básicas (comportamiento y convivencia)

PUCP

La Gestión de los Recursos


- El Acta de Constitución del Equipo de Proyecto (Team Project Canvas)

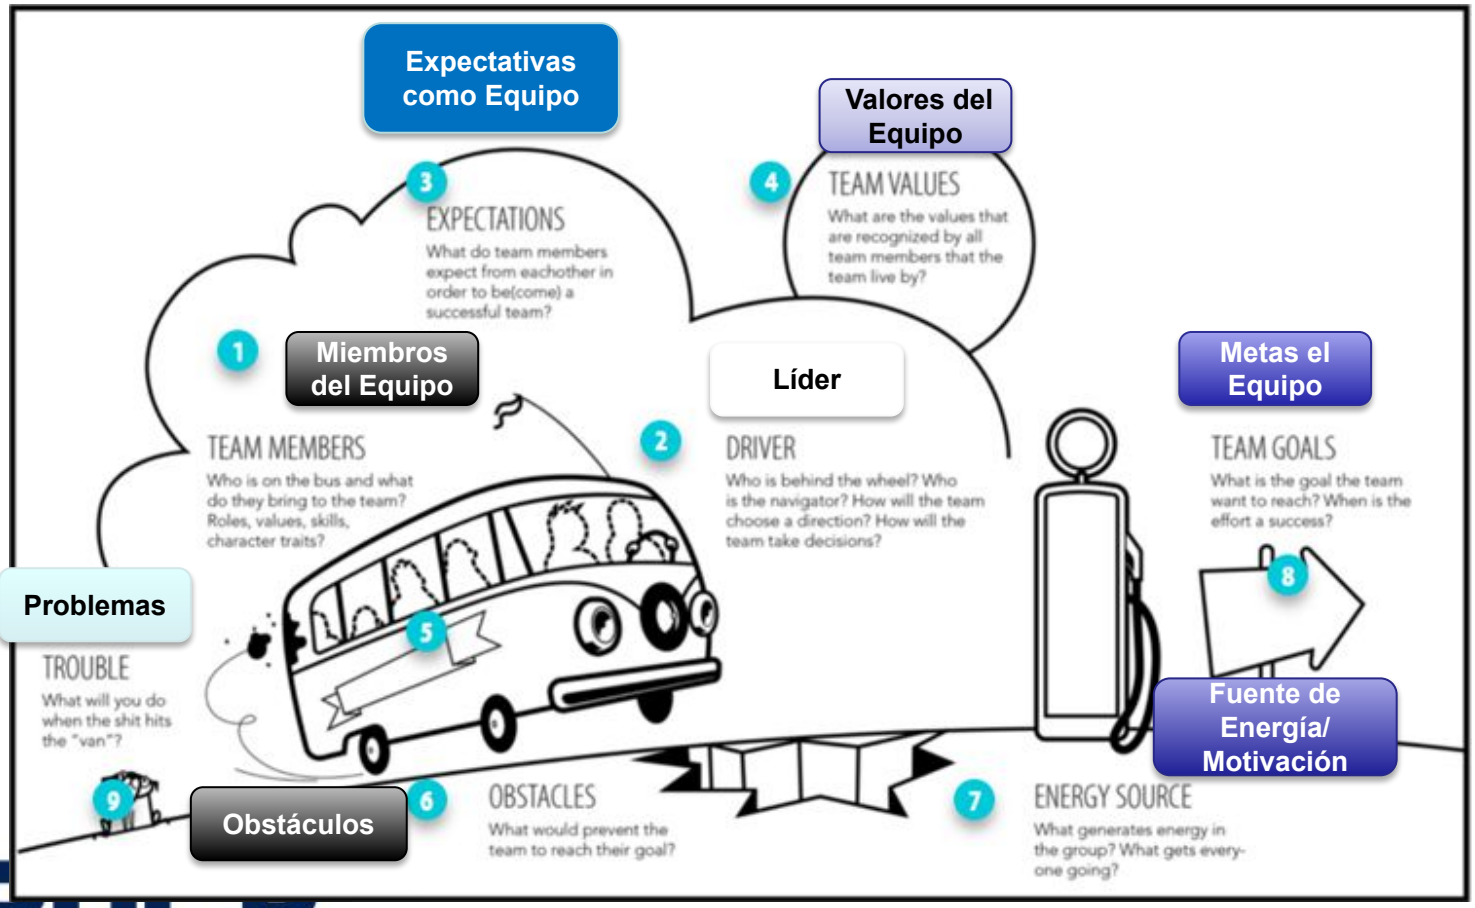

https://www.designabetterbusiness.tools/tools/team-charter-canvas

La Gestión de los Recursos

Estructura de Descomposición de Recursos (EDR)

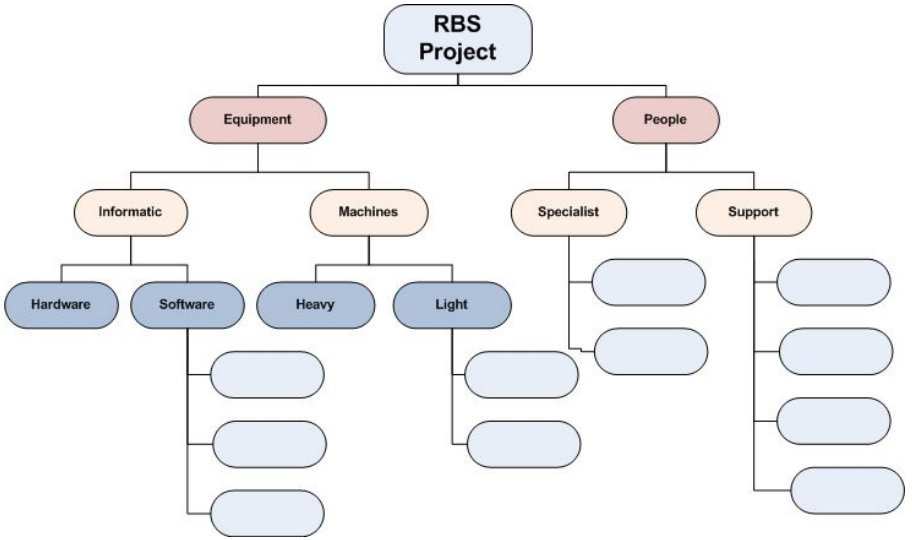

Adquirir Recursos	
Internos	Externos
Solicitar a los Gerentes Funcionales (o Gerentes de Recursos)	Proceso de adquisiciones (Compras y suministros)

Criterios de Selección

Disponibilidad	Costo	Capacidad
Experiencia	Conocimiento	Habilidades
Actitud	Factores internacionales	etc


PUCP

Gestión de los Recursos

Planes de Gestión del Personal e Histogramas de Recursos

Un plan de administración de personal describe cuándo y cómo se agregarán y sacarán las personas del equipo del proyecto.


Un histograma de recursos es un gráfico de columnas que muestra el número de recursos asignados a un proyecto a lo largo del tiempo

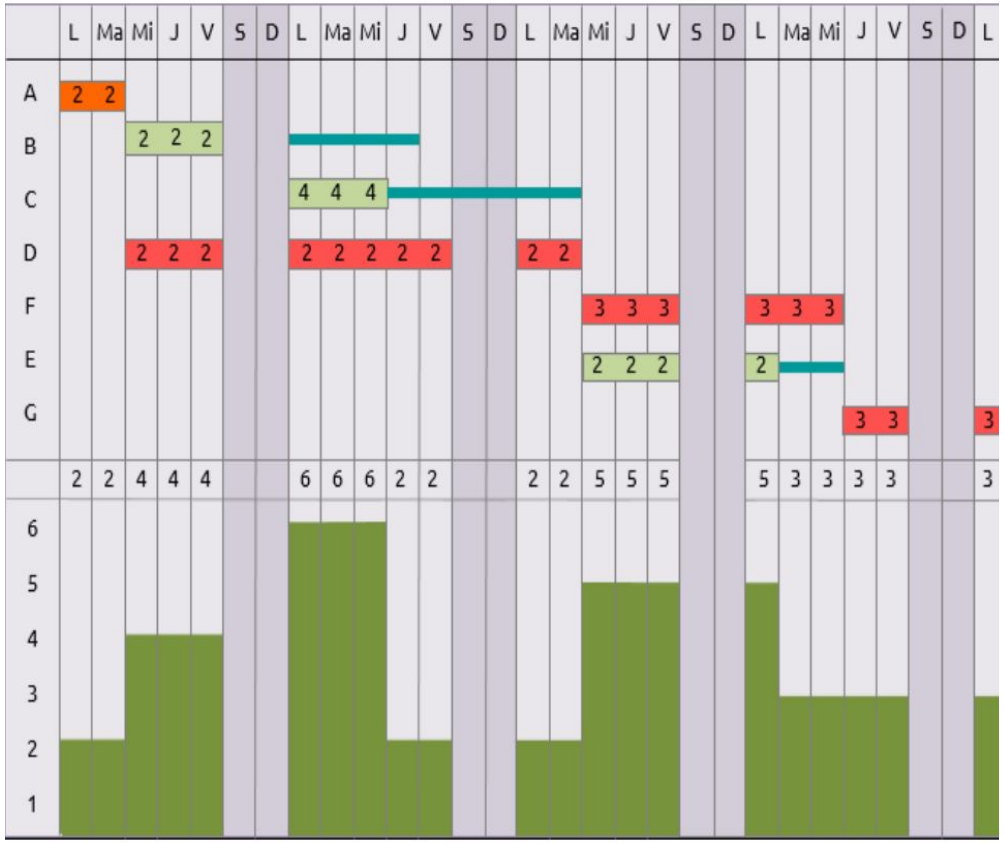

PUCP

Gestión de los Recursos

Desarrollar el equipo

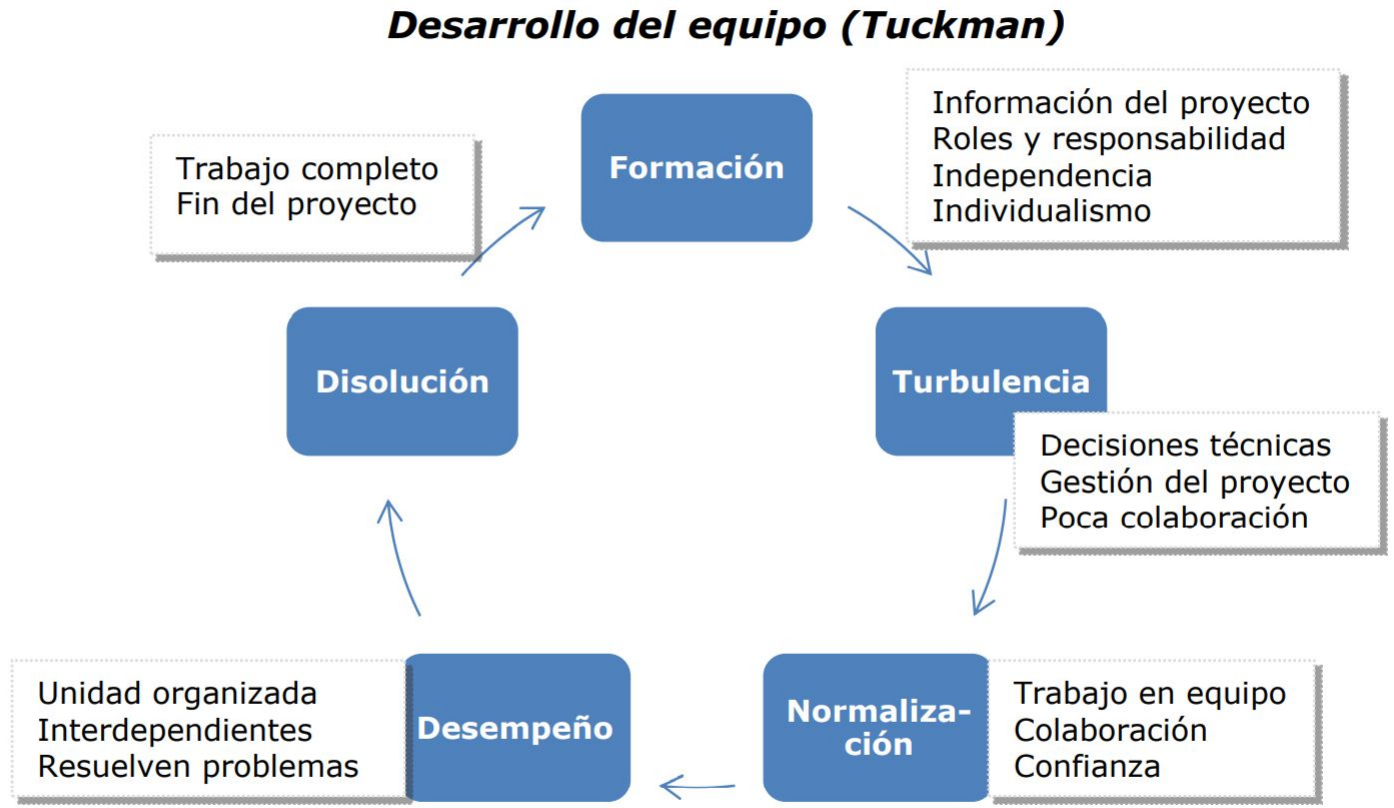

Gestión de los Recursos

Dirigir el equipo

TECNICAS DE NEGOCIACIÓN



Actividad

Trabajo en Grupo

Matriz RACI y Descripción de puestos



FIN DE LA SESIÓN

PUCP
