Presupuesto – Definición y Utilidad

La gestión del presupuesto consiste en la estimación de costos, el establecimiento de un presupuesto y el control de gastos durante el ciclo de vida del proyecto. Incluye herramientas y técnicas para prever y controlar los costos con el fin de garantizar que el proyecto se ejecute dentro de los límites financieros establecidos. La utilidad es la siguiente:

Garantiza la viabilidad del proyecto	Al definir un presupuesto, se asegura que el proyecto cuenta con los recursos financieros necesarios desde el inicio hasta el final.
Mejora el control financiero	Permite a los gerentes de proyecto identificar y controlar desviaciones de gastos, ajustando las decisiones según sea necesario para mantener el proyecto dentro del presupuesto.
Facilita la toma de decisiones informadas	Proporciona datos sobre los costos proyectados y reales, lo que ayuda a los gestores a tomar decisiones basadas en el rendimiento financiero actual del proyecto.
Optimiza el uso de recursos	Con una gestión adecuada, es posible priorizar y distribuir recursos financieros de forma que se maximice el valor entregado dentro del presupuesto aprobado.
Mitiga riesgos financieros	La gestión del presupuesto ayuda a anticipar y abordar posibles problemas financieros antes de que afecten el desarrollo del proyecto, como la falta de fondos o el sobrecosto.

Presupuesto – Insumos para estimación

PUCP
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Mano de Obra

Incluye todos los costos relacionados con el trabajo humano necesario para ejecutar el proyecto, tanto de recursos internos (empleados de la empresa) como externos (contratistas o consultores). Los costos pueden incluir salarios fijos si están en planilla o pagos variables por hora para contrataciones externas.

Maquinaria o herramienta

Abarca todos los equipos y herramientas físicas o digitales requeridos para llevar a cabo el proyecto. Esto incluye desde infraestructura tecnológica (como servidores y computadoras) hasta maquinaria específica para sectores como la construcción.

Materiales y/o Suministros

Comprende todos los insumos o recursos específicos necesarios para el desarrollo del proyecto, que no se consideran como maquinaria o mano de obra. Esto puede incluir desde suministros de oficina hasta licencias de software o cualquier elemento consumible que se emplee en el proyecto.

Servicios Terceros o Subcontratación

Incluye la contratación de proveedores externos para llevar a cabo actividades específicas del proyecto o la entrega de un producto concreto. Puede ser un servicio puntual, como el diseño de un componente, o la gestión completa de una tarea.

Presupuesto de : Contingencias / Gestión y Otros Costos

Estos costos son reservas financieras destinadas a cubrir imprevistos que puedan surgir durante el proyecto, como aumentos en los precios de los materiales o necesidades adicionales de recursos. También incluye costos de administración para coordinar, supervisar y controlar el proyecto. Este costo es transversal y se calcula al final de los 4 puntos anteriores.

Presupuesto – Insumos para estimación

Mano de Obra

De esta información debería salir el costo


ID	Entregable	Nombre de la tarea	Duración	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Predecesoras	Recursos asignados	Estado	% de avance
1	**Diseño de Arquitectura de Software**								
1.1		Definir requisitos funcionales del sistema	7 días	10/10/2024	16/10/2024	Ninguna	Analista de Negocios, Desarrollador	Completado	100%
1.2		Crear la estructura del diseño de software	10 días	17/10/2024	27/10/2024	1.1	Arquitecto de Software	En progreso	40%
1.3		Desarrollar el modelo de base de datos	8 días	28/10/2024	5/11/2024	1.2	Desarrollador, DBA	No iniciado	0%
1.4		Revisar y validar diseño con el equipo de desarrollo	5 días	6/11/2024	10/11/2024	1.3	Arquitecto de Software, Equipo de QA	No iniciado	0%
1.5		Aprobar diseño de arquitectura final	3 días	11/11/2024	13/11/2024	1.4	Arquitecto de Software	No iniciado	0%
2	**Acta de Constitución del Proyecto**								
2.1		Reunir interesados clave para definir el alcance del proyecto	5 días	6/10/2024	10/10/2024	Ninguna	Jefe de Proyecto, Interesados clave	Completado	100%
2.2		Redactar el acta de constitución del proyecto	4 días	11/10/2024	14/10/2024	2.1	Jefe de Proyecto	En progreso	75%
2.3		Validar el acta con los patrocinadores	3 días	15/10/2024	17/10/2024	2.2	Jefe de Proyecto, Patrocinadores	No iniciado	0%
2.4		Aprobar y firmar el acta de constitución	2 días	18/10/2024	19/10/2024	2.3	Jefe de Proyecto, Patrocinadores	No iniciado	0%

Nota 1: En el Project o si haces un Excel Tienes que redactar en una columna Entregable/Nombre de tarea y debajo de cada entregable asociado a tu EDT redactarás las actividades las cuales son las que tiene asignado los campos que se muestran. El ejemplo es para que de manera grafica puedas asociar el EDT y con las actividades del cronograma.

Nota 2: Otra opción valida es hacer un cronograma de los entregables es decir poner “diseño de arquitectura” la duración total que para este caso seria 33 días; inicia 10/10 y acaba el 13/11 y así ir agrupando todas las actividades al entregable, es otra opción. No obstante, en la vida real te resta campo de acción para hacer seguimiento.

Presupuesto – Insumos para estimación

Mano de Obra	S/. 100,000
Materiales y/o Suministros	S/. 20,00
Maquinaria o herramienta	S/. 15,000
Servicios Terceros o Subcontratación	S/. 10,000

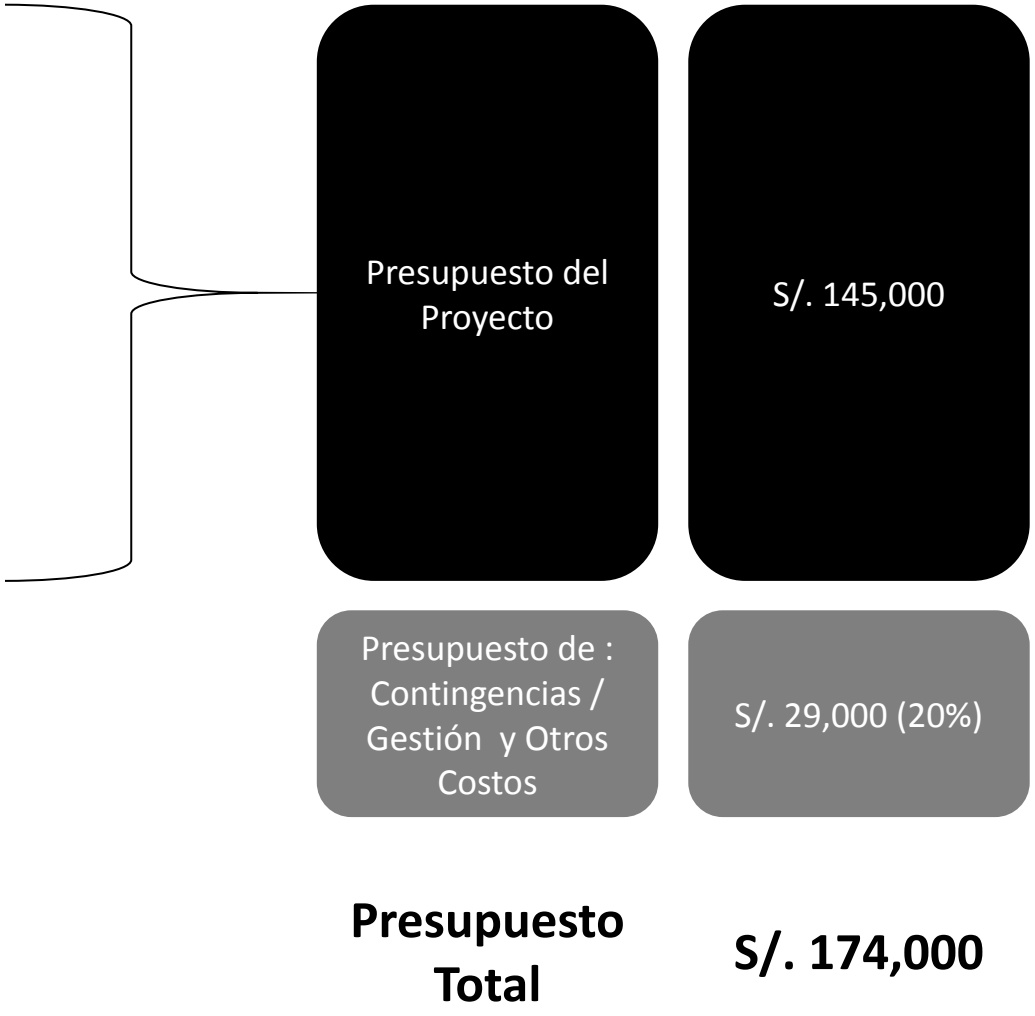

Presupuesto – Flujo de caja

El flujo de caja de un proyecto es una herramienta financiera clave que permite planificar, controlar y anticipar los movimientos de dinero involucrados en el proyecto. Este flujo incluye tanto los ingresos o ahorros generados por el proyecto, como los egresos necesarios para su ejecución. La gestión del flujo se determina restando ingresos – egresos, estos puestos en una línea de tiempo.

