GESTIÓN DE PROYECTOS · EQUIPO 5

# DSC PUCP Workshops

## Presupuesto y plan del proyecto · Presentación parcial

Acta · EDT · Cronograma · Presupuesto



MAR – JUL 2027

Jorge Josue Chamorro Cayetano · Enzo Andre Avila Mamani · Gandy Margoreth Zinanyuca Huillca · José Alfonso Michca Paqui · Lucas Mattias Alvites Galarza (Gerente de Proyecto)

# PROPÓSITO DEL PROYECTO

Un **programa integral de entrenamiento y networking** que capacita de forma escalonada y valida lo aprendido con competencias progresivas.

### Desarrollo con IA
Web con agentes de IA

### Datos y ML
Ciencia de datos, machine learning y LLM

### Google Cloud
Cloud Run, BigQuery, MLOps y DevOps

### Pitch
Comunicar y «vender» lo que se construye

**21**
sesiones prácticas de 2 horas

→

**4**
competencias progresivas

→

**24 h**
Hackathon Internacional de cierre

Diseñado para repetirse cada ciclo académico, actualizando el contenido según las tendencias de la industria.

# EL PROBLEMA

Los planes de estudio no siguen el ritmo de la IA y la nube: el estudiante **egresa sin haber desplegado un producto funcional**.

### Sin portafolio

Compite en desventaja por prácticas que piden portafolio y pruebas técnicas.

### Sin ruta validada

Se autoforma con tutoriales dispersos o cursos pagados que no todos pueden costear.

### Sin pitch

Desarrolla poco la habilidad de comunicar y «vender» lo que construye.

**+100**
alumnos encuestados; el 60 % prioriza IA, web o cloud

**+100**
expertos registrados para 45–50 necesarios

**~500**
plazas en 5 meses (meta: 300 participantes únicos)

**S/ 2,000**
superávit objetivo como capital semilla

RUTA DE TALLERES 2027

# DE MARZO A JULIO

| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|---|---|---|---|---|
| **Módulo I «Hack With DSC»** | **Módulo II «IA y Machine Learning»** | **Torneo de Vibecoding (8 h)** | **Módulo III «Google Cloud»** | **Hackathon Internacional (24 h)** |
| Hackathon Kachimbo · sáb 27/03 | Competencia de Kaggle · sáb 24/04 | Open PUCP · sáb 29/05 | Premiación GCP · sáb 26/06 | NTT Data Perú · 31/07 – 01/08 |

**21** sesiones formativas de 2 horas en 3 módulos

**4** competencias de dificultad creciente

ACTA · ENTREGABLES

# 13 ENTREGABLES, 3 FASES

## FASE 1 · PREPARACIÓN

sep 2026 – feb 2027

**E1** Plan de Dirección del Proyecto · **30/10/2026**

**E2** Plan logístico y espacios · 15/01/2027

**E3** Acuerdos de patrocinio · **22/01/2027**

**E4** Programa y red de expertos · 05/02/2027

**E5** Web y campaña de difusión · 15/02/2027

## FASE 2 · EJECUCIÓN

y medición · mar – jul 2027

**E6** Módulo I «Hack With DSC» · 27/03

**E7** Módulo II «IA y ML» · 24/04

**E8** Torneo de Vibecoding (8 h) · 29/05

**E9** Módulo III «Google Cloud» · 26/06

**E10** Hackathon de 24 h · 31/07 – 01/08

**E11** 5 reportes de seguimiento

## FASE 3 · CIERRE

agosto 2027

**E12** Informe final de resultados · **13/08/2027**

**E13** Plan de continuidad y cierre administrativo · 20/08/2027

En naranja, los hitos clave: Plan de Dirección, acuerdos de patrocinio e informe final.

# LISTA DE INTERESADOS

## Equipo organizador

- Presidencia (patrocinador)
- Gerencia de Proyecto
- Equipo 5 (planificación)
- Logística y Eventos
- Marketing y Comunidad
- Relaciones Exteriores
- Finanzas y Legalidad · RR.HH.
- Software · Infraestructura

## Aliados y espacios

- DAES (acceso de externos)
- Pabellón V: laboratorios y servidores
- Open PUCP
- NTT Data Perú (aliado estratégico)
- Sección de Informática PUCP
- Logística de la FCI

## Participantes

- Estudiantes de 1.º a 6.º ciclo y egresados
- Speakers (ponentes)
- Mentores
- Jurados
- Voluntarios de DSC PUCP

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

# EDT EN 5 FASES

## 1 · Inicio

**4**

**entregables**

Acta, alcance preliminar, acuerdos iniciales con patrocinadores y registro de interesados

## 2 · Planificación

**9**

**planes**

Plan integrador, cronograma, contenidos (calidad), comunicaciones, alcance, costos, recursos, riesgos y adquisiciones

## 3 · Ejecución

**9**

**paquetes**

2 paquetes transversales y 7 eventos: 3 rondas de talleres y 4 competencias

## 4 · Control

**3**

**entregables**

Registro de riesgos actualizado, control de cambios e informes de control por evento

## 5 · Cierre

**6**

**entregables**

Informe final, acuerdos cerrados, lecciones aprendidas, cierre administrativo, repositorio y sugerencias

# PAQUETES Y EVENTOS

## PAQUETES TRANSVERSALES

### 3.1
**Patrocinios y adquisiciones**

Contratos con sponsors y compra del merchandising

### 3.2
**Publicidad y difusión**


Piezas gráficas e informes de campañas

## SIETE EVENTOS = SIETE CUENTAS DE CONTROL

| Código | Evento | Tipo |
|---|---|---|
| 3.3 | Módulo I «Hack With DSC» | Talleres |
| 3.4 | Módulo II «IA y Machine Learning» | Talleres |
| 3.5 | Módulo III «Google Cloud Platform» | Talleres |
| 3.6 | Hackathon «Kachimbo» | Competencia |
| 3.7 | Competencia de Kaggle | Competencia |
| 3.8 | Torneo de Vibecoding (8 h) | Competencia |
| 3.9 | Hackathon Internacional (24 h) | Competencia |

Cada evento es una **cuenta de control**: el nivel al que se estima el costo y se mide el desempeño.

# CRONOGRAMA GENERAL

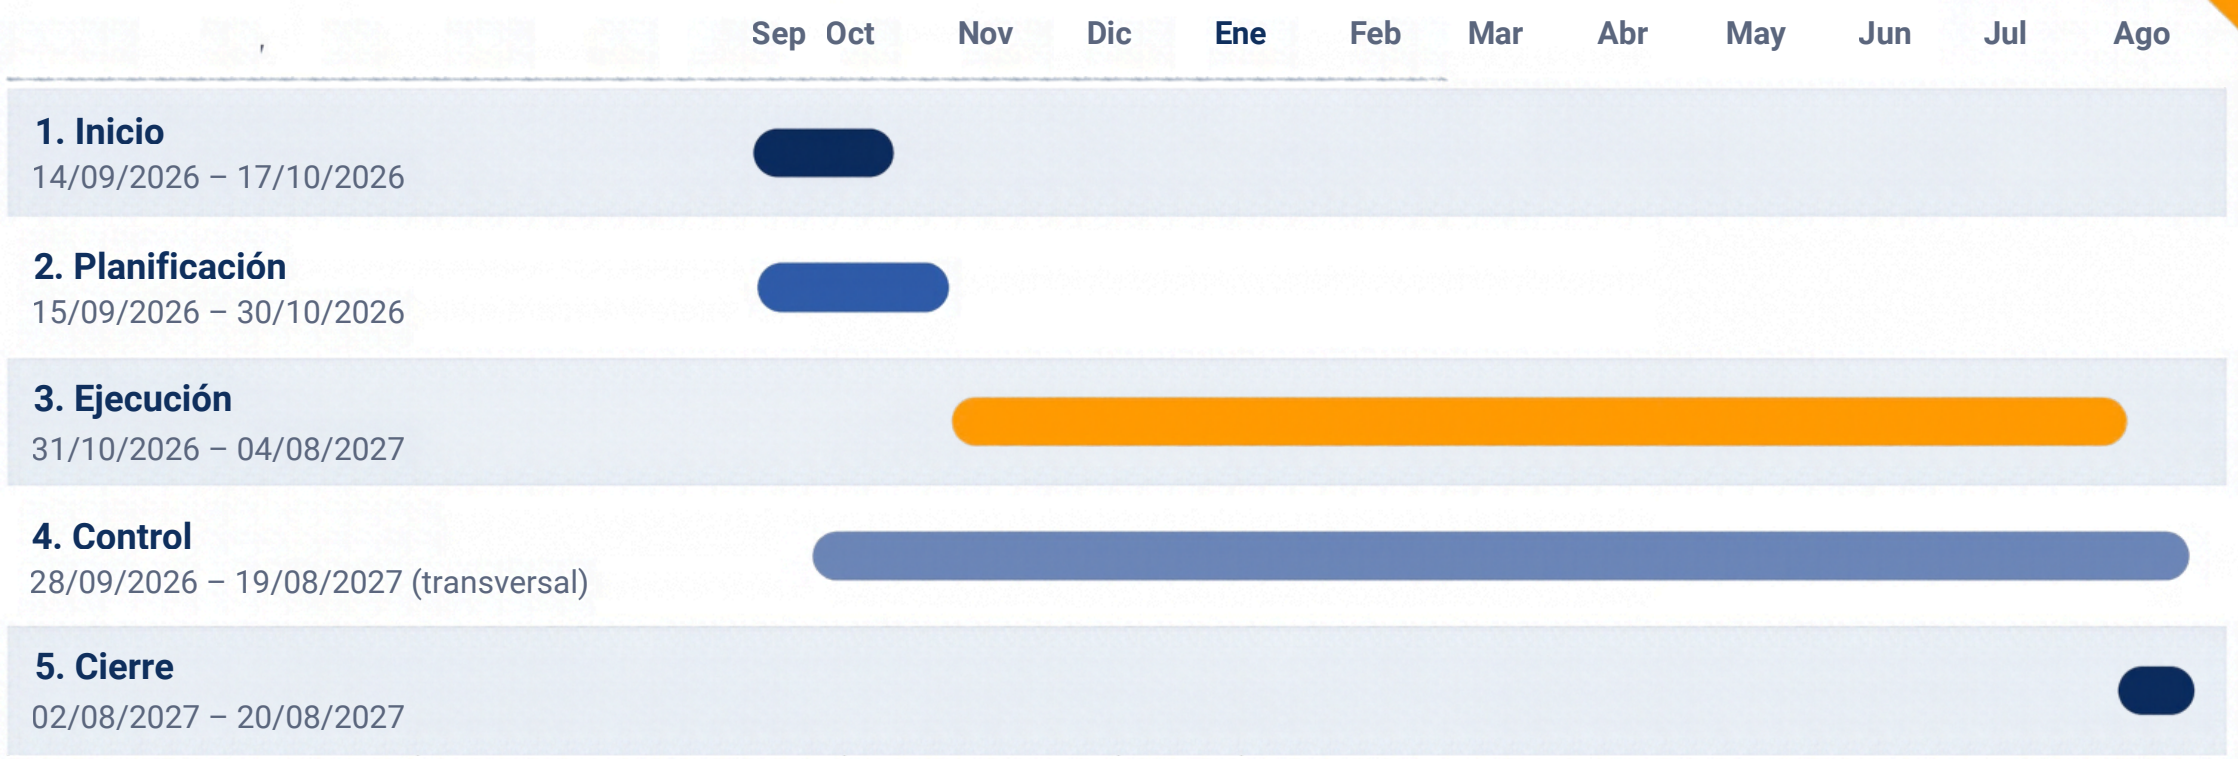


Ejecución pública de los eventos: **marzo a julio de 2027**, con 22 hitos de control (H01 – H22).

CRONOGRAMA · FECHAS TOPE DEL ACTA

# HITOS DEL PROYECTO

| Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| **H01 – H02** | **H03 – H08** | **H09 – H15** | **H16 – H20** | **H21 – H22** |
| 2 hitos | 6 hitos | 7 hitos | 5 reportes | 2 hitos |

**H06 · PLANIFICACIÓN**

## 22/01/2027

Acuerdos de patrocinio firmados: decisión go/no-go financiera

**H15 · EJECUCIÓN**

## 01/08/2027

Hackathon Internacional de 24 h: evento cumbre

# RIESGOS PRIORITARIOS

| P \ I | Impacto medio | Impacto alto |
|---|---|---|
| Alta | R4 R15 | R1 R3 R8 |
| Media | R7 R13 R14 | R2 R5 R6 R9 R10 |
| Baja | | R11 R12 |

Probabilidad (P) por impacto (I). Prioridad: alta probabilidad e impacto alto.

### R1 · No alcanzar la meta de auspicios

Gestión desde noviembre de 2026, paquetes escalonados y auspicios en especie; go/no-go el 22/01/2027 con escenario reducido si se logra menos del 60 %.

### R3 · Calendario 2027-1 distinto del propuesto

Validar el calendario oficial apenas se publique (diciembre de 2026) y reprogramar, alternativa: iniciar el Módulo I en la primera semana de clases.

### R8 · Deserción del staff voluntario

Titular y respaldo por tarea, carga distribuida, reconocimiento y certificados, y monitoreo de los KPIs de RR.HH.

ACTA · REQUISITOS DE APROBACIÓN

# CRITERIOS DE ÉXITO

### APRENDIZAJE

**≥ 80 %**

de los equipos de la hackathon final despliega un producto funcional en la nube

### SATISFACCIÓN

**> 60**

de NPS en las encuestas de talleres y competencias

### FINANZAS

**100 %**

de la meta de auspicios, con superávit al cierre

### VOLUNTARIADO

**≥ 85 %**

de retención del staff durante los 5 meses

### ALIANZAS

**≥ 50 %**

de los sponsors renueva su intención de patrocinio

**Aprueba el Patrocinador** (Leonardo Flores Vera, Presidente de DSC PUCP). El Gerente de Proyecto presenta la evidencia en el E12.

PRESUPUESTO · ENFOQUE

# CASI TODO ES EN ESPECIE

EN ESPECIE

## S/ 0.00

- Recurso humano voluntario: ponentes, mentores, jurados y staff
- Espacios cedidos: Pabellón V, Open PUCP y sede de NTT Data Perú
- Créditos GCP y licencias del programa de Google

MONETARIO

## S/ 14,520

- Alimentación (catering, refrigerios y snacks)
- Materiales y merchandising
- Premios
- Servicios y tecnología

PRESUPUESTO · CONSTRUCCIÓN ESCALONADA (S/)

# RESUMEN DEL PRESUPUESTO

**Costo del proyecto**

**14,520**

Fases 1 a 5

+

**Reserva de contingencia**

**1,160**

Riesgos identificados

=

**Línea base de costos**

**15,680**

Base de la curva S

+

**Reserva de gestión (5 %)**

**784**

La libera el Patrocinador

=

**Presupuesto del proyecto**

**16,464**


Total final

**0 %** **Ganancia e IGV:** no aplican porque el programa es gratuito; el excedente se mide como superávit.

La contingencia está **dentro** de la línea base; la reserva de gestión queda **fuera**.

PRESUPUESTO · POR CUENTA DE CONTROL (S/)

# COSTO POR ENTREGABLE

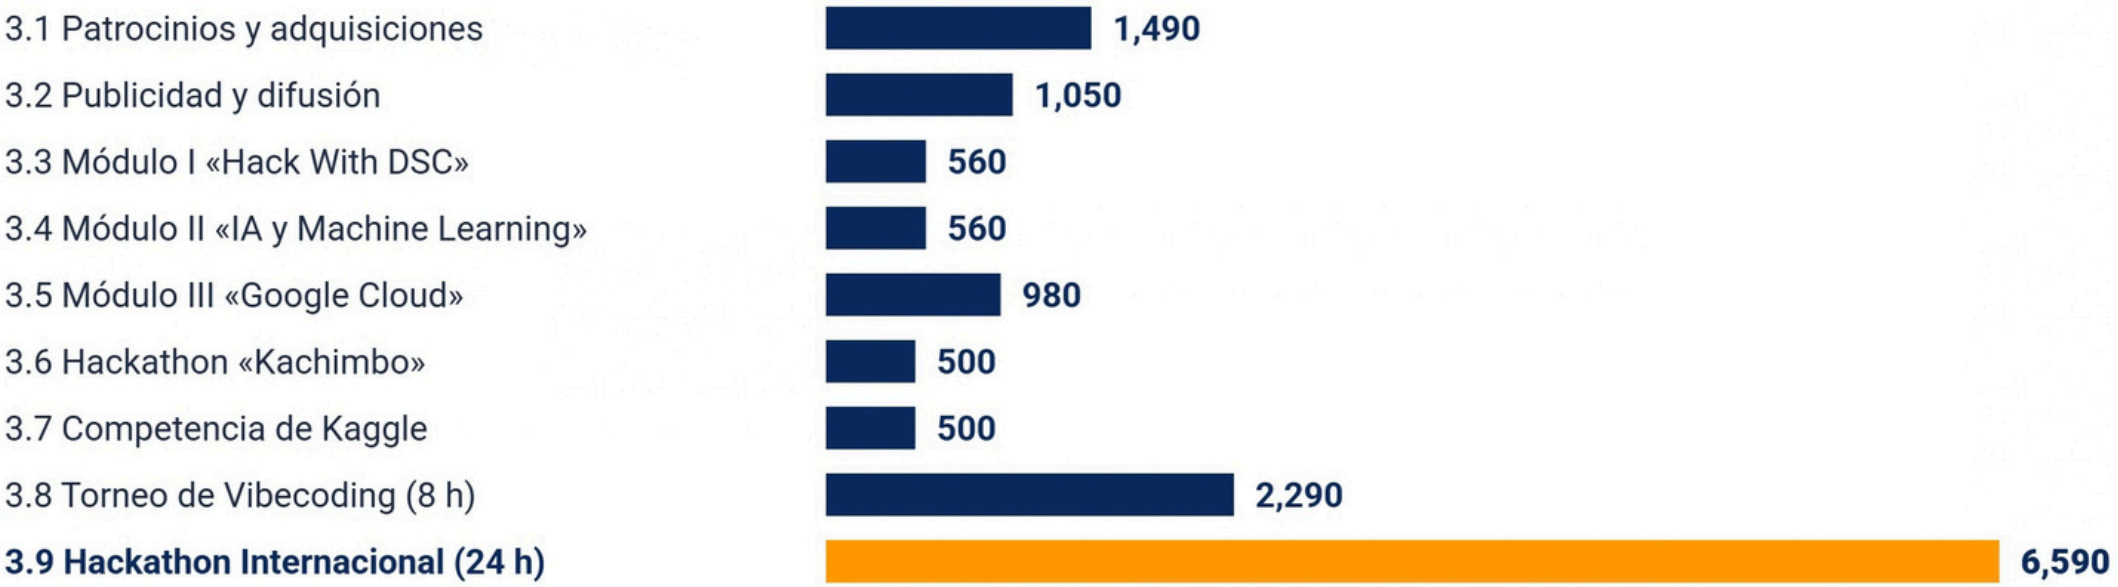


La hackathon de 24 h concentra el **45 %** del costo total de **S/ 14,520**.

Inicio, Planificación, Control y Cierre: **S/ 0** (trabajo voluntario).

PRESUPUESTO · POR TIPO DE RECURSO

# COSTO POR TIPO




**Alimentación**
**S/ 8,490**
Catering, refrigerios y snacks

**Materiales**
**S/ 2,610**
Merchandising e insumos

**Premios**
**S/ 1,950**
13 % del costo

**Servicios**
**S/ 1,410**
10 % del costo

**Tecnología**
**S/ 60**
Menos del 1 %

Total monetario: **S/ 14,520**. La alimentación es más de la mitad del costo.

MAYOR CUENTA DE CONTROL · 3.9

# HACKATHON 24 H

| Partida | Cálculo | S/ |
|---|---|---|
| Catering (pizzas, bocaditos, refrescos) | 170 × 8.00 × 3 | 4,080 |
| Premios (S/ 500, 300 y 200) | 1 evento | 1,000 |
| Snacks y bebidas durante 24 h | 170 × 3.00 | 510 |
| Seguridad nocturna | 2 × 15.00 × 12 h | 360 |
| Movilidad de jurados | 8 × 30.00 | 240 |
| Decoración y señalética | 1 × 150.00 | 150 |
| Insumos eléctricos | 6 × 25.00 | 150 |
| Botiquín y protocolo de emergencia | 1 × 100.00 | 100 |
| Total 3.9 | | 6,590 |

Catering para 150 participantes + 20 (staff y jurados). Streaming sin costo.



# RESERVA DE CONTINGENCIA

| Riesgo | Concepto | S/ |
|---|---|---|
| R10 | Router 4G y datos de respaldo (uno por hackathon) | 240 |
| R6 | Traslado a sede alternativa del evento de 24 h | 200 |
| R4 / R5 | Reimpresión de piezas y difusión adicional | 150 |
| R9 | Catering para 20 asistentes adicionales | 480 |
| R9 | Snacks para 30 asistentes adicionales | 90 |
| | Total reserva de contingencia | 1,160 |

**S/ 1,160**

Solo se ejecuta si el riesgo ocurre

**R1 y R2 sin reserva**

Los riesgos financieros se gestionan con el go/no-go y los tramos de desembolso.

PRESUPUESTO · RECURSO HUMANO

# ESFUERZO POR RECURSO

**5,222**

**horas-persona**

Costo monetario de **S/ 0.00**, pero el esfuerzo sí se estima y se controla.

Voluntarios DSC: **30 %** del esfuerzo



PRESUPUESTO · FINANCIAMIENTO (S/)

# SUPERÁVIT PROYECTADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capital semilla DSC PUCP<br>**300** | + | Meta de auspicios corporativos<br>**18,200** | = | Total financiamiento<br>**18,500** |
| Total financiamiento<br>**18,500** | − | Presupuesto del proyecto<br>**16,464** | = | Superávit proyectado<br>**2,036** |

**Cumple la meta de S/ 2,000** del Acta, aun si se consumen la reserva de contingencia y la de gestión.

PRESUPUESTO · ENERO A AGOSTO DE 2027 (S/)

# FLUJO DE CAJA

**Ingresos** 18,500

**Egresos** 14,520

**Saldo acumulado** 3,980

| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 300 | 5,460 | – | 3,640 | – | 9,100 | – | – | 18,500 |
| Egresos | 60 | 2,080 | 1,140 | 1,140 | 2,370 | 1,060 | 6,670 | 0 | 14,520 |
| Saldo del mes | 240 | 3,380 | −1,140 | 2,500 | −2,370 | 8,040 | −6,670 | 0 | 3,980 |
| Acumulado | 240 | 3,620 | 2,480 | 4,980 | 2,610 | 10,650 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |

**Julio** es el mes de mayor egreso (**S/ 6,670**) por la Hackathon Internacional de 24 h.

PRESUPUESTO · AUSPICIOS (S/ 18,200)

# TRAMOS DE DESEMBOLSO

| 30 % Tramo 1 | 20 % Tramo 2 | 50 % Tramo 3 |
|---|---|---|

### TRAMO 1 · FEBRERO

## S/ 5,460

Antes del 02/02: orden de compra del merchandising y 30 días antes del Módulo I

### TRAMO 2 · ABRIL

## S/ 3,640

Antes del 29/04: 30 días antes del Torneo de Vibecoding

### TRAMO 3 · JUNIO

## S/ 9,100

Antes del 30/06: 30 días antes de la hackathon de 24 h

**S/ 240** Saldo acumulado mínimo del periodo: nunca es negativo, porque ninguna compra se compromete antes de recibir los fondos.

DSC PUCP WORKSHOPS · EQUIPO 5

# ¡Gracias!

## ¿Preguntas?



| S/ 16,464 | S/ 18,500 | S/ 2,036 |
| --- | --- | --- |
| presupuesto | financiamiento | superávit |
