FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

17 FEB. 2016

Código del alumno

2	0	0	8	2	1	1	6

Nombre del alumno

Joseph Israel Magán Palomino

1er EXAMEN DE

IND 328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A 303

Horario: 1031 - 1

Fecha: 03 / 02 / 2016

Nota: 18

Nombre del profesor del curso

R. Vega

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Ciclo 2016 0)

Indicaciones generales:


- Duración: 2.5 horas.
- El examen es sin libros ni apuntes de clase.
- Todas sus respuestas deberán estar en este material.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

---

1. Caso (10 Puntos)

Una entidad del Gobierno Central, lo convoca a usted en su calidad de Gerente de Proyectos de la importante empresa consultora "XYZ Consultores S.A.".

Le comentan de la necesidad de los Gobiernos Regionales de definir criterios o líneas de acción para la formulación de sus ***"Planes Estratégicos de Desarrollo Concertados"***, y la carencia de especialistas que apoyen este trabajo.

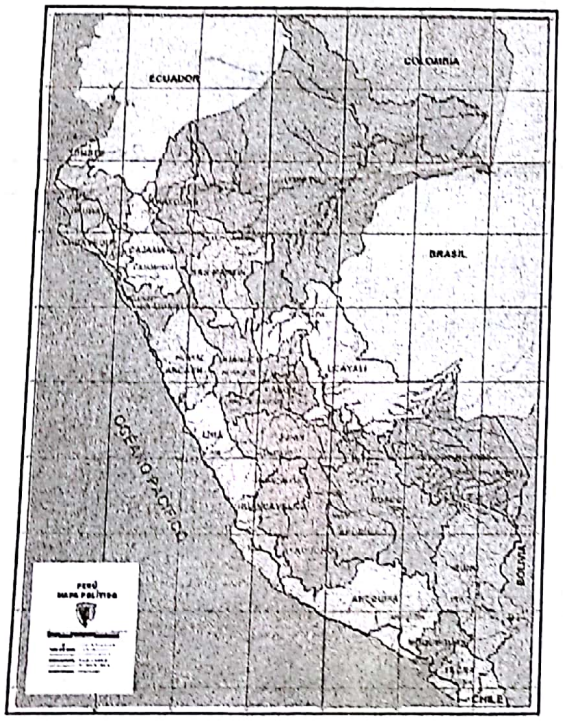

Le informan que el proyecto consiste en desarrollar **Talleres** en cada uno de los departamentos del país, en los que durante dos días, desarrollarán debates en el primero y una plenaria de conceso en la mañana del segundo, y finalmente emitirán un documento formal denominado: ***"Lineamientos Estratégicos de la Región XX 2015 -2020".***

Le indican que por la naturaleza del trabajo deberán participar en cada Taller, 10 representantes del Gobierno Regional y 10 representantes de la Sociedad Civil Organizada, se determina que para estas reuniones, se necesitarán ambientes apropiados fuera de la sede del Gobierno Regional, materiales y equipos adecuados para el desarrollo del mismo.

La entidad contratante, ha efectuado coordinaciones con los Gobiernos Regionales y éstos han ofrecido el tiempo de sus principales funcionarios para estos días, asimismo se comprometerían a ubicar e invitar a los representantes de la Sociedad Civil que sean necesarios.

Se le indica que como resultado o producto de cada Taller en los Gobiernos Regionales, también deberá entregar un "***Informe de Trabajo en la Región XX"***, *además de un informe final: "**Lineamientos Estratégicos Perú 2015 2020"***. El Plazo de entrega del Informe Final es de 45 días calendario, una vez firmado el contrato.

Internamente usted sabe que para este tipo de actividades cuenta con 5 especialistas planificadores al interior de la consultora.


Con esta información, se pide:

a. Prepare el Acta de Constitución del Proyecto (2 puntos).


2

- EMPRESA GESTORA DEL PROYECTO: "XYZ" Consultores S.A"
- CLIENTE: Entidad del Gobierno Central
- Instituciones Interesadas: Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Sociedad Civil Organizada (SCO).
- Objetivos: Desarrollar talleres de debate y consenso entre representantes de los gobiernos regionales y la Sociedad civil organizada para la formulación de sus "Planes Estratégicos de Desarrollo Concertados".
- Alcance: Gestionar el desarrollo de talleres de debate y consenso a nivel nacional en cada uno de los departamentos del país con 10 representantes de los gobiernos regionales y 10 representantes de la Sociedad civil organizada con el fin de formular sus Planes Estratégicos de desarrollo Concertados en un plazo de 45 días calendario y cuyo entregable final son los Lineamientos Estratégicos Perú 2015-2020.
- Entregables: * "Informe de trabajo en la región XX"
  * "Lineamientos Estratégicos Perú 2015-2020".
- Riesgos: * Sobrepasar la capacidad de personal de la SCO. (No muchos representantes)
  * Retraso en el transporte y traslado de los representantes de la SCO. (Vuelos cancelados, mal clima, carreteras bloqueadas, etc.)
  * Ambientes ~~reserva~~ de reuniones y hoteles ya reservados en los distintos regiones.
  * Fortuitos que retrasen el cronograma o las reuniones (enfermedad de representantes, que no se llegue a un consenso, etc.)
- Requisitos: Ambiente de reunión, materiales y equipos.
- Hitos: * Coordinación con hoteles y empresas dueños de ambientes para reserva y costeo.
  * Coordinación de disponibilidad de representante y reserva y compra de boletos, asegurar transporte.
  * Desarrollo de los talleres en las Regiones.
  * Elaboración y presentación de los entregables.

b. Desarrolle la estructura de descomposición del trabajo (EDT) del proyecto (2 puntos).

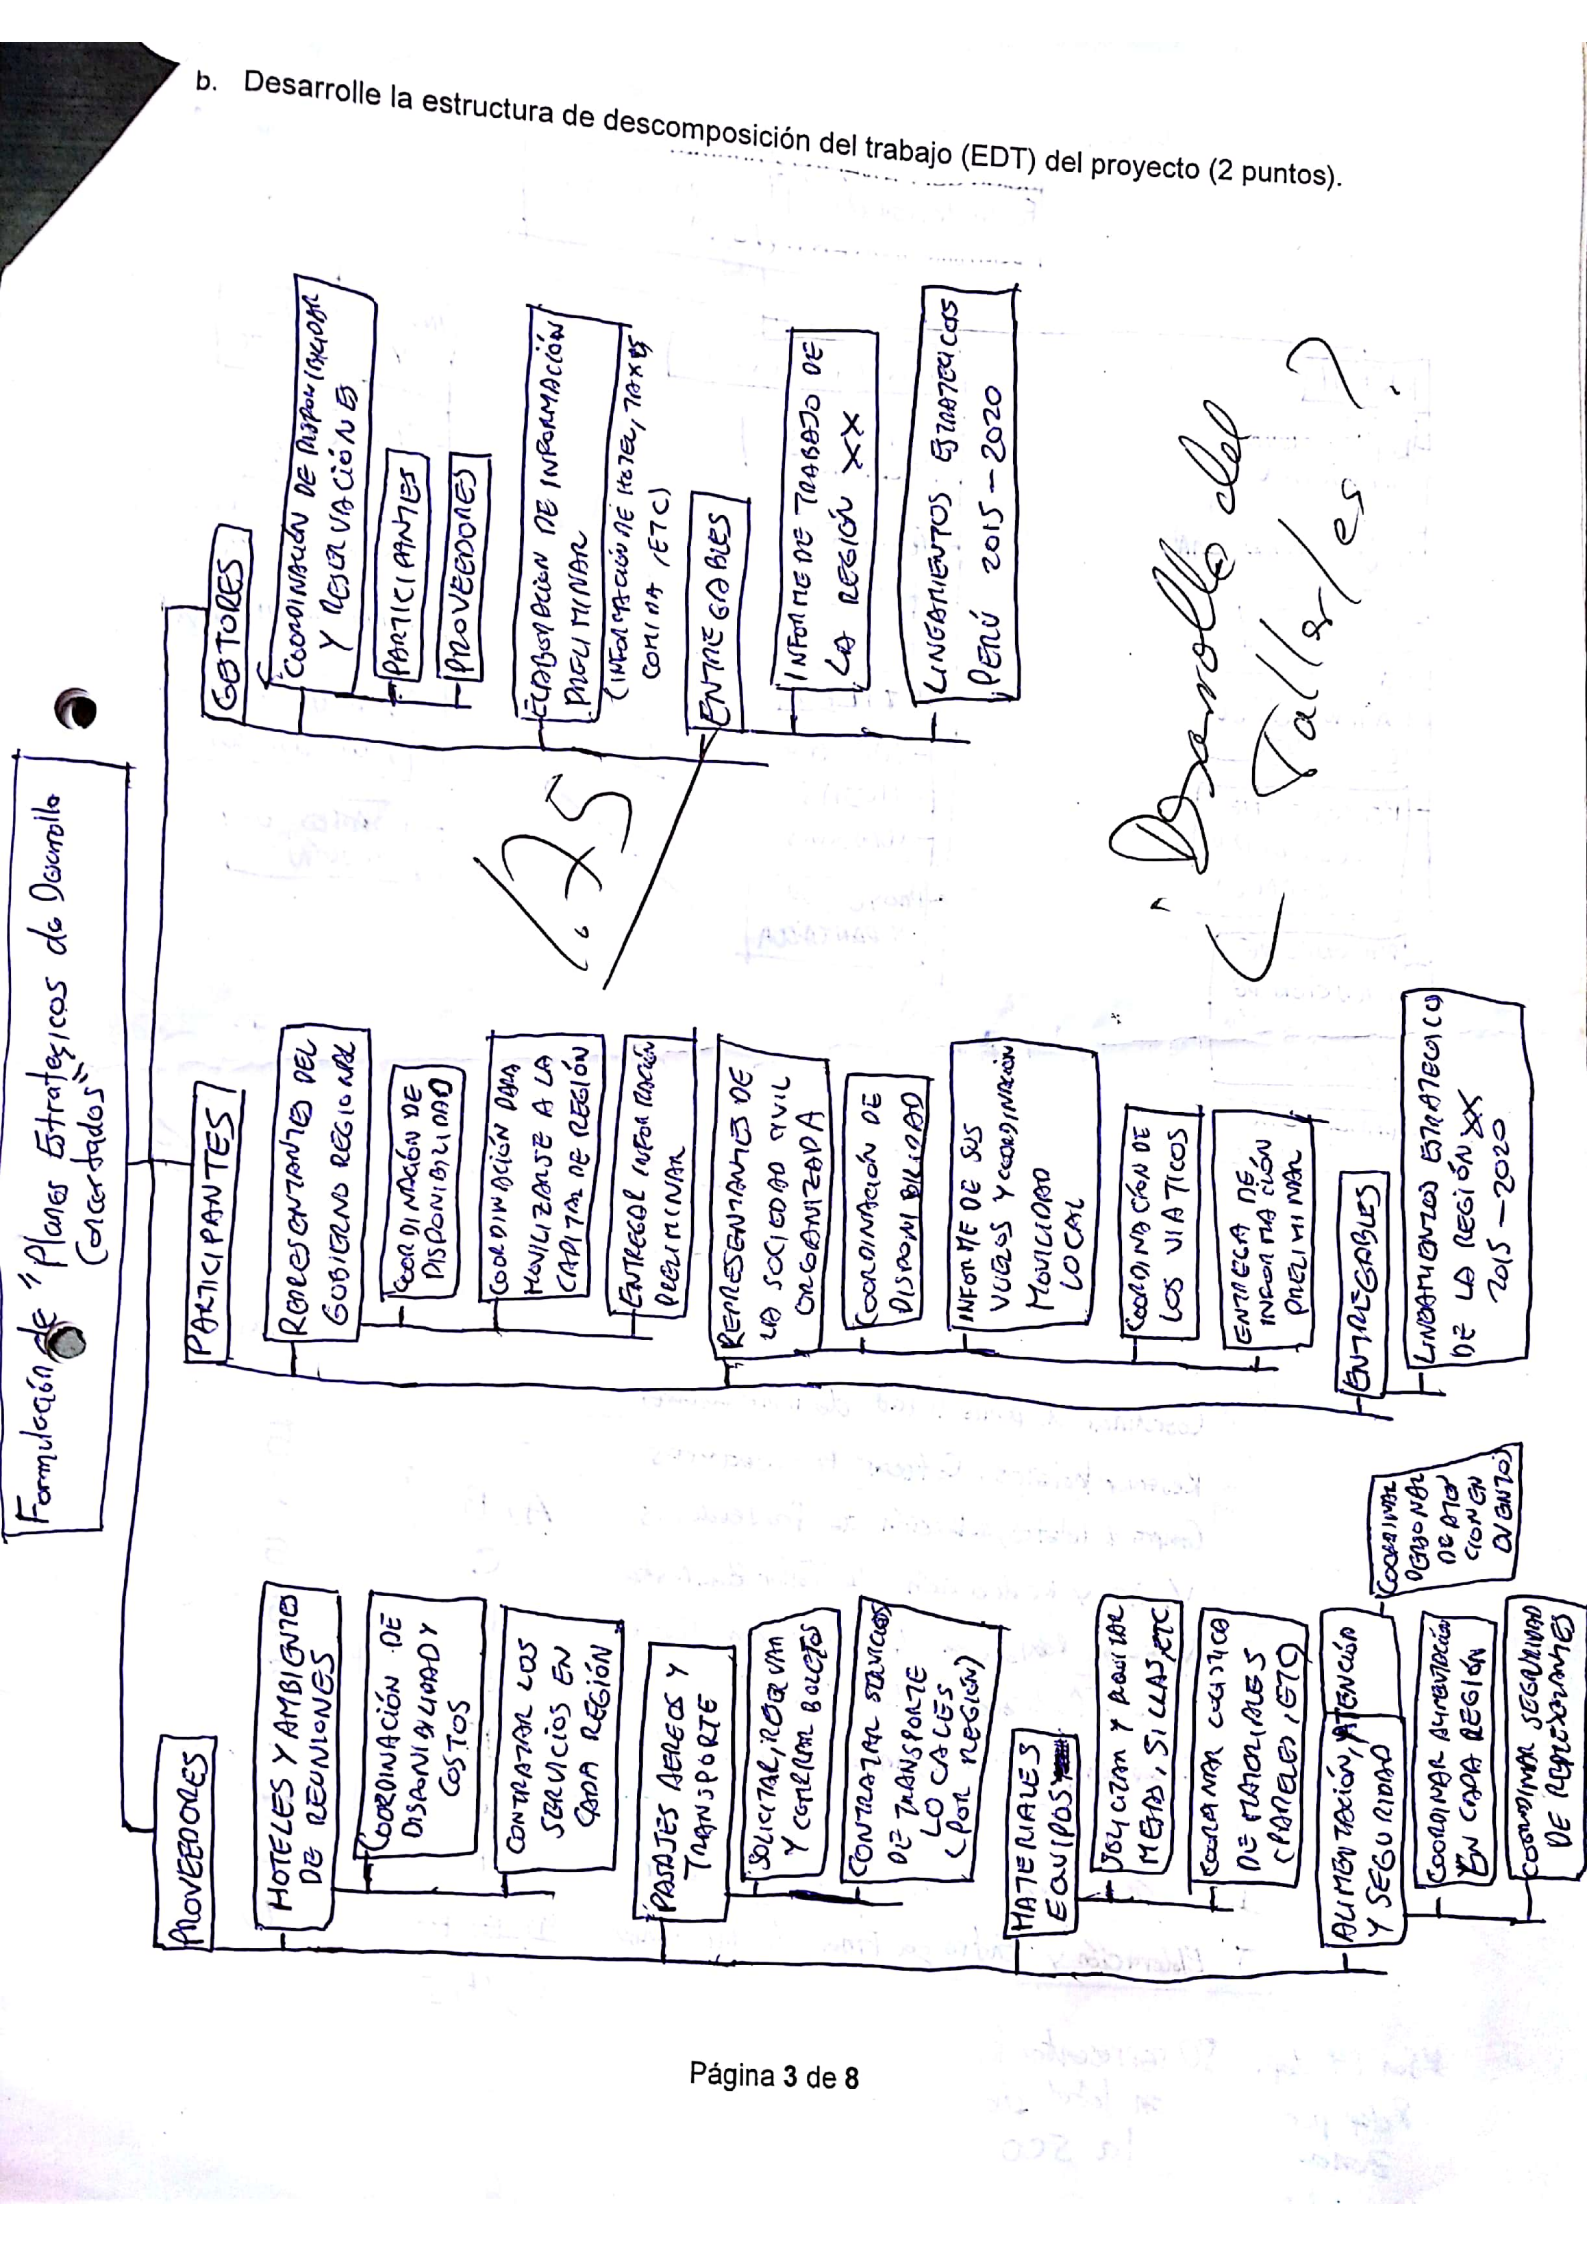

c. Prepare la estructura de desglose de recursos (RBS) necesarios para este proyecto (3 puntos).

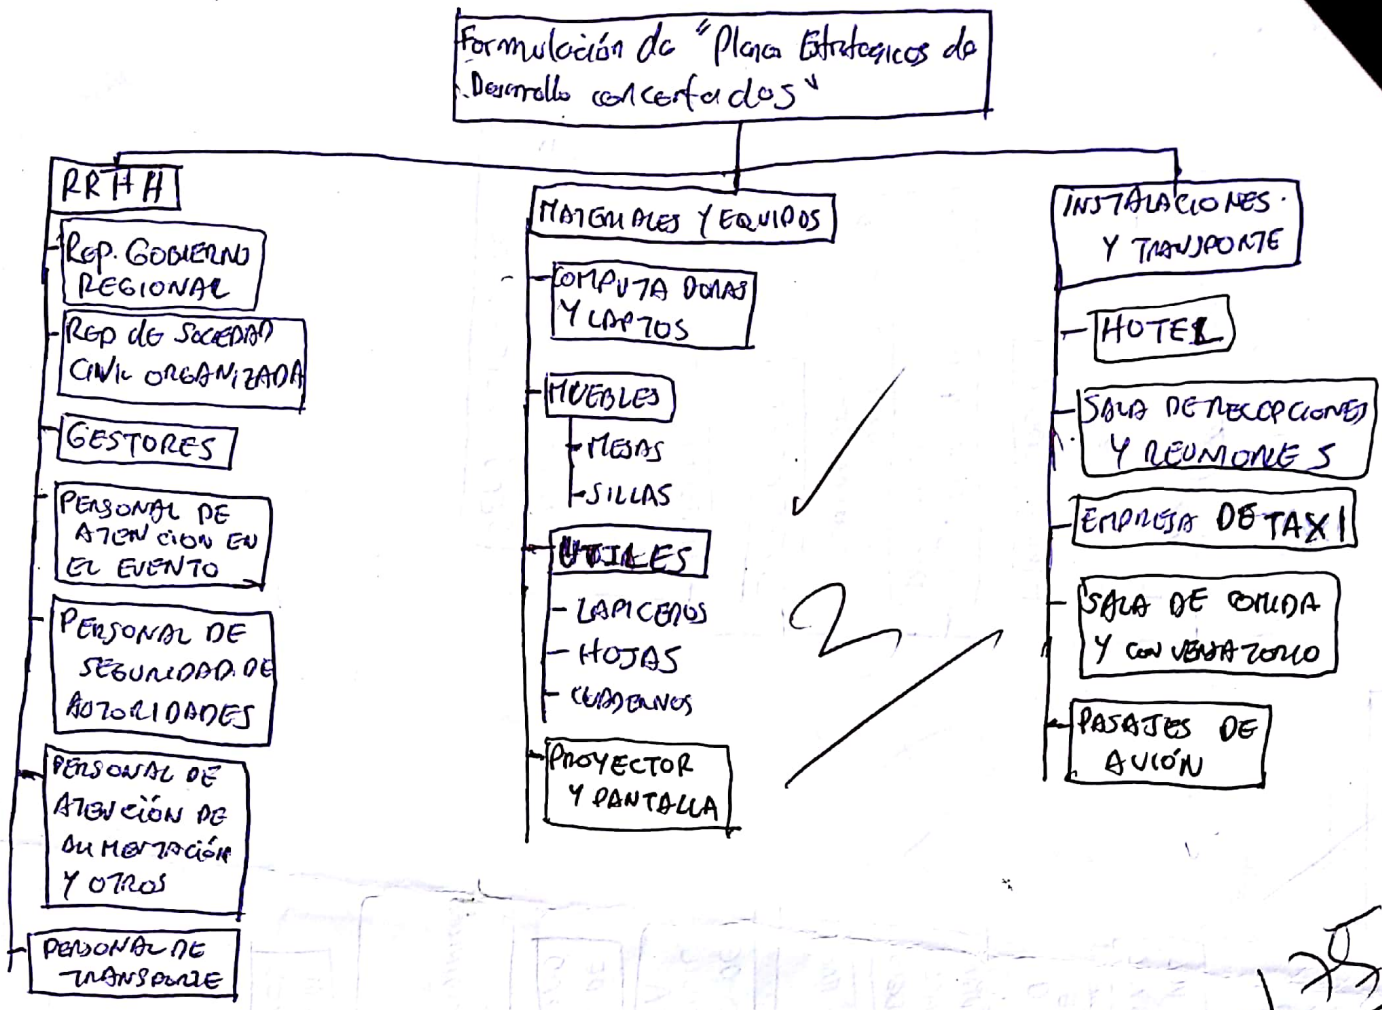

1.75

d. Secuencie las actividades, establezca las precedencias y defina la duración de las actividades. En el siguiente recuadro utilice las líneas que necesite. (2 puntos).


	ACTIVIDAD	PRECEDENCIA	DURACIÓN (días)
A	Coordinar disponibilidad de representantes	-	3
B	Reservar boletos, Cotrear Proveedores	-	5
C	Compra de boletos, selección de Proveedores	A, B	2
D	Viaje y Realización de Taller Zona Norte	C	5
E	Viaje y Realización del Taller Zona Centro	D	6
F	Viaje y Realización del Taller Zona Sur	E	5
G	Recepción y lectura de informes Zona Norte	D	2
H	" " " " Zona Centro	E	2
I	" " " " Zona Sur	F	2
J	Elaboración y Entrega Final de Informes	~~D, E, F~~ G, H, I	10

Explosee

\$ Son 24 dep. 8 dep por Zona 10 por dep. 80 representantes en total de la SCO

e. Mediante el método de la ruta crítica, defina la ruta crítica y la duración del proyecto (2 puntos).

1.75

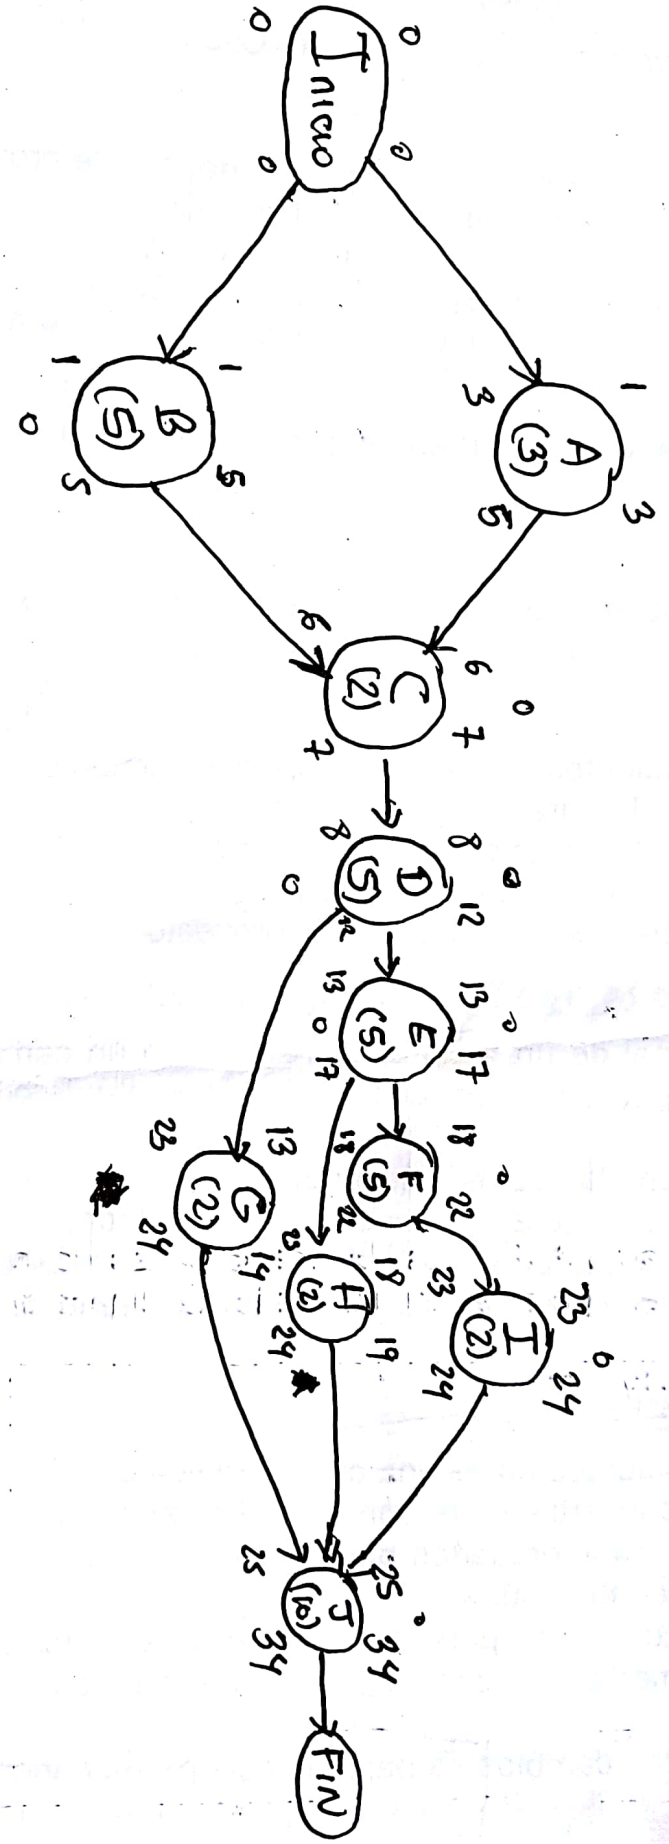

Ruta crítica

Inicio - B - C - D - E - F - I - J - FIN

Duración = 34 días

X

5.25

2. Definiciones **(6 Puntos)**

Marque la alternativa o respuesta correcta. Cada una de las siguientes preguntas tiene una puntuación de 0.75.

1. ¿Cuáles son los grupos de procesos en la gestión de proyectos?
   A. Concepto, Iniciación, Ejecución, Control, Cierre
   B. Iniciación, Planificación, Ejecución, Control, Cierre
   C. Iniciación, Verificación, Ejecución, Control, Cierre
   D. Iniciación, Planeamiento, Ejecución, Control, Cierre Administrativo

2. El trabajo operativo de un área de soporte difiere del trabajo en un proyecto en que el trabajo operativo es:
   E. Único
   F. Temporal
   G. Repetitivo y continuo
   H. Parte de las actividades de un proyecto

3. ¿Cuál de las siguientes no es un área de conocimiento de la Gerencia de Proyectos?
   A. Gestión de la Integración del proyecto
   B. Gestión de las Adquisiciones del proyecto
   C. Gestión de la Auditoría del proyecto
   D. Gestión de las Comunicaciones del proyecto

4. El cliente principal de un proyecto ha solicitado un cambio en su aplicativo durante las pruebas de aceptación del usuario. ¿Cómo gerente de proyecto como debe manejar esta situación?
   A. Desarrollar un plan de mitigación del riesgo
   B. Gestionar el cambio a través de una solicitud formal de cambio
   C. Informar al patrocinador sobre los cambios del alcance, costo y tiempos
   D. Negarse a realizar el cambio puesto que ya se encuentra en la etapa de pruebas de aceptación

5. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del ciclo de vida del proyecto?
   A. El riesgo y la incertidumbre son más altos al inicio del proyecto
   B. El poder de los interesados para influenciar en el proyecto se incrementa a medida que avanza el proyecto
   C. El nivel de costo y de personal es bajo al comienzo, alcanza su máximo nivel en las fases intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su conclusión
   D. El costo de los cambios es bajo al inicio pero se incrementa a medida que avanza el proyecto

6. La administración del portafolio de proyectos se refiere a:
   A. La selección y soporte de los proyectos o programas prioritarios de la organización
   B. Un grupo de proyectos administrados de una forma coordinada
   C. Creación de un único producto o servicio
   D. Elaboración progresiva de proyectos para asegurar que los requerimientos del cliente seas satisfechos.

7. Dada las siguientes estimaciones para una actividad: Optimista: 4 días, Pesimista: 8 días, y más probable: 5 días, ¿Cuál es la duración de la actividad según las Estimaciones por Tres Valores?

A. 6
B. 5
C. 5.66
D. 5.33

$\frac{4+4(5)+8}{6} = \frac{32}{6}$

8. Si decidiera utilizar la técnica de la "Compresión" del Cronograma, usted debería enfocarse en:

A. Acelerar tantas tareas como sean posibles
B. Acelerar sólo las tareas no criticas
C. Acelerar las tareas en la ruta critica
D. Acelerar las actividades que impliquen un menor costo para el proyecto

3. Desarrolle (4 puntos)

- Defina qué es valor planeado, valor ganado y costo real.

VALOR PLANEADO (PV) es el valor estimado que alcanza el desarrollo de un producto o proyecto en un tiempo determinado. Este valor es el que se tiene planificado para alcanzar. Es un pronostico de valor.

VALOR GANADO (EV) es el valor que se ha ganado realmente en el momento del análisis. Su analisis usualmente se basa en el uso de recursos para producir el producto o desarrollar el proyecto. Hasta donde se ha llegado.

COSTO REAL (AC) es el costo que se ha invertido hasta el momento del análisis. Esta relacionado a los recursos que se ha invertido y cuanto ha sido el costo generado para llegar hasta esa etapa del proyecto o producto.

- Señale qué son y cómo se calcula las variaciones del cronograma y del presupuesto. Asimismo, indique lo mismo para los índices de rendimiento del cronograma y presupuesto.

- La variación del Cronograma (SV) es un indicador que mide que tan adelantados o atrasados nos encontramos en el proyecto, ya que se mide a partir del valor planeado de un proyecto o producto y

el valor ganado. La formula es SV = EV - PV, donde si el indicador es positivo nos refleja que vamos adelantados en el tiempo y que el proyecto tiene mas valor del planeado hasta el punto de analisis y si es negativo vamos retrasados y el valor ganado es menor al planificado en el tiempo.

- El Indice de Rendimiento del cronograma es un indicador que nos mide que porcentaje de trabajo se ha realizado a la fecha según lo planificado. Su formula es SPI = EV/PV, donde si SPI > 1, nos indica que se avanzó mas de lo planificado y el proyecto tiene mas valor. Si SPI < 1, nos refleja que se ha avanzado menos de lo planificado y el valor ganado no es el optimo por lo que hay que analizar que pasó y hacer mayor esfuerzo por avanzar.
- Todo esto se ve analizado también con el AC.

1.5

falta 1.

Profesor del curso: Ricardo Vega

San Miguel, 03 de febrero de 2016.
