FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

31 OCT 2017

Código del alumno

2	0	1	3	1	8	0	3

Nombre y Apellidos del alumno

Giampiero Modenesi Mesarina

1er EXAMEN DE

ind 328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula 705

Horario 1032

Fecha 13/10/17

Nota

18

Nombre y Apellidos del profesor

DUNIN

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

Scanned by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Segundo semestre 2017)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- No está permitido el uso de apuntes, material o equipos electrónicos.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: 20 puntos

Revise detenidamente este caso y responda las preguntas planteadas.

El Centro de Innovación y Desarrollo CIDE de la PUCP está interesada en realizar un "*Concurso de Proyectos de Tecnología, Innovación y Emprendimiento*" para el mes de abril de 2018 con la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería (FCI).

Este concurso es sumamente importante tanto para la FCI como para los estudiantes ya que permitirá a los ganadores una pasantía en algunas universidades europeas que potencialmente podrían apoyarlos a continuar su carrera y/o contratarles en el futuro en algunas empresas relacionadas a las universidades.

En este contexto, usted acaba de ser contratado para la ejecución de este Proyecto en el que pueden participan aproximadamente 300 estudiantes de las diferentes Escuelas Académicas de la FCI.

Usted será el líder del proyecto y deberá considerar las siguientes premisas:

- La duración total del proyecto será de 6 meses (180 días calendarios), iniciando el 16 de octubre y terminando el 14 de abril del 2018.
- Se podrá utilizar las instalaciones de la FCI PUCP.
- Las categorías de investigación definidas son 5: Tecnología, Responsabilidad Social, Innovación, Emprendimiento e Impacto Ambiental.
- Cada equipo concursante puede estar conformado por 5 estudiantes como máximo.
- La semana central del concurso es del 10 al 14 de abril del 2017 donde se evaluarán los proyectos presentados y se definirán 2 ganadores en cada categoría de investigación (total 10 ganadores)
- La inversión del proyecto es aproximadamente 180 mil soles y el presupuesto será aprobado por el Consejo de Facultad de la FCI
- Participarán en el evento todas las Escuelas Académicas de la FCI.
- Las competencias serán por categorías según las 5 líneas de investigación señaladas.
- Habrá una ceremonia de apertura donde se presentarán todos los equipos partici-

Scanned by CamScanner

- Pueden contratarse: profesores jurados de ponencias por cada línea de investigación, personal de seguridad, puesto de primeros auxilios y personal de apoyo los cuales deberán ser pagados según las escalas definidas por el equipo del proyecto.
- La calificación de cada jurado de ponencias se irá colocando en un sistema a través de un formato único y automáticamente se consolidarán los resultados por categoría.
- Al final de la competencia habrá una ceremonia de premiación de los equipos ganadores.
- Usted puede asumir otras premisas que crea conveniente.

SE PIDE:

1. Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto. **(2 puntos)**
2. Definir el enunciado del Alcance del proyecto, considerando todos los elementos revisados en clase como objetivo del proyecto, descripción, criterios de aceptación, supuestos respecto del proyecto, etc. **(2 puntos)**
3. Elaborar una Estructura de División del Trabajo. **(3 puntos)**
4. Elaborar una Matriz de Responsabilidades. Señale o describa los roles de las personas o posiciones que considera participaran del proyecto. **(2 puntos)**
5. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto. Señale la secuencia de las actividades (precedencias) y estime la duración de cada actividad, los tiempos de inicio y terminación más tempranos, los tiempos de inicio y terminación más tardíos, así como las respectivas holguras. **(3 puntos)**
6. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades. Señale la ruta crítica. **(2 puntos)**
7. Usted ve como alternativa del proyecto contratar a una empresa que se encargue de ejecutar el proyecto bajo su dirección. Prepare la estructura de la Solicitud de Propuesta que utilizaría para convocar a las empresas proveedoras. **(3 puntos)**
8. Según la situación anterior, cómo cambiaría la Matriz de Responsabilidades. **(1 punto)**
9. El Cliente (CIDE) desea que se concluya el proyecto en 6 meses. ¿Se puede aceptar la solicitud del CIDE? Si la respuesta es positiva ¿Por qué? y si la respuesta es negativa, plantear que se necesitaría hacer para cumplir el plazo solicitado por el cliente. **(2 puntos)**

Profesores del curso:
Isabel Dunin-Borkowski
Fernando Noriega
Ricardo Vega.

San Miguel, 13 de octubre de 2017

Scanned by CamScanner

1

1 - Objetivo del proyecto = Organizar un concurso de proyectos de tecnología, innovación y emprendimiento para dark opportunidades a los estudiantes que se ganen una pasantía.

2 - Descripción del Proyecto = Encargarse del planeamiento del concurso, coordinar con todas las entidades necesarias para su realización, estas van desde conseguir los implementos de seguridad, hasta conseguir a los jurados indicados, según su especialidad.

3 - Requerimientos del cliente = El concurso debe constar de 5 categorías = tecnología, responsabilidad social, innovación, emprendimiento e impacto social.
Se deben conseguir jurados especializados en la materia que se vaya a evaluar
El concurso deberá tener una ceremonia de apertura para presentar a todos los equipos participantes.
El concurso deberá contar con una ceremonia de premiación

4 - Entregables = Se deberá hacer entrega de los trofeos y medallas a los ganadores en la ceremonia de premiación.
Hacer entrega a todos los asistentes merchandising del concurso.
Hacer entrega de poder representativo para cada equipo.

5 - Entregas a cargo del cliente = El cliente tendrá que entregar la relación de alumnos que deberán participar.

6 - Aprobaciones del cliente necesarias = Para el caso de los jueces, al cliente se le deberá presentar una terna, de la cual deberá elegir los de su preferencia.
El cliente tendrá que aprobar el diseño de los premios (trofeos y medallas).
Se debe aprobar la empresa de seguridad elegida

7 - Tipo de Contrato = Será de monto fijo. Al ser un trabajo que toma 6 meses en realizarse el pago se va a realizar en cuota el 30% al inicio del proyecto, a los 3 meses 50% adicional y para la entrega final, el 20% restante.

8 - Formato de Entrega = Se debe hacer llegar en formato PDF y Físico.

0,5

Confirmado acta con SOP

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva
cálculos y desa
(borrador)

9) Fecha entrega = La fecha de entrega de la cotización debe ser como máximo el 16 de setiembre, para que el cliente tenga tiempo de elegir. En cuanto a la realización del trabajo, todo debe estar coordinado y armado 10 días antes del inicio del concurso, es decir el 1 de abril del 2017.


10) Requerimientos del proyecto = Se debe coordinar la ubicación para la realización del concurso, contar con todos los proveedores de servicio (juegos, seguridad, enfermería, etc.) Establecer un sistema automatizado para la colección de resultados. Hacer seguimiento del correcto desarrollo del concurso, desde la ceremonia de apertura hasta la ceremonia de premiación.

11) Criterios de evaluación del proyecto:
- Calidad de los juegos ofrecidos
- Costo total
- Seguridad ofrecida
- Prestigio de la empresa
- Valor agregado que puedan ofrecer incluyendo algún servicio adicional.

12) Fondos = Debido a que es un centro reconocido de la PUCP, se estima que como fondos debe tener [redacted] S/. 180,000.

(2) El alcance de este proyecto va desde la planeación de todos los procesos necesarios y la asignación de los líderes de cada uno de estos hasta finalmente la realización del "Concurso de Proyectos de tecnología, innovación y emprendimiento". Lo que se busca con esto es brindarle mayor oportunidades a los alumnos, dándole la opción de que en caso gane el concurso pueda recibir una pasantía en otra universidad y así desarrollarse en su carrera.

(3)

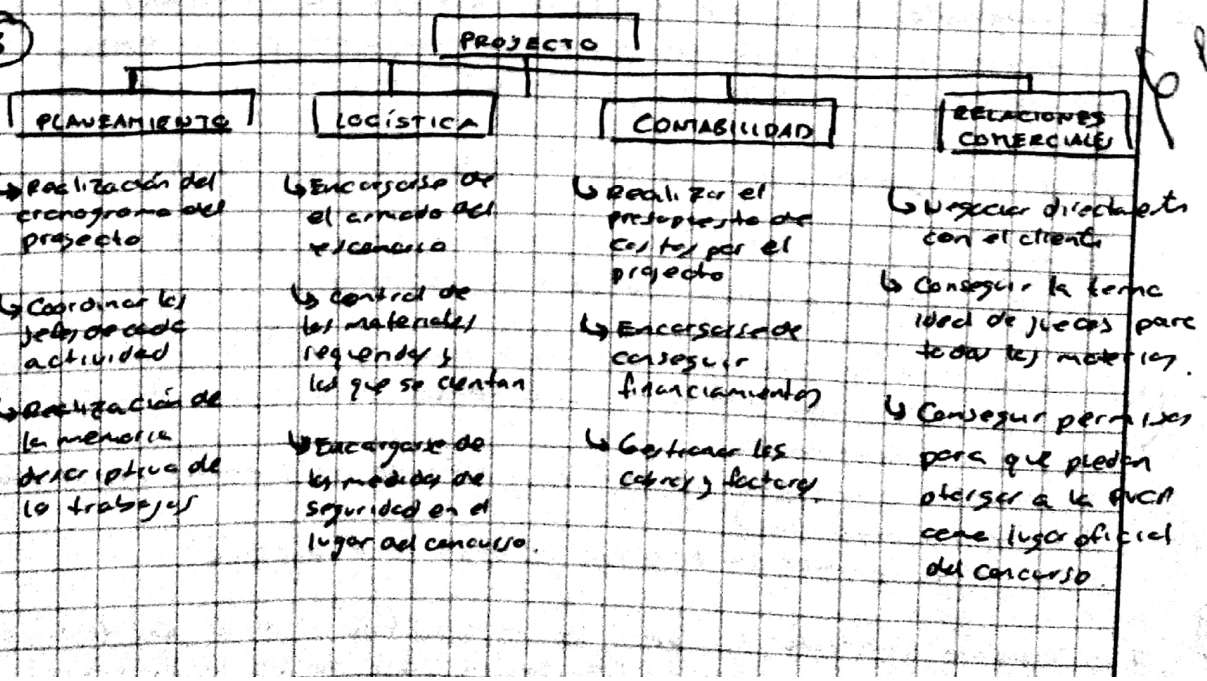


parece un organigrama

2.

2

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

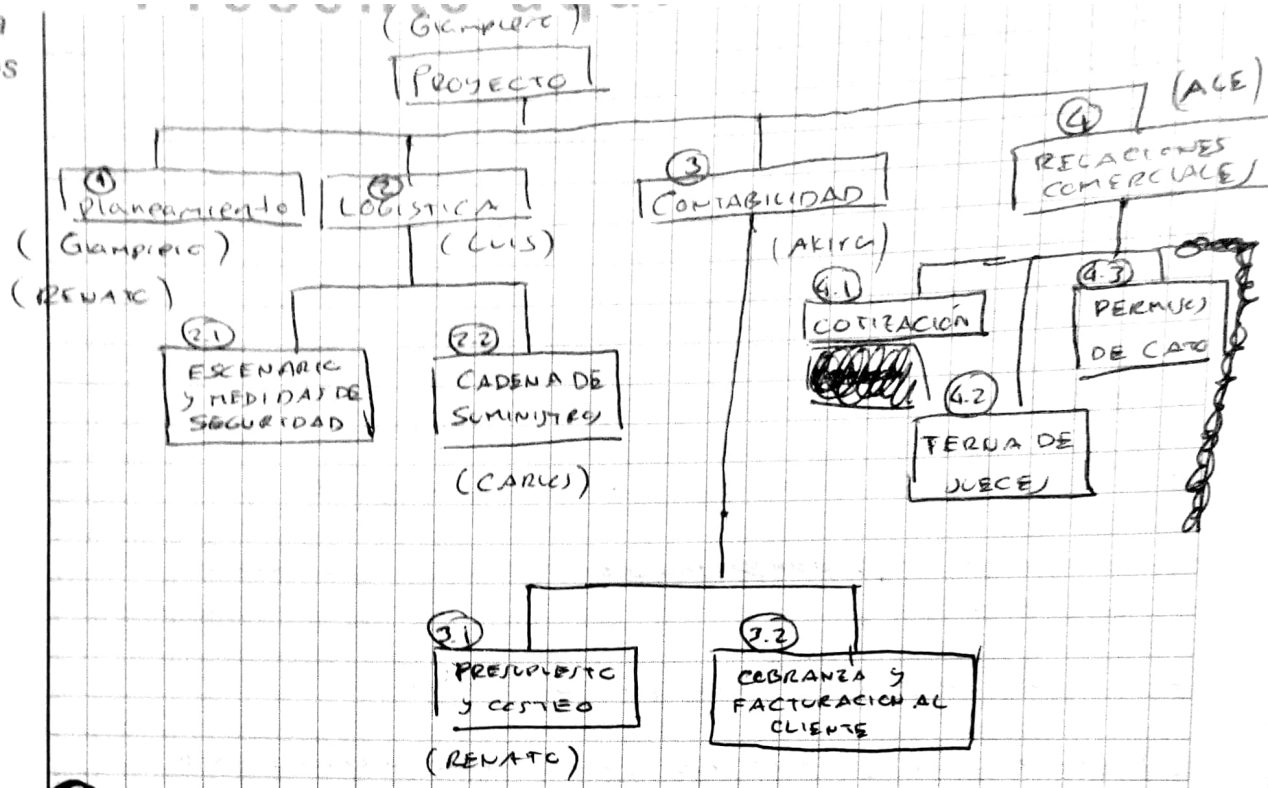

4

PROYECTO	Giampiero	Renato	ALE	Luis	Carlos	Akira
1 Planeamiento	R/A	C	I	I	I	I
2. Logística	-	I	C	R/A	R	I
2.1 Escenario y medidas de seguridad	-	-	-	R/A	R	-
2.2 Cadena de suministro	-	I	C	R	R/A	I
3. Contabilidad	C	R	C	I	I	R/A
3.1 Presupuesto y costeo	C	R/A	-	-	-	R
3.2 Cobranza y facturación al cliente	-	R	-	-	-	R/A
4. Relaciones Comerciales	R	C	R/A	I	I	C
4.1 Cotización	R	C	R/A	I	I	C
4.2 Terna de jueces	C	-	R/A	-	-	-
4.3 Permiso de cato	C	-	A	-	-	R

2

¿Por qué se necesitan 6 personas?

- Giampiero es el encargado de todo planeamiento, recibe apoyo respecto al presupuesto por parte de Renato que ve esto rono. Como es el encargado de planeamiento, toda actividad de presupuesto o de alguna relación con proveedores importantes debe pasar por él.
- Renato, es el responsable y encargado de realizar el presupuesto y costeo de las actividades, por ello apoya a las actividades de cotización y planeamiento.
- Luis, es el responsable del área logística, solo se encarga de que todo lo relacionado a esta área esté en orden y a tiempo con todo.
- Carlos es el encargado de la cadena de suministro, también trabaja dentro del área de logística, además de esto apoya a Luis en todas las labores logísticas que este necesite.
- Akira es el encargado del área de contabilidad, el directamente ve los temas de las facturas y cobranzas, recibe el apoyo de Renato en el área.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

- Ale es la encargada y responsable del área de relaciones comerciales. En los temas de cotización recibe el apoyo de Giampiero y consulta al área de presupuestos (Alicia y Renato). Las demás actividades las hace solo haciendo las consultas al área de presupuestos y a Giampiero.

(5) Lista de actividades:

1) Estimación de costos de la realización del proyecto.

2) Realización de la cotización y negociación con el cliente

3) Planificar las funciones que tendrá cada integrante

4) Elaboración de los ~~proveedores~~ lista con los proveedores prospecto

5) Búsqueda de posibles jueces para el concurso

6) Conseguir el permiso para que el evento se realice en la pista.

7) Ponerse en contacto con los proveedores solicitando su servicios y tarifas

8) Ponerse en contacto con los posibles jueces, viendo su disponibilidad.

9) Elaboración del acta con la terna de jueces y demás proveedores para que el client pueda elegir el de su preferencia

10) Coordinación con los jueces ~~elegidos~~ y proveedores elegidos, firma de contratos

11) Recepción de materiales necesarios para la construcción de el escenario en el cual se desarrollará el concurso

12) Construcción del escenario


13) ~~Seguimiento~~ Entrega y capacitación a los funcionarios respecto a la tecnología usada en el escenario

ACT	t	Prec	PI	PF	UI	UF	h_i	
1	25	-	0	25	9	34	9	holgura total = 9
2	15	1	25	40	34	49	9	
3	8	2	40	48	49	57	9	
4	28	3	48	76	57	85	9	
5	20	3	48	68	80	100	32	
6	10	3	48	58	130	140	82	
7	25	4	76	101	85	110	9	
8	10	5	68	78	100	110	32	
9	5	7,8	101	106	110	115	9	
10	25	9	106	131	115	140	9	
11	10	10,6	131	141	140	150	9	
12	20	11	141	161	150	170	9	
13	10	12	161	171	170	180	9	

Scanned by CamScanner

iva para
sarrollos
lor)

6

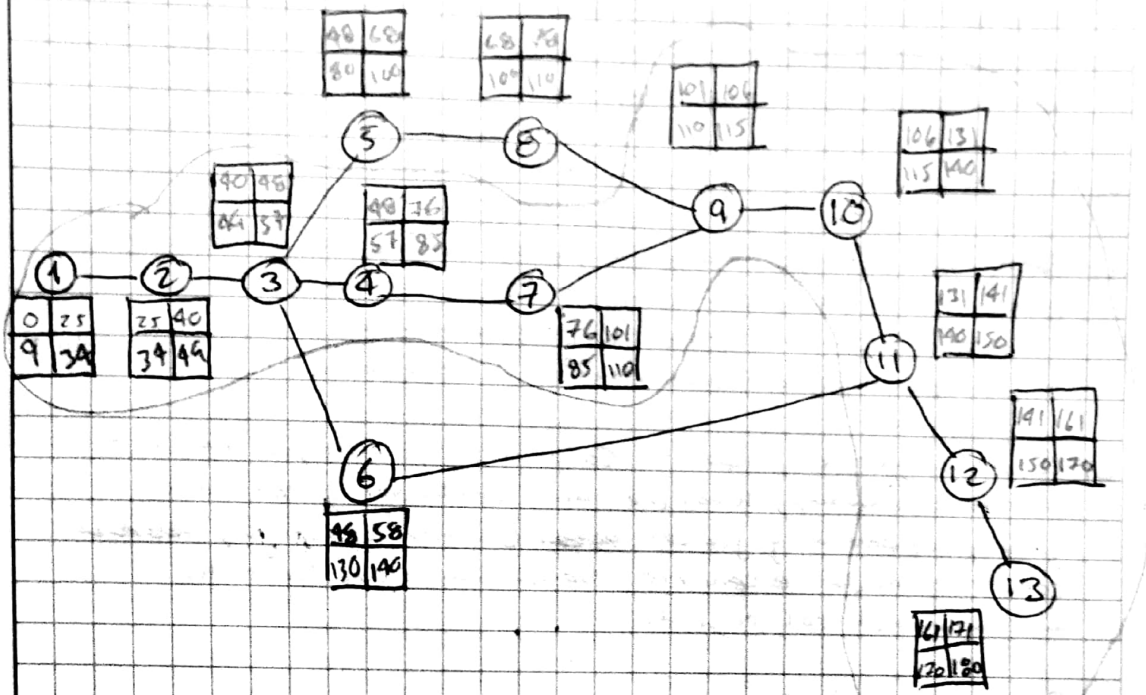

RC: 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

OK

Ruta Crítica

4 Como simplemente sería una empresa proveedora y estaría bajo mi control, es decir que el planeamiento seguiría estando bajo mi control, el enfoque de la necesidad cambiaría de la siguiente manera:

1) Objetivo del proyecto: Conseguir todos los proveedores necesarios y adecuación de las instalaciones para que se pueda realizar el concurso.

2) Descripción del proyecto: Conseguir a los proveedores, materiales, jueces necesarios para la realización del concurso. Verificar que todo el ambiente sea seguro y ~~tecnológico~~ darle seguimiento al correcto funcionamiento de todo lo relacionado con el concurso.

3) Requerimiento del cliente:
- Concurso que consta de 5 categorías
- Jurado especializado por categoría
- Ceremonia de apertura
- Ceremonia de premiación

4) Entregables:
- Trofeos y medallas
- Merchandising para todos los asistentes
- Pelotas para los equipos.

5) Entregas a cargo del cliente: Se le deberá entregar la aprobación hecha. También la relación de alumnos brindada por el cliente.

6) Aprobaciones necesarias del cliente: elección de los jueces, aprobación del diseño de los premios, la empresa de seguridad contactada

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

7) Tipo de contrato = De monto fijo (Debe tener un valor menor al que se le cotizó al cliente para poder ganar dinero, las cuotas de pago también deben ser menores y más flexibles para siempre trabajar con el dinero del cliente.

8) Formato de entrega = PDF y en física

9) Fecha de entrega = Tendría que ser los meses que en el primer caso para poder cumplir con los objetivos:
- Cotización como máximo el 16 de septiembre
- Entrega de proyecto como máximo el 1 de abril

10) Requerimientos del proceso = Cotizar el permiso para realizarla en cada a la fechas y horas indicadas, contactar y contratar a los proveedores y jueces. Gestión logística y construcción del escenario. Seguimiento del correcto funcionamiento del proyecto.

11) Criterios de Evaluación:
- Calidad de los jueces ofrecidos
- Costo total
- Seguridad ofrecida
- Valor agregado que pueden ofrecer

12) Fondos = Se tienen los mismos fondos que daría el cliente, es decir $ 100.000 ; sin embargo como máximo se usaría el 60% del monto

(8) Lo que varía ahora es que la empresa proveedora es la encargada de todos los trabajos operativos ; sin embargo, quien ha firmado con el cliente final somos nosotros así que seguimos siendo los responsables.

Proyecto	Cliente	Empresa proveedora
1. Planeamiento	R/A	R
2. Logística	A	R
2.1 Escenario y medidas de seguridad	A	R
2.2 Cadenas de suministro	A	R
3. Contabilidad	A	R
3.1 Presupuesto y costeo	A	R
3.2 Cobranza y facturación	A	R
4. Relaciones Comerciales	R/A	R
4.1 Cotización	R/A	R
4.2 Terna de jueces	A	R
4.3 Permisos de calle	A	R

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

(a) - Si se puede ya que el requerimiento está listo en 160 días y solo nos toma 171 días, es decir que tenemos 9 días como factor de seguridad (holgura). Se podría inclusive analizar la reducción de personal para este trabajo, ya que Ale tiene bastante holgura en su actividad que demora 10 días, se podría intentar adelantar esta gestión para tardar únicamente 9 días y así poder tener una mayor eficiencia.

Scanned by CamScanner
