FACULTAD
DE **CIENCIAS**
E INGENIERÍA

05 JUN. 2019

Código del alumno

2	0	1	3	4	9	2	9

Nombre y Apellidos del alumno

Manuel Chauca Tamariz.

1er EXAMEN DE

1	Gestión de proyectos.
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Nota

5

Aula A702

Horario 1031-2

Fecha 17/05/19

Nombre y Apellidos del profesor

Norie ga.

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Primer semestre 2019)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- Sin apuntes de clase
- Se permite el uso de calculadora no programable.
- No está permitido el uso de ningún material adicional al indicado.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

Cuestionario:

Parte 1 (3 puntos)
Conteste las siguientes preguntas teóricas:

1. ¿Qué proceso debería seguir una organización a fin de evaluar un proyecto? (1.5 puntos)
2. ¿Por qué es importante determinar la ruta crítica de un proyecto? ¿En la práctica, para qué sirve la holgura? (1.5 puntos)

Parte 2

Leer el siguiente caso y responder las preguntas abajo planteadas en base a este:

ANIVERSARIO DE LA EMPRESA VELOX COURIER
PREGUNTAS PARA EL EXAMEN PARCIAL 2019-1

La empresa Velox Courier, una empresa de mensajería peruana, cumplirá, a fines de este año, 30 años de fundación y desean hacer una conmemoración para celebrar su exitosa trayectoria empresarial en el Perú.

En este contexto, la empresa desea tomar los servicios de una empresa que se encargue de este Proyecto de Aniversario, y para ello elaborara un documento de solicitud de propuesta.

Luego de una rigurosa evaluación, su equipo es contratado para la ejecución de este Proyecto de Aniversario donde usted será el líder y deberá considerar las siguientes premisas:

a. La duración total del proyecto será de 5 meses (150 días calendarios), iniciando el 01 de agosto y terminando el 30 de diciembre.

Scanned by CamScanner

b. La fecha central del Aniversario será el 15 de diciembre.

c. La inversión aproximada del proyecto es de 150 mil nuevos soles y el presupuesto ya está aprobado por el Consejo Directivo de la empresa.

d. La cantidad de participantes será aproximadamente de 1,000 invitados entre trabajadores, proveedores y clientes principales y personalidades del mundo empresarial.

e. La conmemoración deberá considerar, entre otras actividades: premiación de trabajadores, show folklórico, discursos de los ejecutivos, una cena y también una fiesta de gala.

f. El local para el evento será escogido por el equipo del proyecto.

g. Usted puede asumir otras premisas y suposiciones que crea conveniente.

Preguntas:

Preguntas del Caso:

1. ¿Cuál debiera ser la estructura (contenido) de la "Solicitud de Propuesta" (RFP) para este proyecto? **(2 puntos)**
2. Considerando que su empresa ganó la ejecución del proyecto, establecer el objetivo y alcance detallado. Hacer una lista de supuestos respecto al proyecto. **(2 puntos)**
3. Elaborar una Estructura de División del Trabajo **(2 puntos)**
4. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto. Utilice por lo menos 15 actividades (paquetes). **(2 puntos)**
5. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades. **(2 puntos)**
6. Estime la duración de las actividades. **(1 punto)**

Presente ordenadamente la información resultado de resolver las preguntas 4, 5, 6 en un cuadro como el siguiente:

Id	Actividad	Duración	Predecesora(s)
A			
B			
C			
:			
:			

7. Mencione y explique dos herramientas que utilizaría para determinar la duración de las actividades. Indique y sustente la aplicación de cada una de éstas en dos de las actividades presentadas **(1 puntos)**

Scanned by CamScanner

8. Con un tiempo de inicio del proyecto de 0 (1 de agosto) y con un plazo de terminación de 150 días (30 de diciembre), calcule los tiempos de inicio y terminación más tempranos (ES y EF) y los tiempos de inicio y terminación más tardíos (LS y LF). Puede utilizar el diagrama de red que elaboró en la pregunta 5. **(3 puntos).**
9. Determine la ruta crítica e identifique las actividades que la conforman. Si en la primera iteración de su planeación, la duración de su proyecto hubiera sido 160 días, ¿qué acciones hubiera realizado para alcanzar la duración meta? **(2 puntos)**

Profesor del curso: Fernando Noriega, Ricardo Vega, Luciano Silva, Isabel Dunin-Borkowski

San Miguel, 17 de mayo de 2019

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

Parte 1

1. (0.5p)
- Definir estructura SDP X.
- Definir criterios de comparación
- Evaluar proyectos.

¡Ruta!

2.- Porque la ruta crítica da el tiempo mínimo para realizar el proyecto y las actividades que la conforman. Así se pueden tomar acciones, según los resultados requeridos. (1p)

La Holgura para redistribuir recursos y hacerlo más eficiente en tiempos.

Scanned by CamScanner

ODRE CREA NPPIP

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Parte 2.

①

1 Objetivo : Realizar la commemoración por los 30 años de Velox Courier, durante el 01 agosto y 30 diciembre con un presupuesto de S/ 150,000.

2 Descripción : Se desea realizar los 30 años de fundación de la empresa de mensajería peruana. En la cual participan trabajadores, proveedores clientes principales, entre otros. El evento tendrá como fecha principal el 15 diciembre y se realizarán actividades de show, discursos, concursos fiestas

3 Requerimientos : - Participación de trabajadores en los concursos / eventos
- Equipo de animación / sonido / catering
- Lugar a realizar las actividades
- Premios

4 Entregables : - Confirmación de participación de colaboradores en los eventos
- Confirmación de equipo de animación / sonido / catering
- Confirmación de reserva de local
- Confirmación de premios.

5 Elementos Suministrados por el Cliente : - Canales de atención para dudas.
- Instalaciones para reuniones

6 Aprobaciones : - Aprobaciones de gerentes para el evento
- Aprobaciones de accionistas

7 Metodo de pago : 60% por adelantado para realizar la compra de premios, reservaciones de servicio, etc
40% al finalizar el proyecto

8 Tipo de contrato : El contrato se pactará el monto y acuerdo de las partes y Tiempo. Además de haber penalización por incumplimiento.

9 Presupuesto S/. 150,000

10 Instrucciones WORD - PDF
LETRA TIME NEW ROMANS 11
título y subtitulo 14,12 respectivamente
interlineado simple.

11 Programa Diagrama Gant finalizado

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

CI (2p)


② Objetivo: Realizar las actividades de conmemoración de los 30 años de fundación de VELOX COURIER. del 05 agosto al 30 diciembre con un presupuesto de $/150,000.

Alcance: La empresa VELOX COURIER desea celebrar el aniversario de 30 años de fundación, lo cual tendrá como fecha principal el 15 diciembre 2019. La celebración contará con diferentes actividades. como Show's, concursos, discursos, cenas, etc. Además participarán los diferentes STAKE HOLDERS (Clientes, proveedores, trabajadores, socios).

Supuestos:

+ Al menos el 80% de invitados participará.
+ NO se incrementará o disminuirá el presupuesto.
+ NO Habrá desastres naturales que impidan la realización del eventos.
+ Todas las empresas tercerizadoras cumplirán.
+ NO habrá conflictos internos dentro de la empresa. que cancelen el evento.
+ Habrá locales disponibles para la realización del EVENTO.

③ Estructura de división de trabajo. (1.5p)

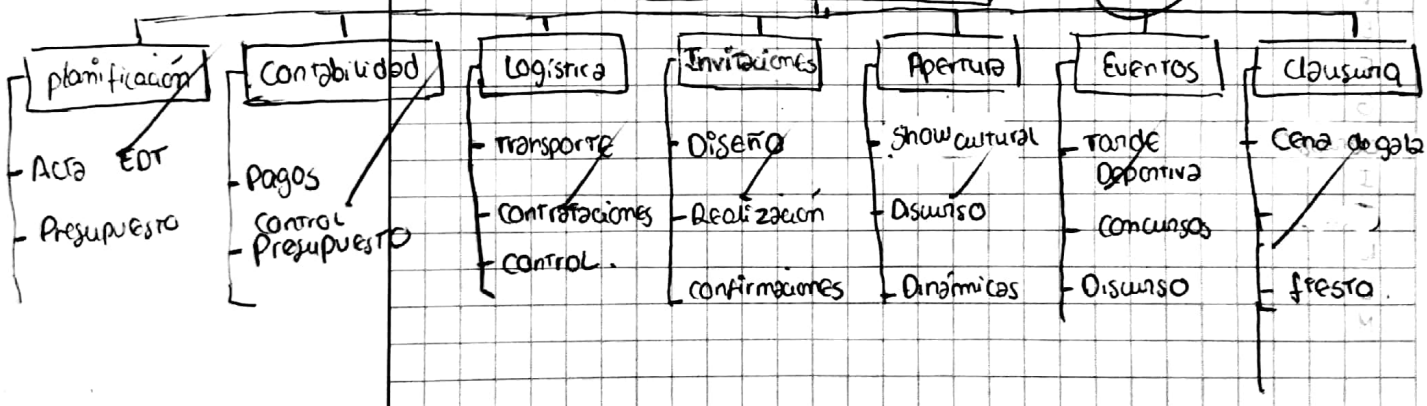

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

150 días

Actividades

1.5p

- Sin estructura

- Elaboración de acta de constitución
- Elaboración del EDT, Matriz de responsabilidades
- Elaboración de diagrama en Red
- Cotización de servicios Tercianzados (Amunación, local, comida)
- Evaluación de cotizaciones
- Contratos de servicios
- Diseñan Invitaciones
- Realizan listas de invitados
- Imprimir invitaciones
- comunican concursos internos* en la empresa.
- Reciben confirmaciones de asistencia.
- contratan jurados para el show cultural
- Ensayan con los trabajadores el show cultural
- Discurso de apertura.
- Tarde deportiva interna
- Presentación de equipos del concurso interno
- Animan
- Realizan pago inicial de servicios Tercianzados.
- Realizan pago final de servicios Tercianzado
- Cena de gala.
- Premian ganadores
- Realizan fiesta.

* concurso interno
- equipos de trabajo presentarán una mejora para la empresa

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo


Id		Duración (días)	Antecesor	ES	EF	LS	LF		
A	Elaboración de acta de constitución	3	-	0	3	42	45	42	✓
B	Elaboración de EDT, matriz responsabilidades.	10	A	3	13	45	55	42	✓
C	Elaboración de diagrama Red.	10	B	13	23	55	65	42	✓
D	Cotización de servicios a terceros or	20	C	23	43	65	85	42	✓
E	Evaluación de cotizaciones	5	D	43	48	108	113	60	
F	Realización de pagos	5	E, F	48	53	165	115	69	
G	Realización de contratos	10		53	63	113	123	60	
H	Realizar lista de invitados	10	C	43	53	85	95	42	✓
I	Diseñar invitaciones	5	H	53	58	95	100	42	✓
J	Impresión de invitaciones	15	I	58	73	100	115	42	✓
K	Envío de invitaciones	5	J	73	78	115	120	42	✓
L	Confirmación de invitados	20	K	78	98	120	140	42	✓
M	Comunicar concurso interenos	2	G, H	63	65	123	125	60	
N	Comunicar bases de concurso.	2	H	65	67	138	140	73	
O	Comunicar concurso show cultural	2	G	63	65	128	130	65	
P	Ensayar. acto cultural	10	O	65	75	130	140	65	
Q	Contratar jurados para concursos.	15	M	67	82	125	140	58	
R	Fondo de apertura	1	L, N, P, Q	98	99	140	141	42	✓
S	Discurso de apertura.	1	R	99	100	141	142	43	✓
T	Animación con dinámicas.	1	S	100	101	142	143	42	✓
U	Presentación de concurso internos	2	T	101	103	143	145	42	✓
V	Discurso principal	1	U	103	104	145	146	43	✓
W	Compartir	1	V	104	105	146	147	42	✓
X	Cena de Gala.	1	W	105	106	147	148	42	✓
Y	Premiar ganadores	1	X	106	107	148	149	42	✓
Z	Fiesta gala.	1	Y	107	108	149	150	42	✓

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

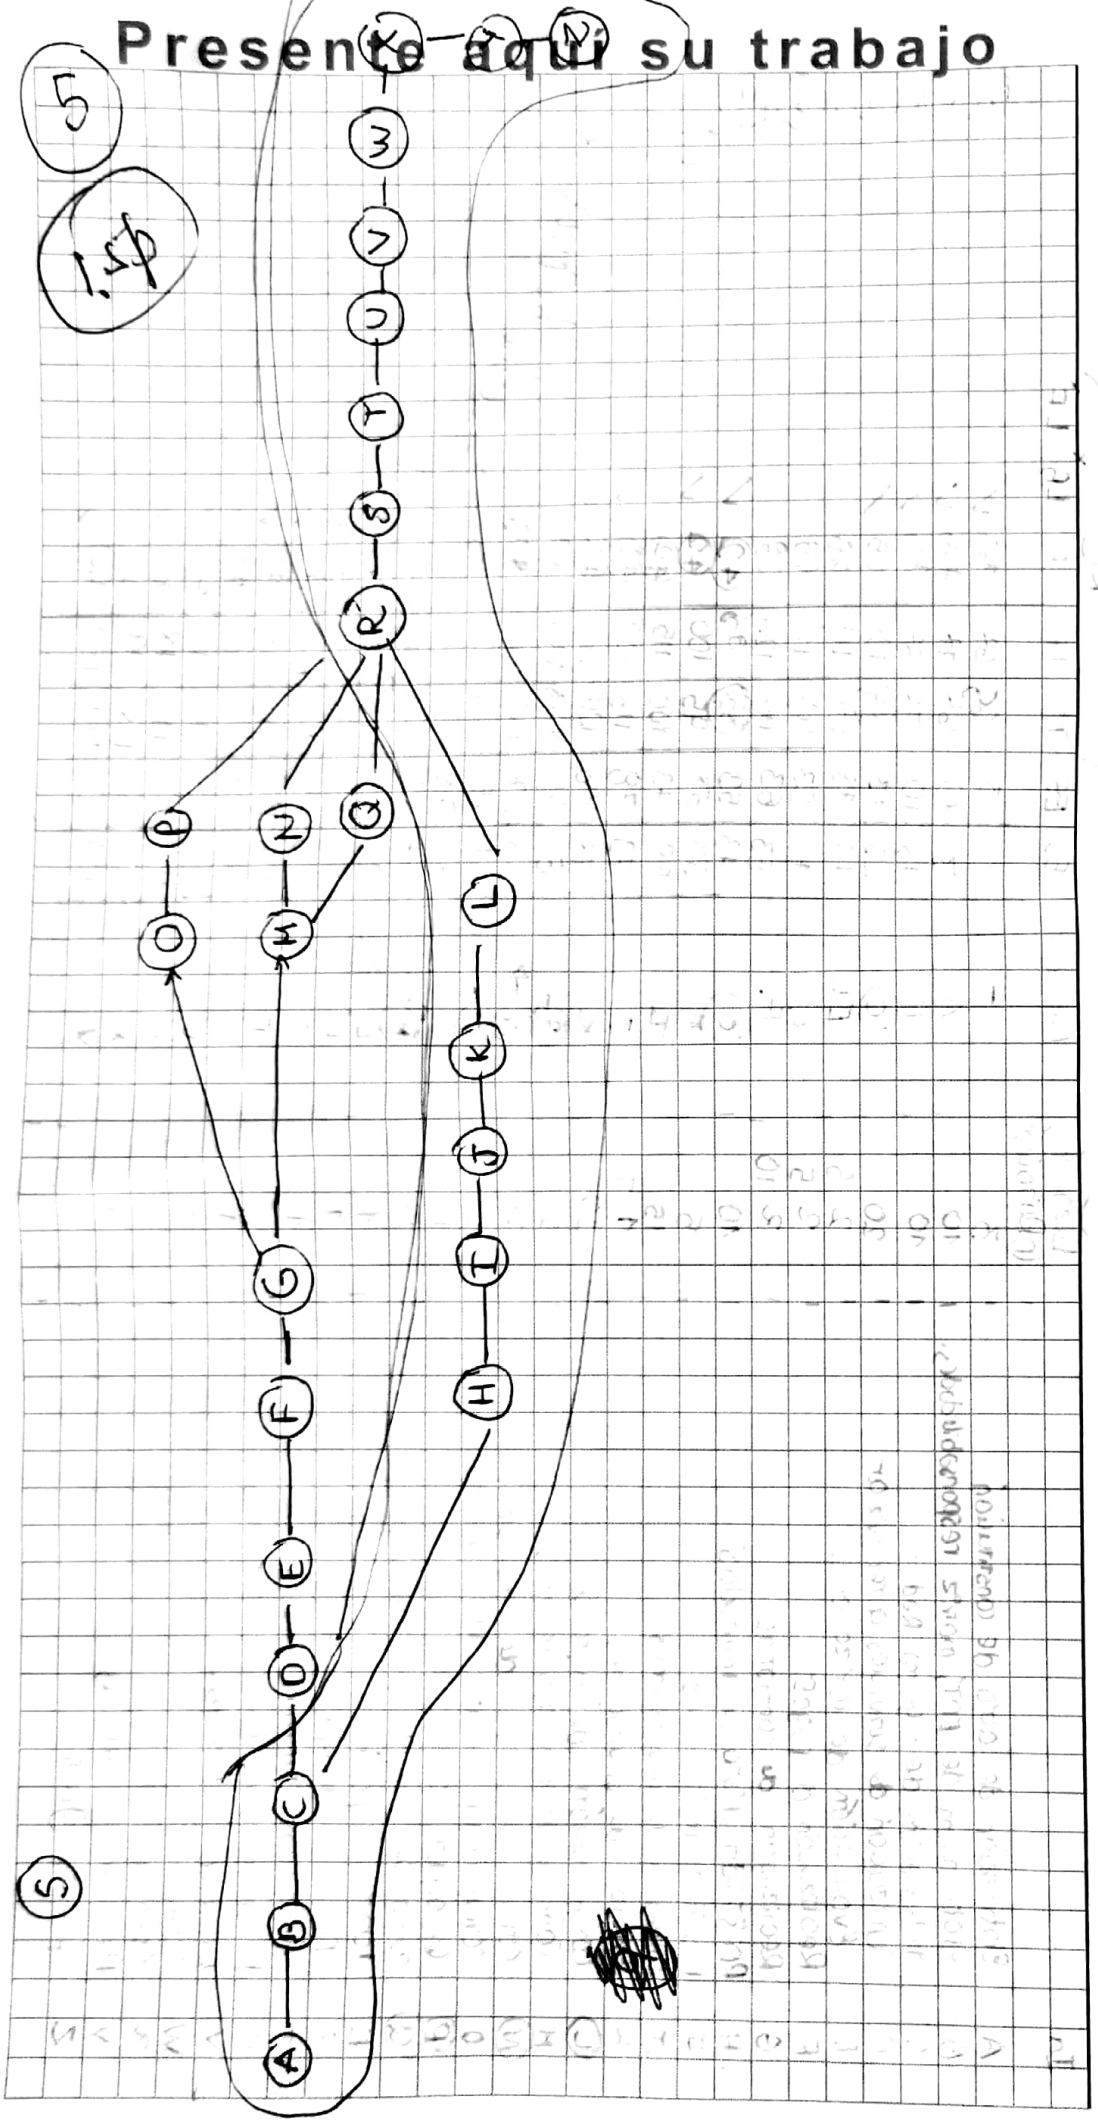

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

(9) La ruta crítica es:



A
B
C
H
I
J
K
L
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Con 160 días, igual tendría holgura.

- Despedir personal innecesario
- Poner puntos de control de calidad.

Scanned by CamScanner
