FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

05 JUN. 2019

Código del alumno

2	0	1	3	0	4	8	2

Nombre y Apellidos del alumno

Angelo Moronte Chinos

1er EXAMEN DE

INO328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Angelo M

Nota

18

Aula	A-701
Horario	1031
Fecha	2011/05/17

Nombre y Apellidos del profesor

Noriega, Fernando

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Primer semestre 2019)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- Sin apuntes de clase
- Se permite el uso de calculadora no programable.
- No está permitido el uso de ningún material adicional al indicado.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

Cuestionario:

Parte 1 (3 puntos)
Conteste las siguientes preguntas teóricas:

1. ¿Qué proceso debería seguir una organización a fin de evaluar un proyecto? (1.5 puntos)
2. ¿Por qué es importante determinar la ruta crítica de un proyecto? ¿En la práctica, para qué sirve la holgura? (1.5 puntos)

Parte 2

Leer el siguiente caso y responder las preguntas abajo planteadas en base a este:

ANIVERSARIO DE LA EMPRESA VELOX COURIER
PREGUNTAS PARA EL EXAMEN PARCIAL 2019-1

La empresa Velox Courier, una empresa de mensajería peruana, cumplirá, a fines de este año, 30 años de fundación y desean hacer una conmemoración para celebrar su exitosa trayectoria empresarial en el Perú.

En este contexto, la empresa desea tomar los servicios de una empresa que se encargue de este Proyecto de Aniversario, y para ello elaborara un documento de solicitud de propuesta.

Luego de una rigurosa evaluación, su equipo es contratado para la ejecución de este Proyecto de Aniversario donde usted será el líder y deberá considerar las siguientes premisas:

a. La duración total del proyecto será de 5 meses (150 días calendarios), iniciando el 01 de agosto y terminando el 30 de diciembre.

Scanned by CamScanner

b. La fecha central del Aniversario será el 15 de diciembre.

c. La inversión aproximada del proyecto es de 150 mil nuevos soles y el presupuesto ya está aprobado por el Consejo Directivo de la empresa.

d. La cantidad de participantes será aproximadamente de 1,000 invitados entre trabajadores, proveedores y clientes principales y personalidades del mundo empresarial.

e. La conmemoración deberá considerar, entre otras actividades: premiación de trabajadores, show folklórico, discursos de los ejecutivos, una cena y también una fiesta de gala.

f. El local para el evento será escogido por el equipo del proyecto.

g. Usted puede asumir otras premisas y suposiciones que crea conveniente.

Preguntas:

Preguntas del Caso:

1. ¿Cuál debiera ser la estructura (contenido) de la "Solicitud de Propuesta" (RFP) para este proyecto? **(2 puntos)**
2. Considerando que su empresa ganó la ejecución del proyecto, establecer el objetivo y alcance detallado. Hacer una lista de supuestos respecto al proyecto. **(2 puntos)**
3. Elaborar una Estructura de División del Trabajo **(2 puntos)**
4. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto. Utilice por lo menos 15 actividades (paquetes). **(2 puntos)**
5. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades. **(2 puntos)**
6. Estime la duración de las actividades. **(1 punto)**

Presente ordenadamente la información resultado de resolver las preguntas 4, 5, 6 en un cuadro como el siguiente:

Id	Actividad	Duración	Predecesora(s)
A			
B			
C			
:			
:			

7. Mencione y explique dos herramientas que utilizaría para determinar la duración de las actividades. Indique y sustente la aplicación de cada una de éstas en dos de las actividades presentadas **(1 puntos)**

Scanned by CamScanner

8. Con un tiempo de inicio del proyecto de 0 (1 de agosto) y con un plazo de terminación de 150 días (30 de diciembre), calcule los tiempos de inicio y terminación más tempranos (ES y EF) y los tiempos de inicio y terminación más tardíos (LS y LF). Puede utilizar el diagrama de red que elaboró en la pregunta 5. **(3 puntos).**
9. Determine la ruta crítica e identifique las actividades que la conforman. Si en la primera iteración de su planeación, la duración de su proyecto hubiera sido 160 días, ¿qué acciones hubiera realizado para alcanzar la duración meta? **(2 puntos)**

Profesor del curso: Fernando Noriega, Ricardo Vega, Luciano Silva, Isabel Dunin-Borkowski

San Miguel, 17 de mayo de 2019

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

Parte 1

- Determinar los objetivos del proyecto
1. - Elaborar un EDT y matriz RACI
- Determinar la duración del proyecto, lo cual implica desglosar las actividades y consultar con un experto
- Elaborar un cronograma con las actividades
- Elaborar un diagrama de red
- Determinar costos y presupuesto en base a las actividades del proyecto.

Pensar

2. Es importante determinar la ruta crítica, debido a que permite saber cuál será la duración total del proyecto, así como también qué margen tienen sobre las actividades que están involucradas en la ruta crítica.

La holgura es importante para determinar si se tiene que agregar recursos o no, horas hombre, etc. existen dos tipos de holgura:

N.S.P

Holgura negativa:

- Se necesitan agregar recursos de las rutas no críticas, en las rutas críticas.
- Aumentar la cantidad de personal.
- Crear horarios extras fuera del turno laboral.

Holgura positiva:

- Benificios a los trabajadores por acabar el proyecto antes de tiempo.
- Realizar mejores acabados y mejores controles del proyecto.
- Usar recursos de tiempo y mano de obra en otro proyecto que se esté desarrollando en paralelo.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Parte 2

1. SOP

1. Objetivo: Desarrollar un evento por el aniversario de Velox Lurín en un plazo de 5 meses, a corto plazo, con un presupuesto de 150 mil nuevos soles.

2. Descripción: Se desea desarrollar un evento por el aniversario de la empresa Velox Lurín, debido a 30 años de fundación, y su éxito empresarial en el Perú.

3. Requerimientos.
- Local con capacidad para 1000 invitados
- Decoración adecuada y ambientada de gala
- Sonido y audiovisual adecuado para la ceremonia
- Personal experimentado en la atención de invitados
- Seguridad que cuiden todas las instalaciones del evento

4. Entregables
- Cronograma de actividades del proyecto
- Documento indicando el porcentaje del avance
- Evidencias de la ambientación del local, por fotos

5. Criterio de Aceptación
- Instalaciones del local limpias
- Decoración acorde a la gala
- Ventilación adecuada en las instalaciones

6. Elementos suministrados por el cliente
- Capacidad de participantes del evento
- Lista de invitados al evento
- Cronograma indicando las actividades del evento
- Preferencias de opciones del local

7. Aprobaciones
- Aprobación del jefe encargado del proyecto
- Aprobación del gerente de imagen y comunicaciones de la empresa Velox Lurín

8. Tipo de Contrato
- Contrato firmado por la empresa Velox Lurín y por la empresa a cargo del proyecto aniversario

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

9. Método de Pago

El pago se realizará en 2 partes:

- El 40% de adelanto se pagará un mes antes del desarrollo del proyecto.
- El 60% restante se pagará a penas se halla culminado con el trabajo.

10. Programa requerido

- Diagrama de Gantt

11. Instrucciones para el formato de propuesta

- Letra: Arial tamaño 11
- Interlineado y justificado 1.5
- Los márgenes deben estar resaltados en negrita
- Archivo PDF

12. Presupuesto del cliente

- 150 mil nuevos soles

13. Envío de Propuesta

- En archivo PDF del Lunes 01/07 al Viernes 05/07

14. Modo de envío de Propuesta

- Envíar al correo: angelo_2307@proamir.com
  Asunto: Proyecto de aniversario Velaz Lunes

2. Objetivo: Desarrollar un evento por el aniversario de Velaz Lunes en un plazo de 5 meses, con un presupuesto de 150 mil nuevos soles aprobado por el Consejo Directivo de la empresa.

1.5

Alcance: se desarrollará un evento por el aniversario de Velaz Lunes y por los años de éxito en el Perú, en un local que contará con capacidad para 1000 invitados, incluyendo trabajadores, proveedores, personalidades del mundo empresarial, etc, en el cual será ejecutado por shows folklóricos, premiación a los trabajadores, entre otras actividades que acompañarán tan magnífico evento.

Continua →

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo


Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Respuesta:

- Las condiciones climáticas serán adecuadas para media.
- Los 150000 soles de presupuesto no serán destinados en otras actividades de la empresa.
- La empresa seguirá con buena trayectoria de éxito en el Perú.
- No habrá corte de personal por crisis económica en el país.
- El gerente de imagen y comunicaciones de Velez Lurín no será despedido, por tanto seguirá en coordinación puntual con el encargado del proyecto.
- Los 1000 invitados asistirán el día del evento.

3.

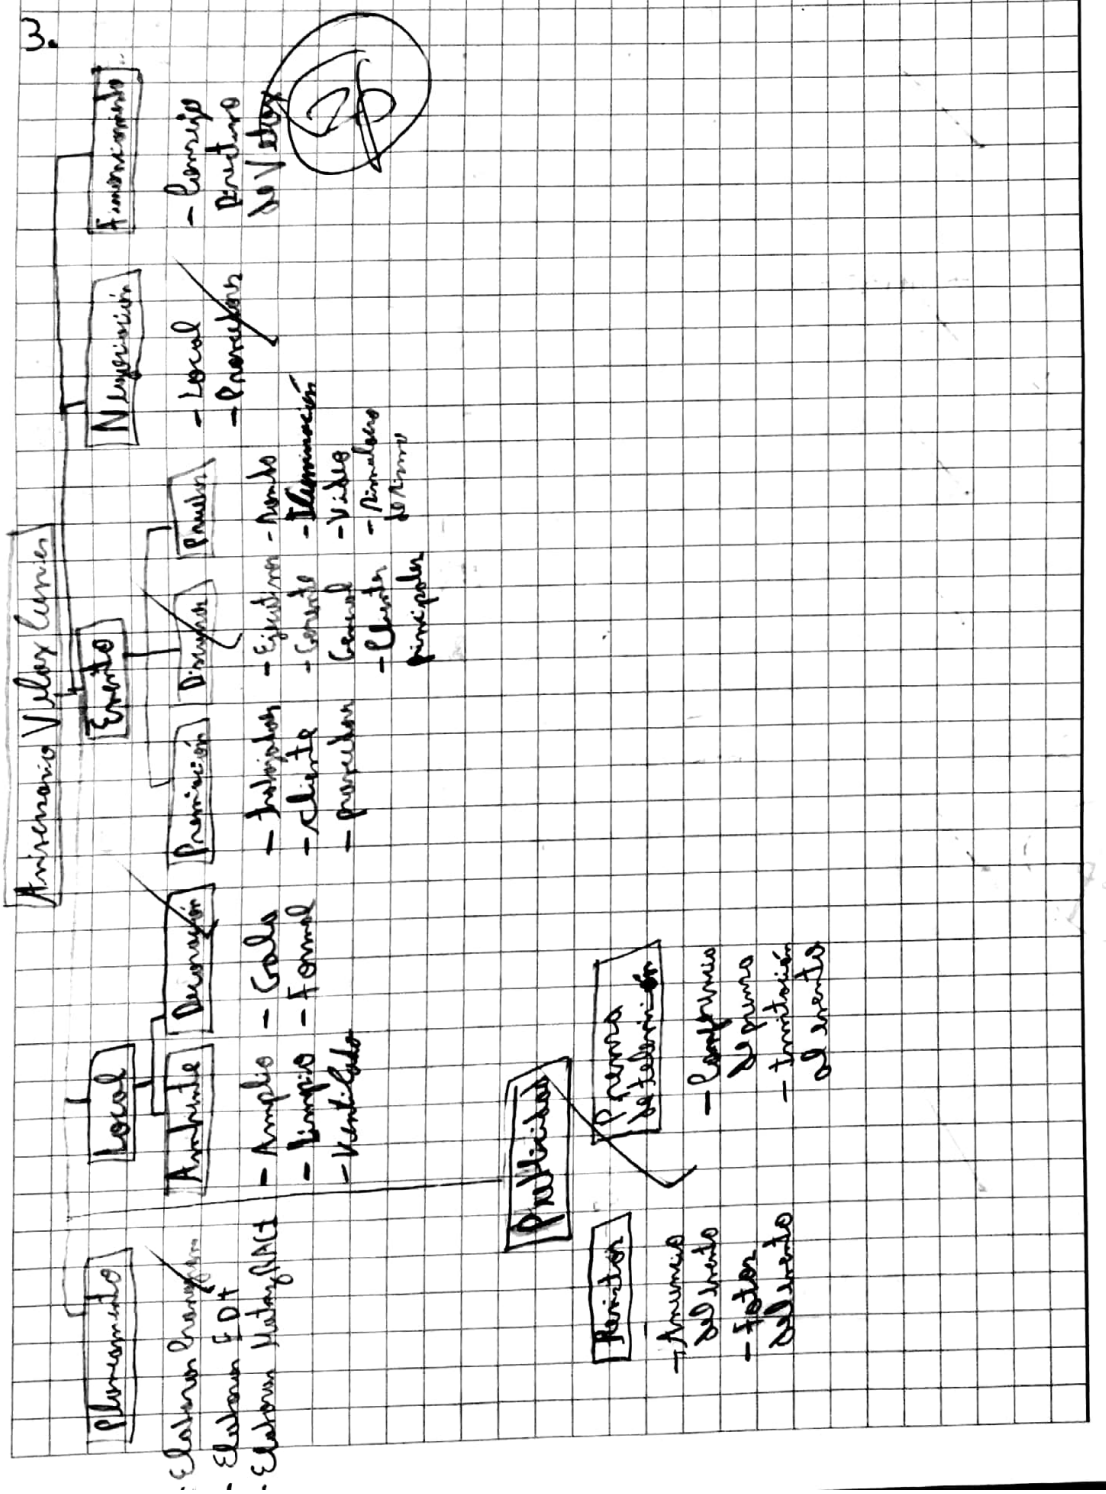

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

ES | EF
LS | LF

Presente aquí su trabajo

4, 5, 6 -) (2p) (1p)

Pregunta 8 (3p)

Id	Actividad	Duración	Predecesoras	ES	EF	LS	LF	Holgura LF-EF	RC
A	Elaborar Cronograma de actividades	7	—	0	7	42	49	42	R.
B	Elaborar EDT	5	A	7	12	44	49	37	R.
C	Elaborar Matriz RACI	5	B	12	17	44	49	32	R.
D	Escoger el Local	7	A,B,C	17	24	49	56	25	R.
E	Escoger proveedores (cena, personal seguridad, etc)	14	D	24	38	56	70	32	R.
F	Limpieza total del local	14	E	38	52	70	84	32	R.
G	Decoración del local	45	F	52	97	84	129	32	R.
H	Colocar mobiliarios en el local	5	G	97	102	129	134	32	R.
I	Coreografía de rueda de prensa	3	H	102	105	134	137	32	R.
J	Desarrollo de rueda de prensa	1	I	105	106	137	138	32	R.
K	Anuncio del evento en eventos	1	J	106	107	138	139	32	R.
L	Pruebas de Sonido	1	K	107	108	141	142	34	NO
M	Pruebas de Iluminación	1	K	107	109	140	142	33	NO
N	Pruebas de Video	3	K	107	110	139	142	32	R.
Ñ	Pruebas de cinco regalos dejados finil	2	L, M, N	110	112	142	144	32	R.
O	Ensayo del show Folklórico	3	Ñ	112	115	144	147	32	R.
P	Ensayo del discurso de agradecimiento	1	O	115	116	147	148	32	R.
Q	Ensayo de presentación de Participantes	2	P	116	118	148	150	32	R.

La ruta crítica es: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-N-Ñ-O-P

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

5) Diagrama de Red — RC: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-N-$\bar{N}$-O-P

ES | EF
LS | LF

> ya puede determinado en la tabla de duración

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

7. Estimar la duración del proyecto:

- Desglosar las actividades del proyecto y recurrir a un experto para que determine la duración del proyecto. (1p)
- Comparar las actividades de este proyecto, con la de otro proyecto que presente actividades similares, o se encuentren en el mismo rubro.

Ejemplo:

- La actividad (G) "Decoración del Local" fue analizada por un experto, ya que el experto analizó las dimensiones del local, y la complejidad en la decoración que quiere la empresa Velas Lunes

- La actividad (L) "Prueba de sonido" se hizo una estimación de acuerdo a un proyecto muy similar que estamos desarrollando en clase, tal cual lo es un "Festival de rock", ya que la prueba de sonido tiene parámetros ya definidos.

8. La pregunta 8 está desarrollada en la tabla

9. RC-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-N-Ñ-O-P ✓

Duración del proyecto según RC: 118 días

Día de duración hubiera sido: 150 días

(2p) En este caso, existen 42 días de diferencia, por lo cual podríamos decir que el proyecto terminará mucho antes de lo previsto, por tanto en este caso se tomarán las siguientes acciones:

- Bonificar a los empleados por culminar el trabajo antes de tiempo.
- Asignar personal de este proyecto, a otro proyecto que se esté desarrollando en paralelo.
- Mejorar el acabado del proyecto, es decir la decoración, instalaciones, etc.

Scanned by CamScanner
