FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

06 JUN. 2015

6/6

8:00 - 10:00

A 203

Código del alumno

2	0	1	0	0	1	4	5

Nombre del alumno

Katerine Oré Sánchez

1er EXAMEN DE

IND 328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A602

Horario: 1032

Fecha: 15-5-15

Nota: 18

Nombre del profesor del curso: Portugal

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

PUCP


ET LUX IN TENEBRIS LUCET MCMXVII

para
rollos

Presente aquí su trabajo

Pregunta 1.-

1.-

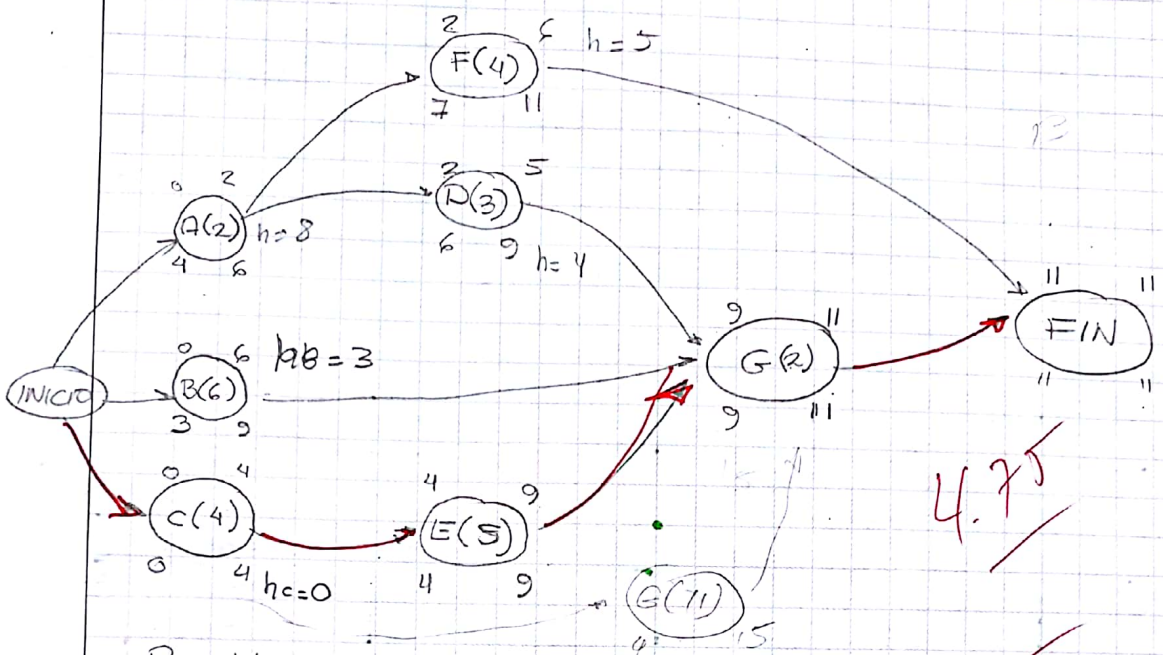

4.75


... Resaltado en rojo se encuentra el camino crítico, el cual tiene una duración de 11 semanas

2. La holgura de C es cero y la holgura de B es 3 semanas

3.- El camino con más olgura es A-F, el cual tiene una holgura de 8.

4.- Como C pertenece a la ruta crítica, al aumentar el tiempo a esta actividad la duración del proyecto se ve inmediatamente afectada, la duración del proyecto ahora sería de 17 semanas

5.-

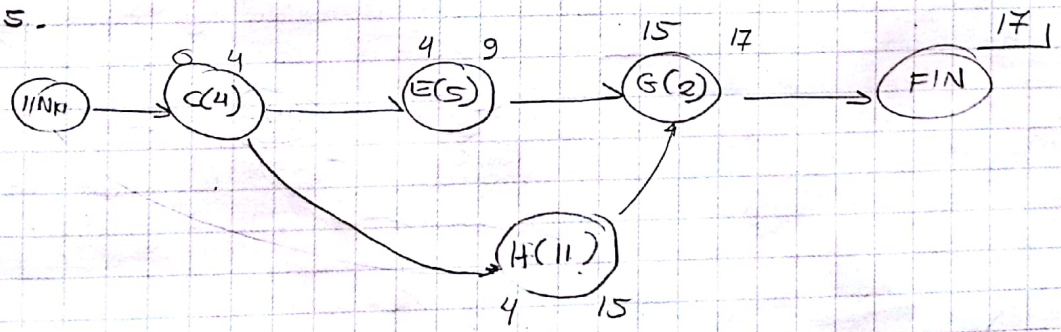

Como se puede observar el incremento de tiempo es mayor a las 11 semanas, por lo cual la generia del poyecto debe estar preocupado por añadir esta actividad.

6.- El proyecto llevará 6 semanas más de lo planeado.

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Pregunta 2.7

* Anexo 7

Primero se tiene que realizar un consenso entre los participante involucrados. y llegar a un acuerdo entre el peso que se le tiene que dar a cada criterio; por juicio de experto se da la siguiente priorización:

Población beneficiaria	3/6	= 50%
Costo Inversión inicial		= 33%
Costo anual	1/6	= 17%

	Pob. Beneficiaria	Costo I I	Costo Anual
A	280 K ①	9 800 K ③	600 K ③
B	1 800 K ②	72 000 K ①	5 600 K ①
C	21 000 K ③	16 400 K ②	3 000 K ②
	50%	33%	17%

	Pob B	C. I I	C. A	Total
A	1 x 0,5	3 x 0,33	2 x 0,17	2
B	2 x 0,5	1 x 0,33	1 x 0,17	1,50
C	3 x 0,5	2 x 0,33	2 x 0,17	2,5

Informe técnico:

Antecedente: El Perú es uno de los países más vulnerables frente algún desastre natural, ya que las condiciones de vivienda y cultura no son las adecuadas frente a un desastre natural.

Objetivo: ~~Selección de un método~~ elegir un proy para la reducción frente a algún desastre natural.

Problema: Se debe seleccionar el método de prevención de desastres más adecuado para toda la población.

Escriba aquí su trabajo

Metodología

Se cuenta con 3 posible proyecta que ayudarían a enfrentar el problema.

Para la selección del proyecto más adecuado primero se establecerá los criterios de selección, Luego se les dará un porcentaje de importancia a cada uno de estos, para lo cual se debe llevar un consenso entre las entidades involucradas

Finalmente, se evalúa las proyectos teniendo en consideración los criterios de selección.

Presentación de resultados.

Al desarrollar los criterios de selección se obtuvo lo siguiente:

- Población beneficiaria 50 %
  Costo I. Inicial 3 %
  Costo anual 17 %.

Luego se procedió a la selección del proyecto

	Total
A	2
B	1,5
C	2,5

Con lo que se realizará la Implementación de Sismómetros a nivel nacional

Para ver más detalle ver Anexo 1 * pag anterior

Pregunta 3


a) Alcance de Proyecto..

- Caracteristica del Producto: Implementación de acelerómetros y sismómetros e Infraestructura
- Requerimientos: Instalación de 169 puntos a nivel nacional e infraestructura
- Límites: El proyecto inicia en la adquisición de los equipos y termina en el desarrollo del proyecto
- Exclusiones: No se considera capacitación a personal nuevo, nº fallas de los equipos después del desarrollo.
- Entregables: ✓ Infraestructura para personal ✓ Equipos instalados ✓ Informes de selección de proveedores ✓ Informe final ✓ Planos de Construcción ✓ Licencia de Funcionamiento
- Restricción recursos: RRHH para instalación y verificación


b.. Matriz de Involucrados.

Ver hoja adjunta

c. EDT

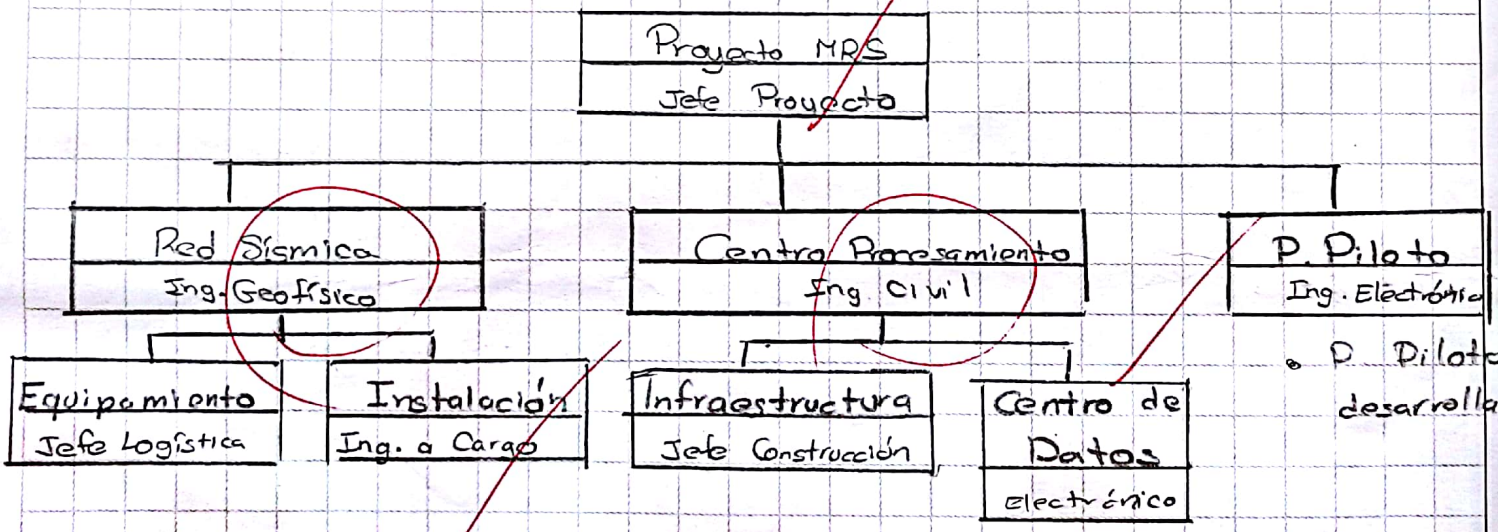


d..

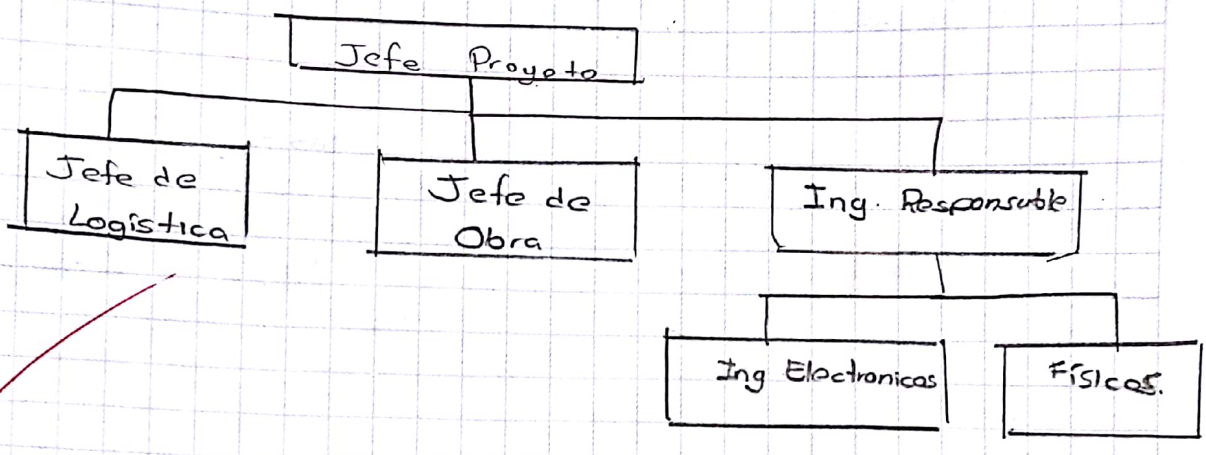

e..

Numero	Actividad	Duración	Precedente
A	Planeación de Proyecto	2 semanas	
B	Adquisición de equipos	24 semana	A
C	Dotar punto físicos	12 semanas	A
D	Instalación de equipos	24 semanas	B, C
E	Construcción Infraestructura	22 semanas	A
F	Equipamiento y Capacitación C.D	12 semana	D, E
G	Desarrollo Prueba Piloto	4 semanas	F

f)

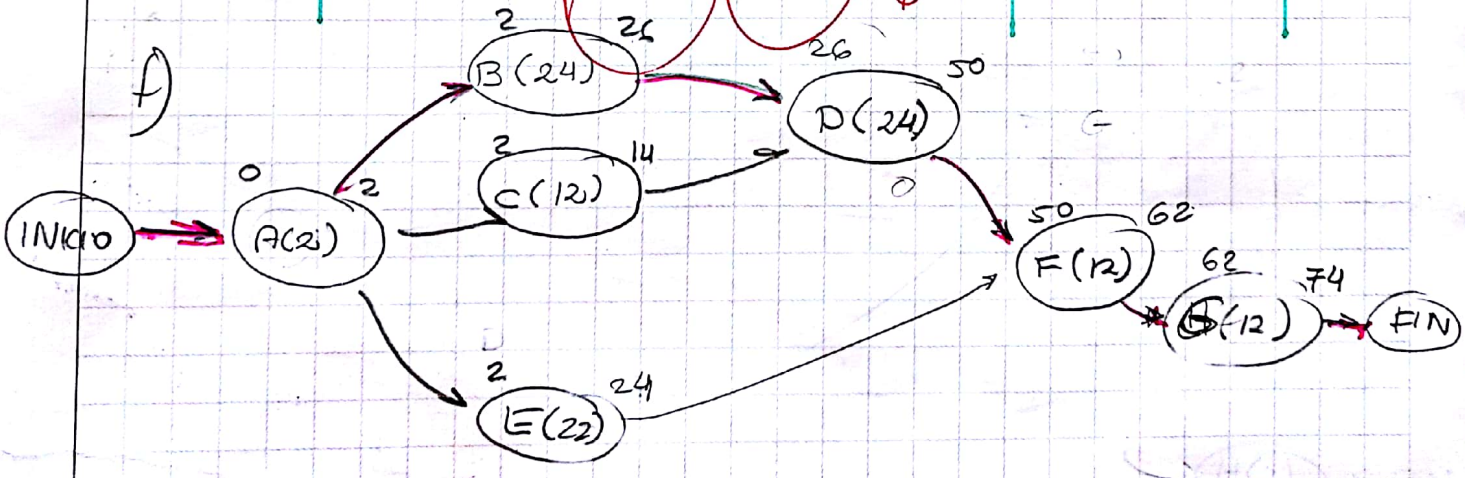

Como se puede ver la ruta crítica son en los que están involucrados los 5 exportes especialistas ya que ellos determinan el avance del proyecto, por lo cual la duración será de 74 semanas.

Ruta crítica en Rosado
