FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

31 MAYO 2016

Código del alumno

2	0	1	1	2	5	3	0

Nombre del alumno

Guerrero Ocalmaco, Hiro César.

1er EXAMEN DE

IND328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A-605

Horario: 1032

Fecha: 13/05/16

Nota: 14

Nombre del profesor del curso: I. Dunin

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.

Presente aquí su trabajo

na exclusiva para
:ulos y desarrollos
(borrador)

Pregunta 2:

Actividades:

1: Análisis del negocio → 6 días
2: Definición de la necesidad → 2 días
3: Proyecto lógico → 4 días
4: Análisis del Sistema → 8 días
5.1: Diseño de entradas y salidas → 4 días
5.2: Diseño de la base de datos → 15 días
6.1: Desarrollo de pantallas → 8 días
6.2: Desarrollo de reportes → 10 días
7: Desarrollo de BD → 5 días
8: Listado de cambios y ajustes → 6 días
9: Pruebas → 8 días
10: Puesta en producción → 8 días

1)

2)

Duración = 62 días
Ruta Crítica = Inicio - 1 - 2 - 3 - 4 - 5.2 - 7 - 8 - 9 - 10 - Fin

→ Continúa a la vuelta


Acciones: Se tienen que trabajar sobre la Ruta Crítica, ya que así se influye sobre la duración total del proyecto.

- Implementar un estudio de tiempos que permita analizar cada actividad de la Ruta Crítica con cuidado. el objetivo de intentar reducir en 7 días su duración total y así llegar a 55 días de terminación del proyecto.
- Juntar actividades que se complementen, de tal manera que se ahorren al mismo tiempo y reducir así los tiempos. Por ejm: Juntar Actividad 2 y 3, Actividad 5.2 y 7

Duración = 4 días

Duración = 15 días

↓ Reducción de tiempo mutuo

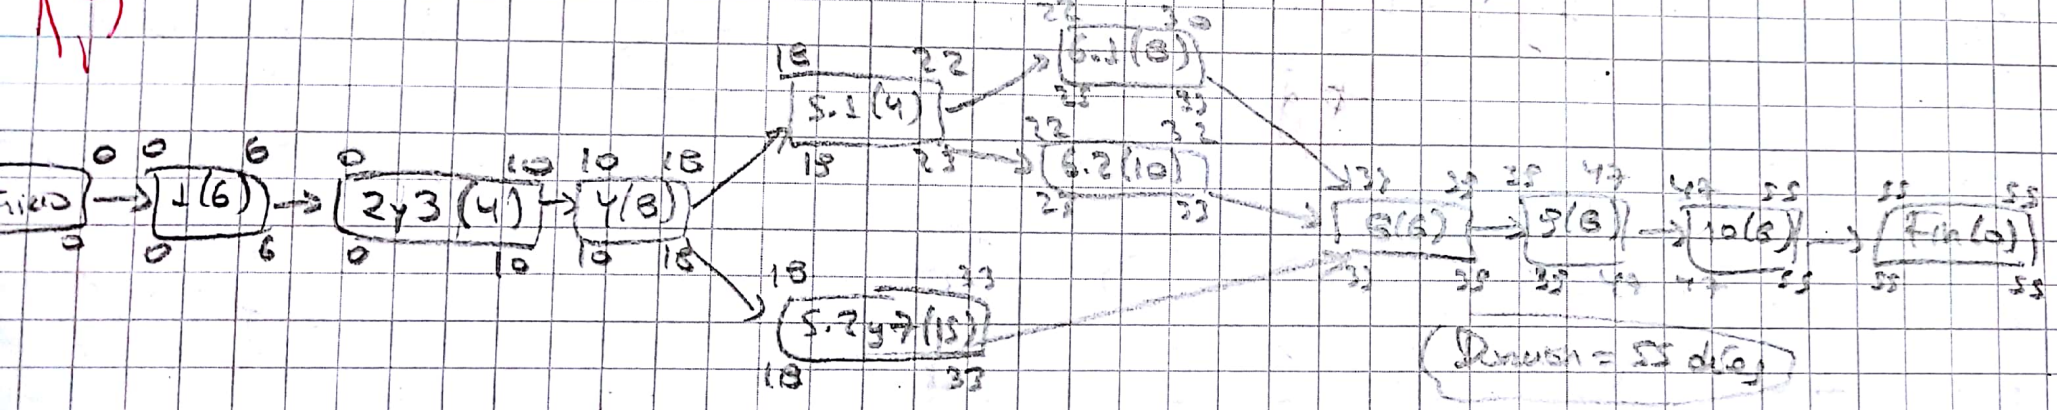

Contratar más personal en las Actividades 4 y 8. de tal manera que se reduzca a la mitad sus duraciones, obteniéndose un avance más veloz y así poder acortar el tiempo de finalización del proyecto en 7 días.

Presente aquí su trabajo

Pregunta 1

SDP "Proyecto de Construcción de Casa de Playa para Esparcimiento y Descanso Familiar en "Las Totoritas".

1) Descripción del Proyecto
El proyecto consiste en la construcción de una casa de playa ubicada en "Las Totoritas" (distrito de Mala) que será utilizada como lugar de esparcimiento y descanso familiar.

2) Especificaciones Técnicas - Características
- La casa estará en un terreno de 3000 m². Se tiene?
- Deberá contar con piscina, concha de frijolito con gras natural
- La planta principal tendrá 2 pisos. En el primer piso estará la cocina, comedor, sala de estar, escritorio, terraza y sala de recepción. En el segundo piso estarán los dormitorios principales con 2 baños y 1 sala adicional. planos
- Las habitaciones de huéspedes serán 6 con baño propio y estarán al costado de la piscina.
- La casa deberá estar construida de material noble (antisísmica) con cimentación apropiada por la casa, habitaciones y piscina
- Los acabados serán a criterio de la empresa a contratar previa consulta con el contratante.

3) Entregables
- Mensualmente la empresa contratada emitirá un reporte de los avances del proyecto, así como también hará una presentación del mismo con la empresa contratante para observar en comparación con lo planificado. cual es? cuando se entrega

4) Aprobaciones
- Las aprobaciones para la realización de actividades adicionales deben ser consultadas previamente. En caso de dar el visto bueno se implementarán.
- También existirán aprobaciones para los avances mensuales.
- En caso no se cumplan los objetivos cada mes, se estipula en el contrato que habrá penalizaciones económicas.

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva pa
cálculos y desarro
(borrador)

5) Formato de Propuesta

. El formato de propuesta contempla las siguientes partes:
- Checklist de las actividades a realizar y a cumplir fechas?
- Tiempos de entrega
- Inversión en Maquinaria y Equipos
- Maquinaria y Equipos a Utilizar
- Inversión en Personal
- Cantidad de Personal y tipo de rol que cumplen.
- Experiencia en el Rubro (Proyectos anteriores)
- Observaciones Adicionales

6) Fecha Fin de Envío de Propuesta

Considerando que la SDP se cierra hoy 13/05/2016, la fecha máxima de entrega de propuestas es el 13/06/2016 (1 mes).

7) Inversión Total

La cantidad de inversión con la cuenta es de 5 millones de soles en la que se cuentan maquinaria, equipos, materiales, costo de la mano de obra y gastos varios.

8) Maquinaria con la que se cuenta

Nosotros tenemos montacargas que los podrán servir en la construcción y ejecución del proyecto.

9) Fecha de Entrega de Proyecto

Se considera que la fecha máxima de entrega es el 15 de diciembre del 2016.

lusiva para
desarrollos
rador)

Pregunta 3

1) **Objetivo**

El objetivo del "Concurso de Proyectos de Tecnología, Innovación y Emprendimiento" es premiar a los ganadores con una pasantía en algunas universidades europeas que potencialmente podrían apoyarlos a continuar su carrera y/o contratarlos futuramente en algunas empresas relacionadas a las universidades.


Alcance

El concurso contará con la participación de aproximadamente 800 estudiantes de las diferentes especialidades de ingeniería y ciencias de la universidad. Pueden participar todas las carreras de la FCI PUCP. La duración del proyecto será de 6.5 meses.

Suposiciones

- Se prevé que no habrán manifestaciones durante la semana central del concurso.
- Solo participarán alumnos matriculados.
- Se prevé que no habrán desastres de ningún tipo durante todo el proyecto.
- Se asume que las universidades europeas donde los alumnos harán su pasantía tienen convenios con la PUCP.
- Los jurados deben tener experiencia en las 5 líneas de investigación señaladas.

2) EDT

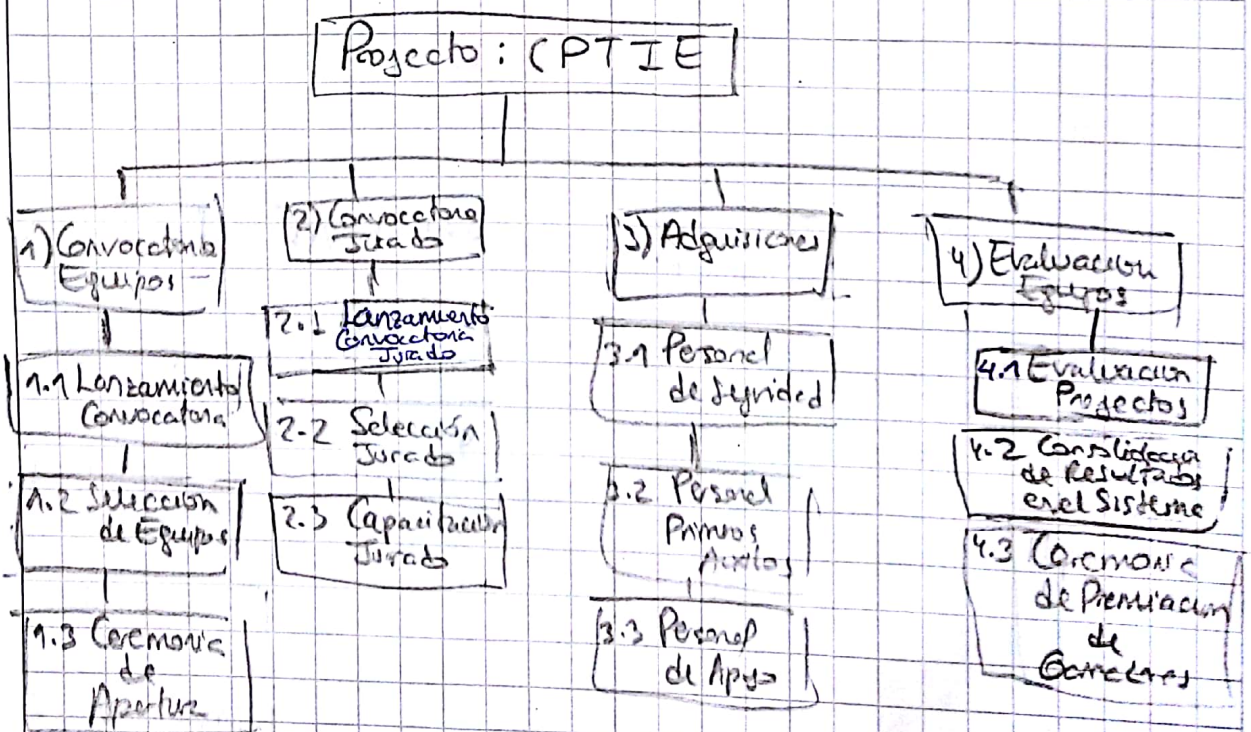


Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

3)

Actividad	Duración (días)	Precedencias
1) Convocatoria Equipos		
1.1 Lanzamiento Convocatoria	50	-
1.2 Selección de Equipos	38	1.1
1.3 Ceremonia de Apertura	1	3.1, 3.2, 3.3, 2.3
2) Convocatoria Jurado		
2.1 Lanz. Convocatoria Jurado	30	-
2.2 Selección Jurado	15	2.1
2.3 Capacitación Jurado	20	2.2
3) Adquisiciones		
3.1 Personal de Seguridad	15	1.2
3.2 Personal de P. Auxilios	10	1.2
3.3 Personal de Apoyo	25	1.2
4) Evaluación Equipos		
4.1 Evaluación Proyectos	5	1.3
4.2 Consolidación de Resultados Sistema	1	1.3
4.3 Ceremonia de Premiación Ganadores	1	4.1, 4.2

Ruta crítica.

2.

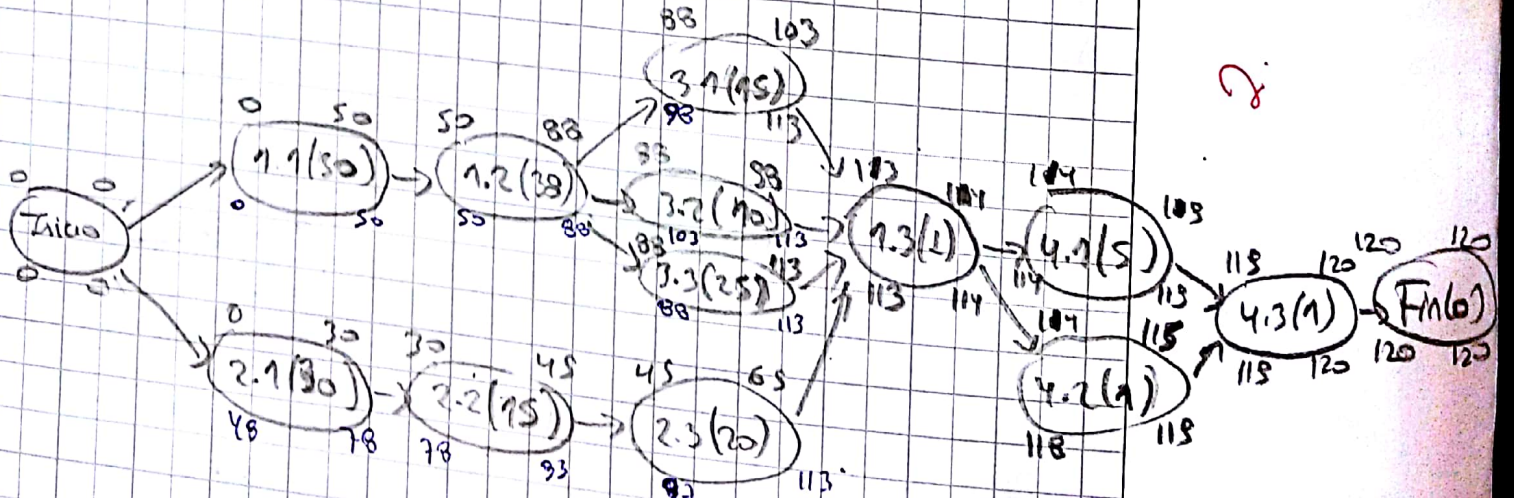

Duración = 120.

usiva para desarrollos ador)

4. Matriz de Riesgos

Riesgos

- Jurados faltos de capacitación
- Proyectos incompletos por parte de equipos
- No tener disponibles instalaciones de la PUCP.

