FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

Código:

2	0	0	7	4	8	2	5

Nombre del alumno:

María Veronica Zavala Gonzales

2do EXAMEN DE:

Gestión de Proyectos

Firma:

Nota:

Aula: A102

Horario: 1032-1

Fecha: 06/04/12

Nombre del profesor:


M. Portugal

Firma del profesor del curso:

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Los cálculos en borrador deberán efectuarse en la cara izquierda de las hojas, dejando la derecha para el trabajo en limpio. Se recomienda, especialmente, evitar anotaciones o cálculos auxiliares en las hojas sueltas: todo el trabajo deberá constar en este cuadernillo.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.

5/0.50 Gest. Proy. – 01 Ex.

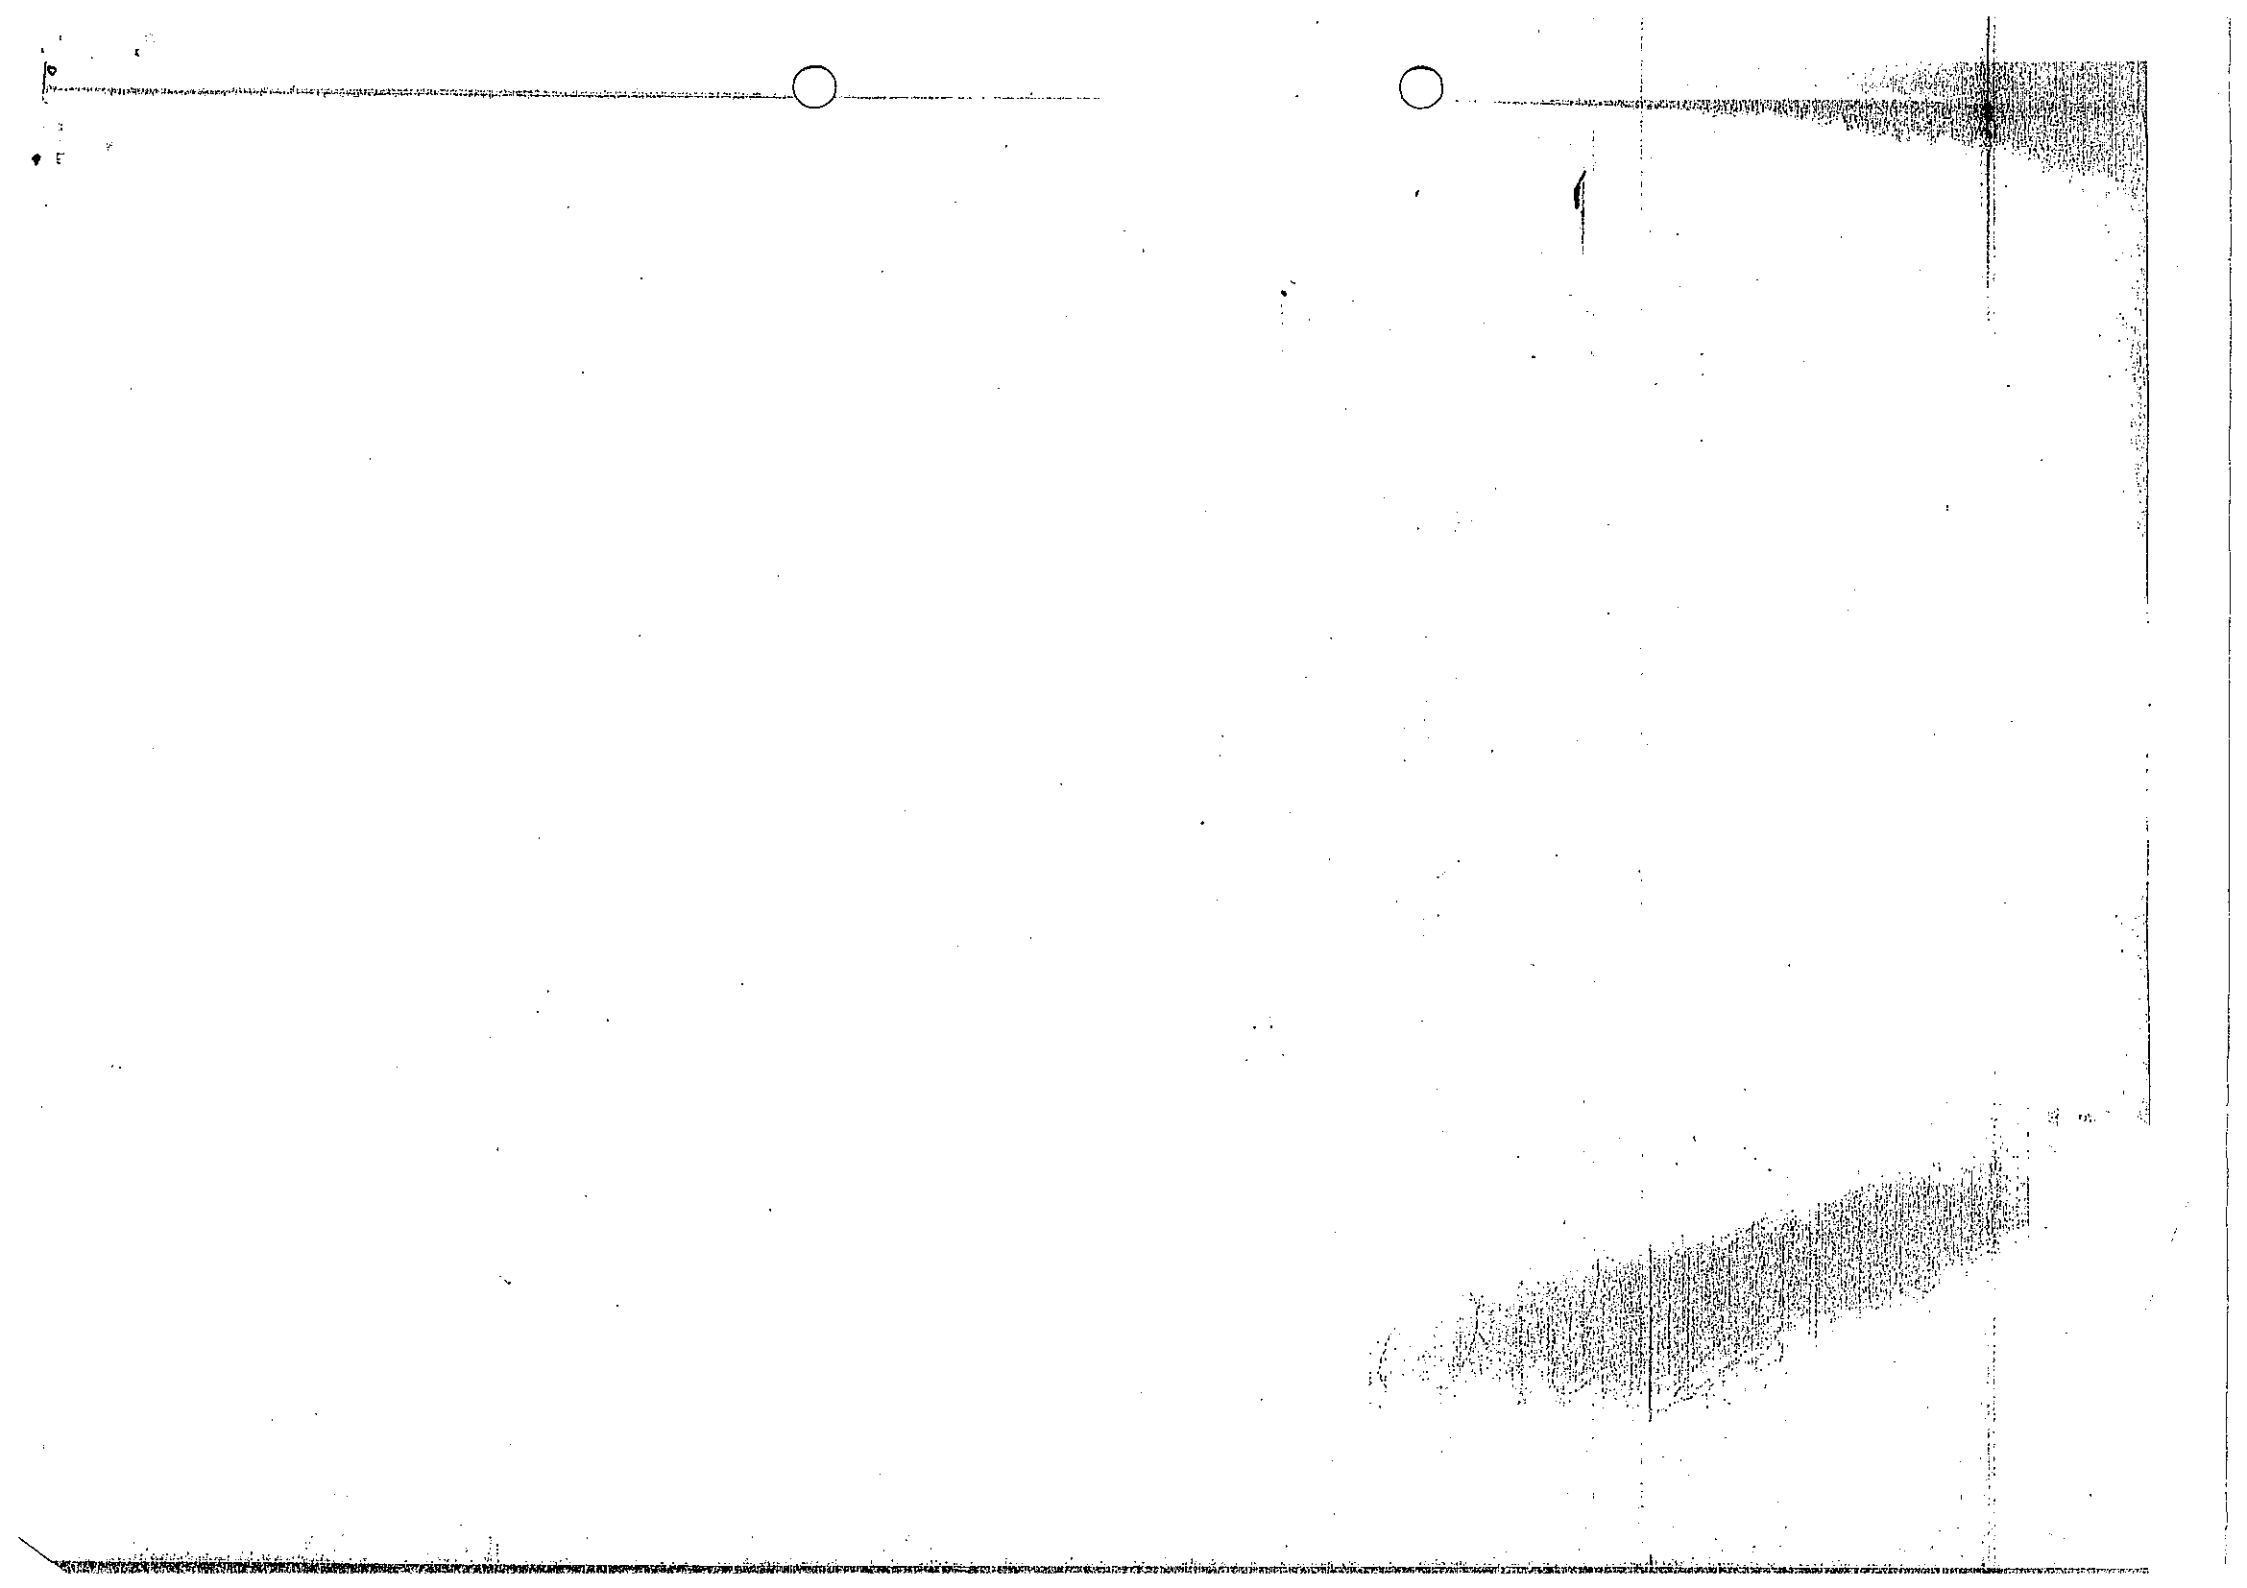

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 2
(Primer semestre 2012!)

Indicaciones generales:
Duración: 2 horas y 50 minutos
La prueba ES CON APUNTES PERSONALES. Sea ordenado, conciso y preciso. Escriba con letra legible. Presente adecuadamente su examen. Está permitido usar calculadora.
La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

CASO I: Inscripción de un Partido Político (14 Puntos)

Usted ha sido designado como Gestor de Proyectos en el **PAPEPIPOPU** "Partido Peruano Picante y Popular y Purificador" para formalizar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones - JNE.

En esta oportunidad se le encarga desarrollar el proyecto para la recolección de Un Millón de Firmas, la intención es presentar una propuesta política diferente, basados en el cuidado del medio ambiente y en la sostenibilidad del ecosistema peruano, alternativa que participaría en las siguientes elecciones 2016.

El proyecto incluye el desarrollo de un Plan de Gobierno que contendrá 16 capítulos, tantos como Ministerios existen en la actualidad, Plan que será acompañado de un informe del JNE dando por entregadas este millón de firmas.

El encargo se le hace hoy, viernes 06 de julio de 2012 y tiene 100 días para llevarlo a cabo. Expertos en el tema sugieren el desarrollo de una prueba piloto para medir los tiempos en campo del proceso de recolección de firmas.

Los planillones conteniendo las firmas serán entregados al JNE para su validación, tanto en físico como en medios virtuales. Para desarrollar su trabajo el JNE puede recibir entregas parciales (físicas y virtuales) de firmas antes de emitir su informe final, este informe será emitido por el JNE en un plazo máximo de 30 días calendario luego de recibir la última firma.

Se sabe que los planillones serán basados en la información del JNE y la RENIEC, es decir contendrá como mínimo los nombres completos, apellidos, N° DNI y firma.

Por experiencia sabe usted que las personas adulteran las firmas o datos personales, con lo que por cada 10 firmas emitidas el JNE invalida a tres de las mismas.

Se le solicita a Usted lo siguiente.

1. El Enunciado del Alcance del Proyecto, el mismo contendrá:
   - Justificación.
   - Delimitación o descripción del Proyecto.
   - Organización inicial del proyecto.
   - Desarrolle el proceso para modificar el alcance.
   - Cronograma preliminar de hitos.
   - EDT inicial (muestre el detalle necesario)

2. Presente su Plan de Gestión de las Comunicaciones, en el cual no deben faltar:
   - Requisitos de comunicaciones de los interesados
   - Persona responsable
   - Destinatarios
   - Métodos para transmitir la información
   - Frecuencia de distribución

3. Defina las métricas de calidad que considere necesarias para cada una de sus componentes o entregables, ¿como las medirá?

4. Defina el Plan de Capacitación de Recursos Humanos, tenga en cuenta que tiene casi a 400 personas trabajando y debe desarrollar su plan a nivel nacional.

CASO II: Gestión de Costos (6 Puntos)

Tienes un proyecto para construir un gran cerco de forma cuadrangular alrededor de un extenso terreno. Cada lado del cerco tardará un día en construirse y el presupuesto es de US$ 10,000 por lado. Se planifica ir completando cada lado uno tras el otro. Hoy es el final del día tres.
Utilizando el siguiente diagrama de estado del proyecto, calcula e interpreta los resultados del PV, EV, AC, CV, CPI, SV y SPI

Actividad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Estado Final del Día 3
Lado 1	S———F				Completado, gasto de US$ 10,000
Lado 2		S———PF	---F		Completado, gasto de US$ 12,000
Lado 3			PS—S---PF		50% terminado, gasto de US$ 6000
Lado 4				PS———PF	No se ha empezado aún

S: Comienzo real, F: Final real, PS: Comienzo planificado y PF: Final Planificado

BAC = 10,000 x 4 d

Profesores del curso:

Martín Portugal O.
Ricardo Vega H.

San Miguel, 6 de julio de 2,012

CASO 1

(1)

Justificación:

El proyecto a realizar para la recolección de un millón de firmas tiene como objetivo presentar una propuesta política, que tiene como base el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad del ecosistema peruano. Esta propuesta participaría en las elecciones del 2016.


Descripción del proyecto:

- Se capturarán un millón de firmas de los diferentes departamentos del Perú, especificando los departamentos más poblados.
- Se contará con ~~encuestadores alrededor~~ de todo el Perú, jefes de cada departamento especificados y supervisores.
- El horario de desarrollo de la recolección será de lunes a Jueves, de 9:00 - 6pm y de Viernes a Domingo, de 10:00am - 9pm. El horario de fines de semana es más largo porque en estos días hay más concurrencia de personas en las calles.
- El plazo para recolectar las firmas es de 100 días.
- Se desarrollará una prueba piloto para determinar los tiempos en campo en el que se recolectan firmas.
- La cantidad de firmas a recolectar es mayor, debido a la política de JNE de invalidar 3 firmas de cada 10. Entonces:


$$\text{TOTAL Firmas} = 1000\,000 \times \frac{10}{(10-3)} = 1425\,571,429 \approx 1500\,000$$

- Además de las firmas se entregará un plan de Gobierno.
- Las firmas se entregarán tanto en físico como digitales.
- Los costos incurridos a lo largo del proyecto serán cubiertos por el partido político PAPEPIPOPO.
- Se contará con abogados para todos los aspectos legales que se necesiten llevar a cabo.
- Se contará con centros de operaciones en cada departamento (max 4)

Organización Inicial del Proyecto

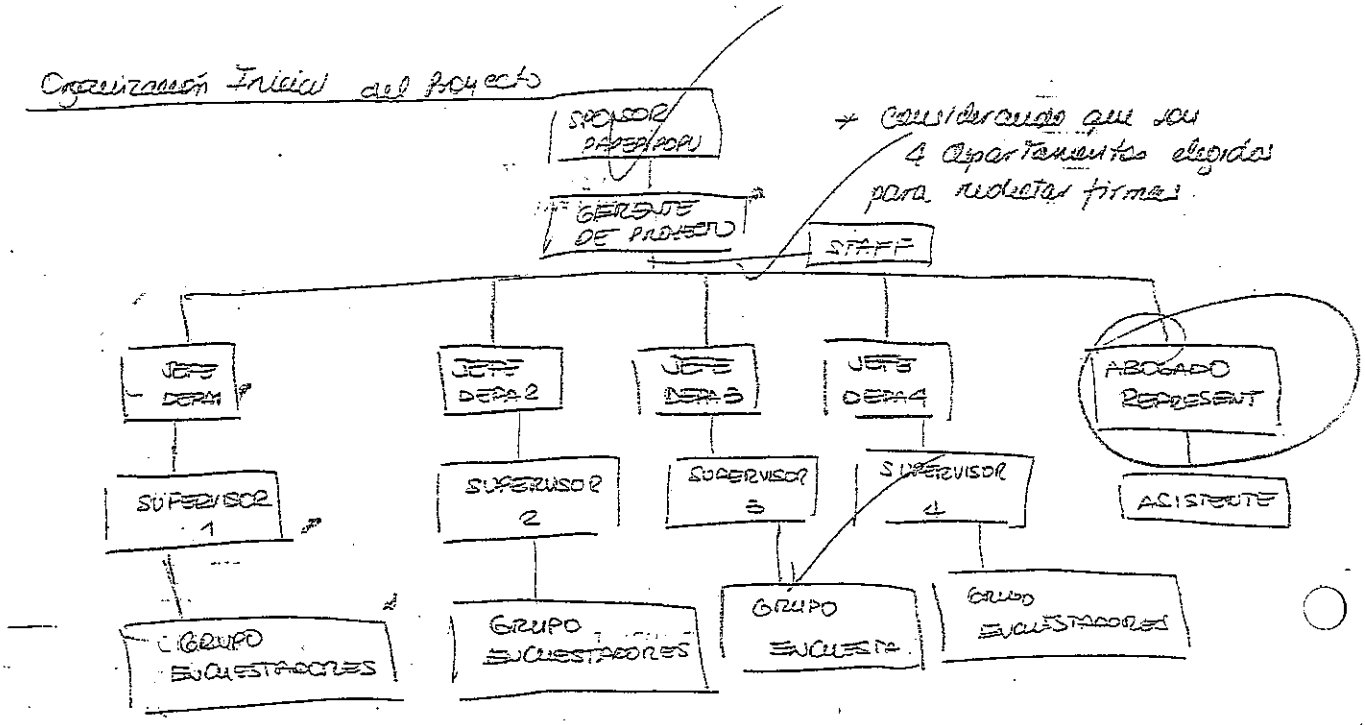


Proceso para modificar alcance

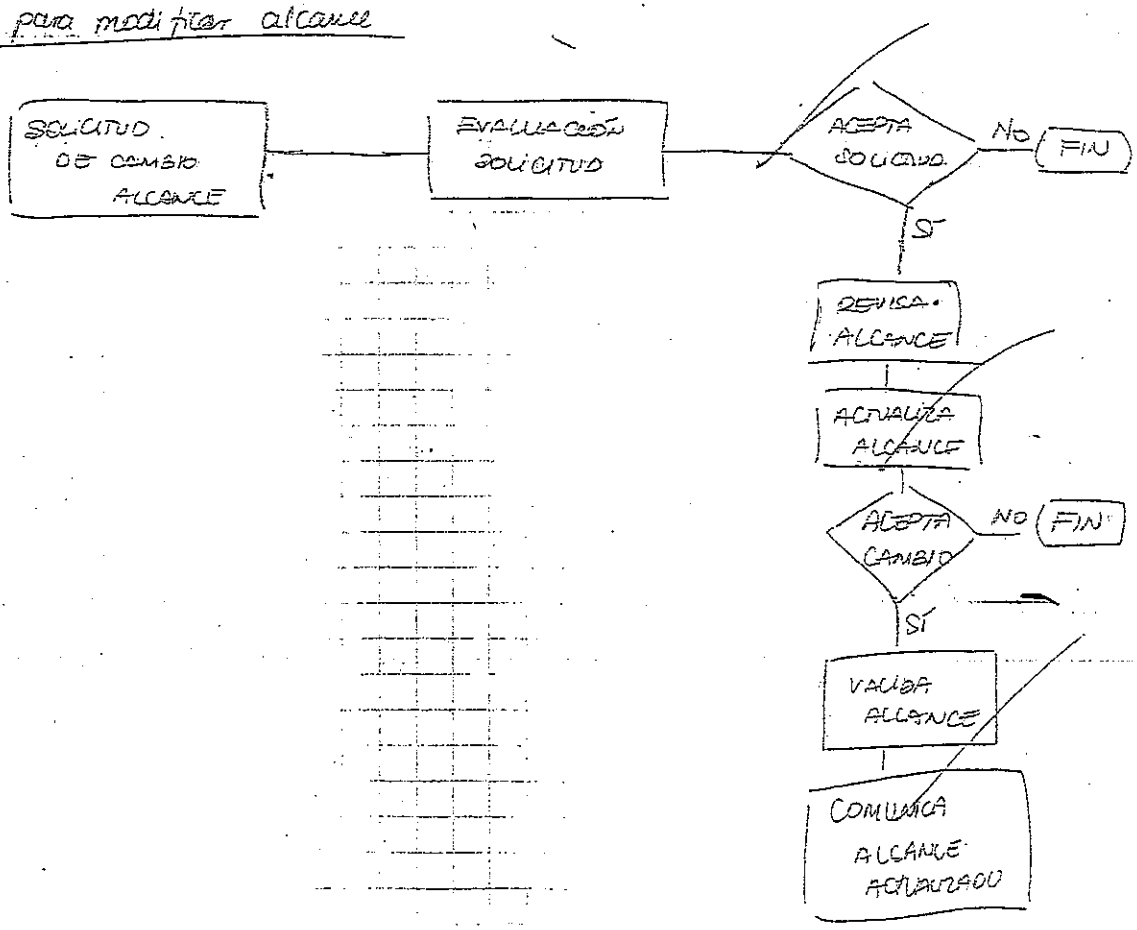

Cronograma

HITO	Fecha
• Inicio proyecto	06/07/2012
• Reclutamiento equipo encuest.	10/07/2012
• Inicio prueba piloto	30/07/2012
• Inicio recolección firmas	15/08/2012
• Elaborar plan de Gobierno	30/08/2012
• Entrega planillones físico y virtual junto a plan de Gob.	16/09/2012

EDT Inicial

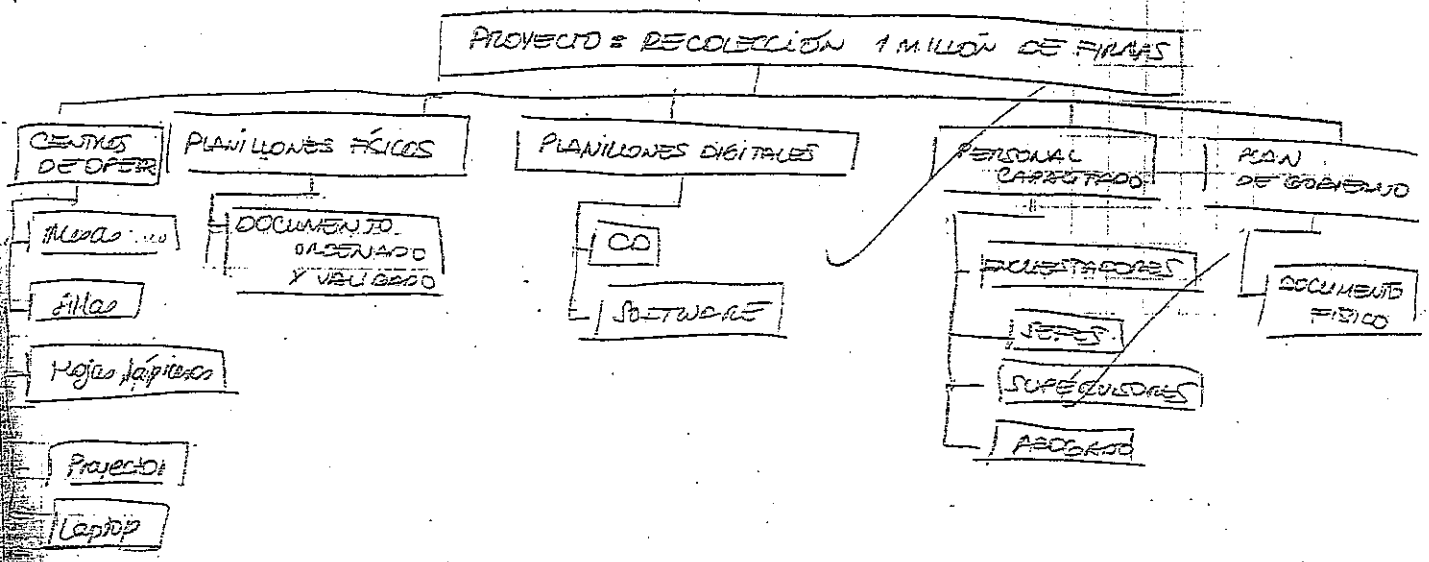

(2) PLAN GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Información	Contenido	Formato	Nivel de detalle	Responsable Comunicación	Grupo Receptor	Método/Tecnología Verificación	Frecuencia
Inicio	-	Acta de reunión	Medio	Gerente de Proyecto	Equipo Proy. Cliente	Reunión presencial	1
Planificación	Plan de gestión de RRHH, riesgo, comunicación, costo, adquisición	Avance del Plan de Gestión	Alto	Gerente del Proyecto	Equipo Proy Cliente	Documento físico, virtual	3
Ejecución	Comunicación y recomendaciones del proceso	Acta de reunión	Alto	Gerente del Proyecto Equipo del Proyecto	Equipo del proy Cliente	Documento físico, virtual	Acuerdo/cumplimiento
Control y seguimiento	Indicadores de calidad y control de tiempos	Listado de indicadores	Alto	Gerente del Proy. Equipo Proyect	Eq Proy cliente	"	Semanalmente
Liberación de pagos	Entregable documentado	Entregable	Medio	Gerente del Proyecto Equipo del Proy.	Cliente	físico y virtual	Cuando se realiza un entregable
Cierre	Información anterior documentada	Documentos del cierre	Alto	Gerente del Proy.	Equipo Proy. Cliente	"	1

(3)

Variable	Instrumento Medición	Métrica
Planillas digitales / físicas		
→ Tiempo ejecución	Cronómetro	minutos / planilla
→ Planillas validadas	Inspección visual	# planilla validada o inválida
→ Tipo de letra	" "	" impresión de prueba
→ Resolución	Software conjunt.	pruebas
→ Cantidad	Insp. visual / software comp.	# de fallas
Personal capacitado		
→ Cantidad de fallas	Cronómetro / Inspección visual software comp.	# de fallas / encuestas
→ Velocidad ingreso fallas		# de fallas ingresadas
Plan de Gobierno		
→ Cantidad en contenido	Inspección visual	# errores detectados de cont.
Centro de operaciones		
→ Muebles	Inspección física	# muebles defectuosos
→ Lapiceras	"	# lapiceras "

(4)

- Contando con una cantidad de 400 personas trabajando, entre ellos jefes, supervisores, abogados, staff y encuestadores, se requiere apoyo externo para poder administrar adecuadamente a estas personas.
- Se capacitará a los encuestadores sobre información necesaria de cómo rellenar las planillas, qué datos se solicitan, formatos, etc.
- También se realizarán capacitaciones sobre el uso del software para el ingreso virtual de las planillas.
- Los lugares y las fechas de capacitación se plantearán de acuerdo a los departamentos donde se recolectarán los datos, y de acuerdo a disponibilidad de los encuestadores. Para no dificultar por la disponibilidad, las capacitaciones se darán antes de iniciar la jornada laboral en los horarios de trabajo para los que han sido contratados. Asimismo, los lugares de capacitación se realizarán en las sedes de operaciones de cada departamento, por lo que los encuestadores deben pertenecer a esos lugares.
- Para los abogados, jefes y supervisores habrán capacitaciones para dirigir personas eficientemente y para el desarrollo del Plan de Gobierno

Caso II Gestión de Costos

Presupuesto = 10 000 $/caso. ⇒ P. total = $ 40 000

Costo hasta el día de hoy = 10000 + 12000 + 6000 = $ 28 000

Costo real del proyecto = 28 000 + 12000 × 2 = $ 52 000

- AC = $ 28 000
- EV = $ 52 000
- CV = 52 000 - 28 000 = $ 24 000
- CPI = 52000/28 000 = 1,86

SV = EV − PV

SV = 52 000 − PV

SPI = EV / PV = 52000/PV

Interpretación

- AC es el valor del gasto hasta la fecha de hoy, este aún no supera el presupuesto
- EV es el valor del gasto real del proyecto, el cual es mayor al presupuestado
- CV es el valor de la variación de costo, que en este caso es positivo pues el presupuesto ha sido superado
- CPI es un indicador de desempeño, hasta el avance respecto al costo total del proyecto, debe ser igual a 1, cuando el proyecto culmine.

FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

Código

2	0	0	5	0	2	7	5

Nombre del Alumno:

Milla Obregón, Gloria Katherine

2do EXAMEN DE

Gestión de Proyectos

Firma

Nota

14

Aula B-101

Horario 1031

Fecha 02/07/09

Nombre del Profesor

Fernando Noriega

Firma del Profesor del Curso

ADVERTENCIA:

Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.

Los cálculos en borrador deberán efectuarse en la cara izquierda de las hojas, dejando la derecha para el trabajo en limpio. Se recomienda especialmente evitar anotaciones o cálculos auxiliares en las hojas sueltas: todo el trabajo deberá constar en este cuaderno.

La presentación material y la propiedad gramatical influirán en la calificación.

s/ 0.50 Gest. Proy. — 03 Ex. —

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FCI - SECCIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

"GESTIÓN DE PROYECTOS"


EXAMEN FINAL

Observaciones:

- Duración: 2 horas y 30 minutos
- Prueba individual y sin material de consulta
- Escoger sólo 5 preguntas entre la 1ª y la 7ª.

PREGUNTAS:

1. ¿De qué manera usted puede aplicar la Teoría de Restricciones en Gestión de Proyectos? ¿Cuáles son las limitaciones del modelo, según su criterio? (2 puntos).
2. Disertar cómo aborda la incertidumbre la Teoría de Restricciones aplicada a la Gestión de Proyectos y cómo resuelve este problema. Incluir en su análisis la teoría de probabilidades (2 puntos).
3. Describir que se quiere decir con *programación con recursos restringidos* ¿Por qué se usa? ¿Cuándo se usa? (2 puntos)
4. Explicar el *proceso de elaboración de presupuesto* para el proyecto (2 puntos).
5. Respecto al Índice de Desempeño del Costo ¿Qué significa cuando es inferior a 1.0? ¿Qué significa cuando está por encima de 1.0? (2 puntos).
6. Describa qué necesidades atender para administrar el riesgo en un proyecto. ¿Cuándo debe hacerse esto? ¿Cómo puede ayudar una matriz de evaluación del riesgo en este proceso? (2 puntos).
7. ¿Cuáles son los factores fundamentales a considerar en la Gestión de Riesgos? Explicar brevemente cada factor (2 puntos).
8. Realice las siguientes acciones en la siguiente figura:
   a. Calcule los ES, EF, LS y LF y la holgura para cada actividad en la figura que se presenta a continuación e identifique la ruta crítica para el proyecto. ¿Se puede terminar el proyecto en 40 semanas? (2.5 puntos).
   b. Supóngase que en realidad la tarea "A" se terminó en 3 semanas, la tarea "B" en 12 y la "C" en 13. Calcule nuevamente el tiempo esperado de terminación del proyecto.¿En cuáles actividades se concentraría para volver a estar dentro de lo programado? (2.5 puntos).

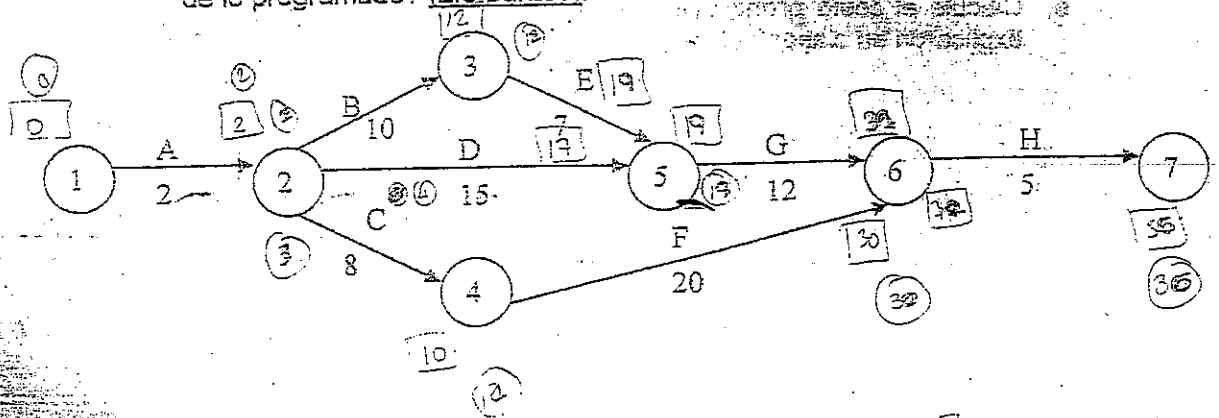

9. Desarrollar el siguiente caso de evaluación de costos:

a. ¿Cuál es el costo presupuestado acumulado al finalizar la semana 6? (1 punto)

TAREAS	CTP	SEMANA									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30	10	15	5							
2	70		10	10	10	20	10	10			
3	(40)					5	5	25	5		
4	30								5	5	20
TOTAL											
Acumulado											

Los importes son en miles de dólares

b. A continuación se presenta una tabla de costos reales. ¿Cuál es el costo real acumulado a la terminación de la semana 6? Determine si hay un exceso o un faltante de costos. ¿Qué lo está ocasionando? (1 punto).

TAREAS	SEMANA					
	1	2	3	4	5	6
1	10	15	8			
2		10	10	12	24	12
3					5	5
4						
TOTAL						
Acumulado						

Los importes son en miles de dólares

c. A continuación se presenta una tabla de los porcentajes acumulados del trabajo terminado al finalizar la semana 6 de un proyecto.¿Cuál es el valor devengado acumulado del proyecto al finalizar la semana 6? ¿Es bueno? (1 punto).

TAREAS	SEMANA					
	1	2	3	4	5	6
1	30	80	100	100	100	100
2		10	25	35	55	65
3					10	20
4						

Las cantidades son porcentajes de terminación acumulados

d. ¿Cuál es el índice de desempeño de costo al final de la semana 6? ¿Cuál es la variación de costos? (1 punto).

e. Calcule el costo pronosticado de terminación aplicando dos métodos que se explicaron en clases? (1 punto)

Prof. MSc. Fernando Noriega Bardalez
San Miguel, 02 de julio de 2009

La teoría de restricciones (TOC) puede ser aplicada en Gestión de Proyectos para identificar la limitación (recurso escaso) o el cuello de botella en el Proyecto. Si esto no es identificado, los encargados del proyecto pueden invertir mucho tiempo y dinero intentando optimizar otras actividades o recursos que al final no darán resultado pues igual se generarán demoras si es que el cuello de botella no es atacado.

En cambio, si se aplicara el análisis de la teoría de restricciones y se identificara el cuello de botella, entonces se podría invertir tiempo y dinero para optimizarlo y maximizar su capacidad. Luego se buscaría adecuar el trabajo de las demás componentes del proyecto al del cuello de botella y finalmente se buscaría aumentar la capacidad de esta restricción para así mejorar la condición total del sistema.

En mi criterio, una restricción del modelo es que engloba a solo las actividades o recursos ligados al cuello de botella pero no explica o analiza actividades no relacionadas. Por ejemplo, a lo largo de un proyecto una actividad no-cuello de botella podría convertirse en eso si es que no se controlan bien los tiempos y desempeños. En realidad, siempre debería haber un control ligado a la aplicación de la teoría de restricciones

La programación con recursos restringidos en realidad explica una re programación de actividades como consecuencia de recursos limitados en el Proyecto.

En primer lugar el gerente del proyecto o el encargado de la programación de actividades elabora la red del proyecto e identifica las holguras por actividad y el nivel de recursos a ser utilizado en cada periodo del proyecto. Luego, con la restricción de recursos que tiene (mano de obra o maquinaria) se programa las actividades, asignando mayor prioridad a las que tengan menor holgura. Esto último se debe a que el objetivo es superar las restricciones de recursos sin afectar la duración del proyecto. Finalmente, el resultado del análisis es cumplir con las restricciones de recursos en cada periodo.

Normalmente este tipo de programación se da cuando a priori se asigna al proyecto un limitado número de recursos o si el presupuesto limite la adquisición de ellos.

Para la elaboración del presupuesto del proyecto se pueden aplicar dos tipos de metodologías: top-down o botton-up.

En la primera de ellas se asigna según criterios validos el presupuesto total del proyecto a cada una de las áreas identificadas en el EDT. En la segunda se consignan los costos presupuestados de cada actividad componente de las áreas del EDT y por agregación o suma se definen los costes presupuestados por área.

A ello hay que añadirle que un buen presupuesto no solo indica los costes totales sino que en cada actividad señala el cuánto, el cuándo y el cómo del uso de los recursos. Esto permite posteriormente un buen control del desempeño del costo.

Distribución del Tiempo

(5) El índice de desempeño del costo (IDC) muestra la relación entre el valor devengado acumulado y el costo real incurrido hasta cierto periodo de análisis.


Si el IDC muestra una relación mayor a 1 quiere decir que se está siendo eficiente al 100% o más ya que por cada sol invertido realmente el avance del proyecto está siendo mayor al esperado. Esto puede hacer pensar que el presupuesto podrá ser cumplido o será menor al planificado.

En cambio si el IDC muestra una relación menor a 1 quiere decir que se está siendo ineficiente ya que por cada sol invertido realmente se está haciendo un trabajo o avance menor al presto. Esto da señales de que el presupuesto será excedido ya que se necesite más dinero para culminar las actividades.

(6) La matriz de evaluación del riesgo es útil para identificar cualitativamente cuáles son los riesgos (positivos y negativos) que tienen más probabilidad de ocurrir y lo que generan mayor impacto en el desarrollo del proyecto.

Una vez identificados los riesgos mas probables y críticos se puede realizar un análisis más profundo (cuantitativo) para establecer con mayor precisión dichos impactos. Además se pueden elaborar planes de contingencia en base a los riesgos críticos identificados.

Esta herramienta permite prestar mayor atención a los riesgos más críticos y no distraerse en los que no tienen tanta probabilidad o poco impacto.

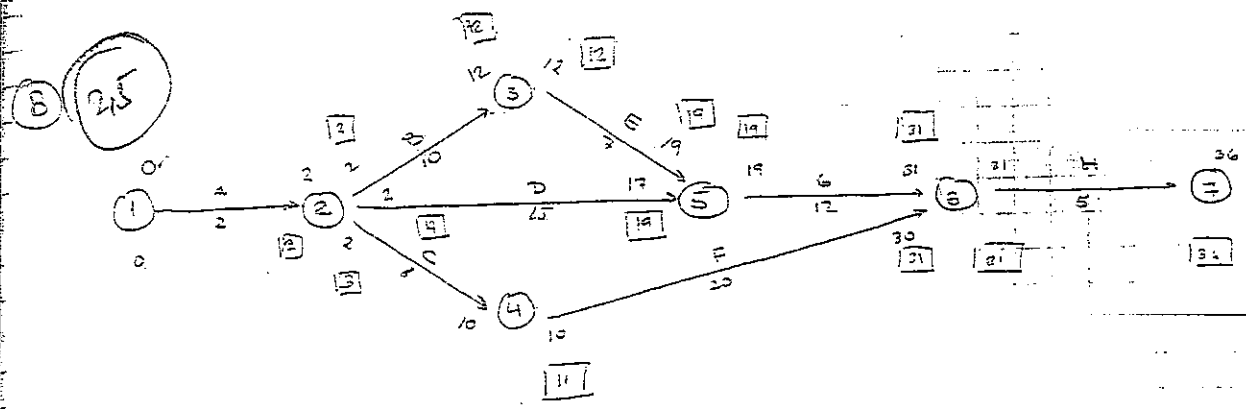


a)

Actividad	ES	EF	LS	LF	Holgura
1 → A	0	2	0 4	2 6	0
2 → B	2	12	2 6	12 16	0
3 → C	2	10	5 7	11 15	1
4 → D	2	17	4 8	19 23	2
5 → E	12	19	12 16	19 23	0
6 → F	10	30	11 15	31 35	1
7 → 6	19	31	19 23	31 35	0
8 → H	31	36	31 35	~~36~~ 40	0

Ruta crítica : A - B - E - G - H

b)

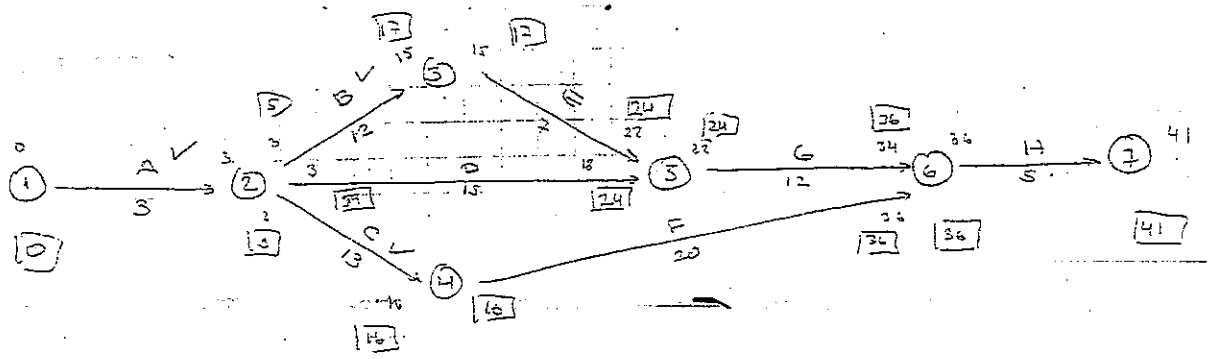

Nueva duración = 41 semanas → No se podrá terminar a tiempo (40 semanas)

Actividad	ES	EF	LS	LF	Holgura
D	3	18	9 8	24 23	6
E	~~25~~ 12	22 19	17 16	24 23	2
F	10 13	36 33	16 15	36 35	0
G	22 19	34 31	24 23	36 35	2
H	~~36~~ 37	41 38	36 35	41 40	0

Dado que ya se terminaron A, B, C → la nueva ruta crítica →

- - - H

Me concentraría en reducir el tiempo de la ruta crítica, es decir, el tiempo de duración de las actividades F y H. Si se pudiera reducir la duración de las dos juntar en una semana entonces se podría entregar a tiempo el proyecto (dentro de las 40 semanas). Por otro lado, a lo más, se podría reducir el tiempo de F y H en 2 semanas pues si se redujera más se generarían otras actividades críticas (E-G) con lo que invertiría esfuerzo en vano.

9 30

a.

Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	15	5							
2		10	10	10	20	10	10			
3					5	5	25	5		
4								5	5	20
TOTAL	10	25	15	10	25	15	35	10	5	20
ACUMULADO	10	35	50	60	85	100	135	145	150	170

10

↳ Acumulado al final de la semana 6.

b.

Tareas	1	2	3	4	5	6
1	10	16	8			
2		10	10	12	24	12
3					5	5
4					-	-
TOTAL	10	26	18	12	29	17
ACUMULADO	10	36	54	66	95	112

10

↳ Acumulado al final de la semana 6.

Hay un exceso de 12 mil dólares.

⇒ Análisis por actividad.

(Real)

Tarea	1	2	3	4	5	6
1	10	16	8			
Total	10	16	8			
Acumulado	10	26	34			

(Teórico)

1	10	15	5			
Total	10	15	5			
Acumulado	10	25	30			

⇒ Variación total = 4 000

Variación % = $\frac{4}{30}$ = 13

a)

Tarea 2	1	2	3	4	5	6
2		10	12	12	24	12
Total		10	10	12	24	12
Acumulado		10	20	32	56	68

⇒ Variación total = 8

Variación % = $\frac{8}{60}$ = 13.3

b)

2		10	10	10	20	10
Total		10	10	10	20	10
Acumulado		10	20	30	50	60

La variación del costo real sobre el total lo está provocando las actividades 1 y 2 pues ambas han excedido su presupuesto en 8.13 %.

c)

Valor devengado = % culminación * CTP

Tareas	1	2	3	4	5	6
1	9	24	30			
2		7	17.5	24.5	38.5	45.5
3					4	8
4					—	—
Devengado Total *	9	22	16.5	7	11	11
" Acumulado ²	9	31	47.5	54.5	65.5	76.5

76.5 → 83.5

↳ Devengado acumulado al final de la semana 6.

Devengado Total * → sin acumular.

Devengado Acumulado² → suma de devengados en acumular.

El valor devengado no es bueno, ya que indica que para la semana 6 no se han completado los trabajos (se refleja en el costo) como se había previsto.

d) $IDC = \frac{83.5}{112} = 0.765$ → 76.5 % no es tan eficiente < 100 %.

$VC = 76.5 - 100 = -23.5$ → se han dejado de gastar 23.5 soles, se ha trabajado o avanzado menos.
$83.5 - 112$

e)

Pronóstico 1 = $CTP * \frac{1}{IDC} = 170 * \frac{1}{0,765} = 222,22$ miles de sóla

Pronóstico 2 =

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 2
(Primer semestre 2013)

Indicaciones generales:

Duración: 2 horas y 50 minutos
La prueba es con apuntes personales. Sea **ordenado, conciso y preciso.** Escriba con letra **legible.** Presente adecuadamente su examen. Está permitido usar calculadora.
La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

Problema 1 (20 Puntos)

Revocatoria de Congresistas

Usted ha sido designado como Gestor de Proyectos para una Organización Independiente Nacional para plantear la Revocatoria de Congresistas.

En esta oportunidad se le encarga desarrollar el proyecto para la recolección de tres millones de firmas, la intención es presentar una Modificatoria Constitucional para reducir el periodo de nuestros "padres de la patria" con elecciones cada dos años, de manera de evaluar y concluir el mandato legislativo de los que resulten con la mitad o más de votos en contra.

El proyecto incluye el desarrollo de una propuesta legislativa constitucional, una evaluación costo beneficio de la propuesta además de un informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), dando por validos los tres millones de firmas.

El encargo se le hace hoy, viernes 5 de julio de 2013 en vísperas de fiestas patrias y tiene 120 días para llevarlo a cabo. Expertos en el tema sugieren el desarrollo de una prueba piloto para medir los tiempos en campo del proceso de recolección de firmas.

Los planillones conteniendo las firmas serán entregados al RENIEC para su validación, tanto en físico como en medios virtuales, para esto último, expertos en informática le sugieren la necesidad del soporte informático pertinente.

Para desarrollar su trabajo la RENIEC puede recibir entregas parciales (físicas y virtuales) de firmas antes de emitir su informe final, este informe será emitido por la RENIEC en un plazo máximo de 30 días calendario luego de recibir la última firma.

Se sabe que los planillones serán basados en la información del RENIEC, es decir contendrá como mínimo los nombres completos, apellidos, N° DNI y firma.

De un sondeo previo, se sabe usted que las personas estarían de acuerdo con el tema en un 80%, pero por desconfianza adulterarían las firmas o datos personales uno de cada 5 personas firmantes, con lo que por cada 5 firmas emitidas la RENIEC invalidaría una de las mismas.

1. El Enunciado del Alcance del Proyecto el mismo contendrá:
   - Justificación.
   - Delimitación o descripción del Proyecto.
   - Metodología (demostrando la forma de trabajo, de campo, tecnológica, la coordinación entre las partes o entidades internas y externas al proyecto).
   - Organización inicial del proyecto.
   - Desarrolle el proceso para modificar el alcance.
   - Cronograma preliminar de hitos.
   - **EDT inicial** (muestre el detalle necesario)

2. Presente su Plan de Gestión de las Comunicaciones, en el cual no deben faltar:
   - Requisitos de comunicaciones de los interesados, internos y externos.
   - Persona responsable.
   - Destinatarios.
   - Métodos para transmitir la información.
   - Frecuencia de distribución.
   - Proceso de escalamiento (plazos y cadena de mando).

0,75 - 1

3. Defina las métricas de calidad que considere necesarias para cada una de sus componentes o entregables, como las medirá.

4. Defina el Plan de Capacitación de Recursos Humanos, tenga en cuenta que tiene casi a cerca de 1000 personas trabajando y debe desarrollar su plan a nivel nacional.

5. Defina mediante flujogramas un sistema de seguimiento y control del proceso de recolección de firmas, que permita controlar las acciones de campo.

6. Han pasa 60 días y asuma que se le asignó un presupuesto para proyecto de S/. 6´000,000. Luego de un análisis del avance del proyecto obtuvo un índice de desempeño del costo (CPI) de 0.75 y una variación en el costo de - S/. 800,000. ¿Cuál sería su índice de desempeño del trabajo por completar?

7. Presente en una matriz, los principales riesgos para el proyecto, sus ponderaciones y planes de contingencia.

8. Defina para los principales recursos, cuál será el tipo de contratación, sustentando.

Profesor del curso: Martín Portugal O.

San Miguel, 5 de julio de 2,013
