PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen 2
(Primer semestre 2015)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- Materiales o equipos a utilizar: Con apuntes de clase y calculadora no programable.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional al indicado.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación**

Puntaje total: 20 puntos

Problema 1 (20 Puntos)

Revocatoria de Congresistas

Usted ha sido designado como Gestor de Proyectos para una Organización Independiente Nacional para plantear la Revocatoria de Congresistas.



En esta oportunidad se le encarga desarrollar el proyecto para la recolección de tres millones de firmas, la intención es presentar una Modificatoria Constitucional para reducir el periodo de nuestros **"padres de la patria"** con elecciones cada dos años, de manera de evaluar y concluir el mandato legislativo de los que resulten con la mitad o más de votos en contra.

El proyecto incluye el desarrollo de una propuesta legislativa constitucional, una evaluación costo beneficio de la propuesta además de un informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), dando por validos los tres millones de firmas.

El encargo se le hace hoy, viernes 10 de julio de 2015 en vísperas de fiestas patrias y tiene 120 días para llevarlo a cabo./Expertos en el tema sugieren el desarrollo de una prueba piloto para medir los tiempos en campo del proceso de recolección de firmas./

Los planillones conteniendo las firmas serán entregados al RENIEC para su validación, tanto en físico como en medios virtuales, para esto último/expertos en informática le sugieren la necesidad del soporte informático pertinente/

Scanned by CamScanner




Para desarrollar su trabajo la RENIEC puede recibir entregas parciales (físicas y virtuales) de firmas antes de emitir su informe final, este informe será emitido por la RENIEC en un plazo máximo de 30 días calendario luego de recibir la última firma.

Se sabe que los planillones serán basados en la información del RENIEC, es decir contendrá como mínimo los nombres completos, apellidos, N° DNI y firma.

De un sondeo previo, se sabe usted que las personas estarían de acuerdo con el tema en un 90%, pero por desconfianza adulterarían las firmas o datos personales 3 de cada 10 personas firmantes, con lo que por cada 10 firmas emitidas la RENIEC invalidaría 3 de las mismas. Finalmente, el costo total de proyecto se estima en 8 millones de soles.

1. El Enunciado del Alcance del Proyecto el mismo contendrá:
   - Justificación.
   - Delimitación o descripción del Proyecto.
   - Metodología demostrando la forma de trabajo de campo tecnológica, la coordinación entre las partes o entidades internas y externas al proyecto.
   - Organización inicial del proyecto.
   - Desarrolle el proceso para modificar el alcance.
   - Cronograma preliminar de hitos.
   - **EDT inicial** (muestre el detalle necesario)



2. Presente su Plan de Gestión de las Comunicaciones, en el cual no deben faltar:
   - Requisitos de comunicaciones de los interesados, internos y externos.
   - Persona responsable.
   - Destinatarios.
   - Métodos para transmitir la información.
   - Frecuencia de distribución.
   - Proceso de escalamiento (plazos y cadena de mando).

3. Muestre la ruta crítica de su proyecto.

4. Defina las métricas de calidad que considere necesarias para cada una de sus componentes o entregables, como las medirá.

Scanned by CamScanner

5. Defina el Plan de Capacitación de Recursos Humanos, tenga en cuenta que tendrá cerca de 1000 personas trabajando y debe desarrollar su plan a nivel nacional.

6. Defina mediante flujogramas un sistema de seguimiento y control del proceso de recolección de firmas, que permita controlar las acciones de campo.

7. Suponga que el cronograma proyectaba que al día de hoy usted tendría completado el 50% de la recolección de firmas. Por cada 100,000 firmas está programado costar S/. 200,000. Hoy en la reunión de estado del proyecto, usted informa que se ha completado 1250,000 firmas a un costo de $ 3800,000. ¿Cuál es el valor planeado?, comente.

8. Presente en una matriz, los principales riesgos para el proyecto, sus ponderaciones y planes de contingencia.

Profesor del curso: Martín Portugal Orejuela

Lima, 10 de julio de 2015

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)


1)

- **justificación:** Este proyecto tiene por fin elevar la calidad del trabajo por medio de una evaluación al final de 2 años de su periodo Congresal el cual dirá si este podrá continuar en el cargo o lo dejará.

- **Delimitación o Descripción del Proyecto:** El presente proyecto va a abarcar la elaboración de propuesta legislativa, recolección de firmas, evaluación del costo económico y la elevación del informe a Reniec; el proyecto va a pedir reducir el periodo congresal a 2 años y terminado este periodo se procederá a llevar elecciones para evaluar la continuidad de los congresistas que resulten con la mitad o más de votos en contra.

- **Metodología:** El trabajo principal de este proyecto es la recolección de firmas que se llevará a cabo por recolectores de firmas a pie en las calles, el registro electrónico se realizará cada fin de jornada de los recolectores pasando sus registros físicos a virtuales. Las coordinaciones internas dentro de los involucrados del proyecto va a ser directa con su líder; en la coordinación externa al público en general se comunicará por medio entrevista en medios donde las personas interesadas puedan conocer la iniciativa.

- **Organización inicial de Proyecto:**

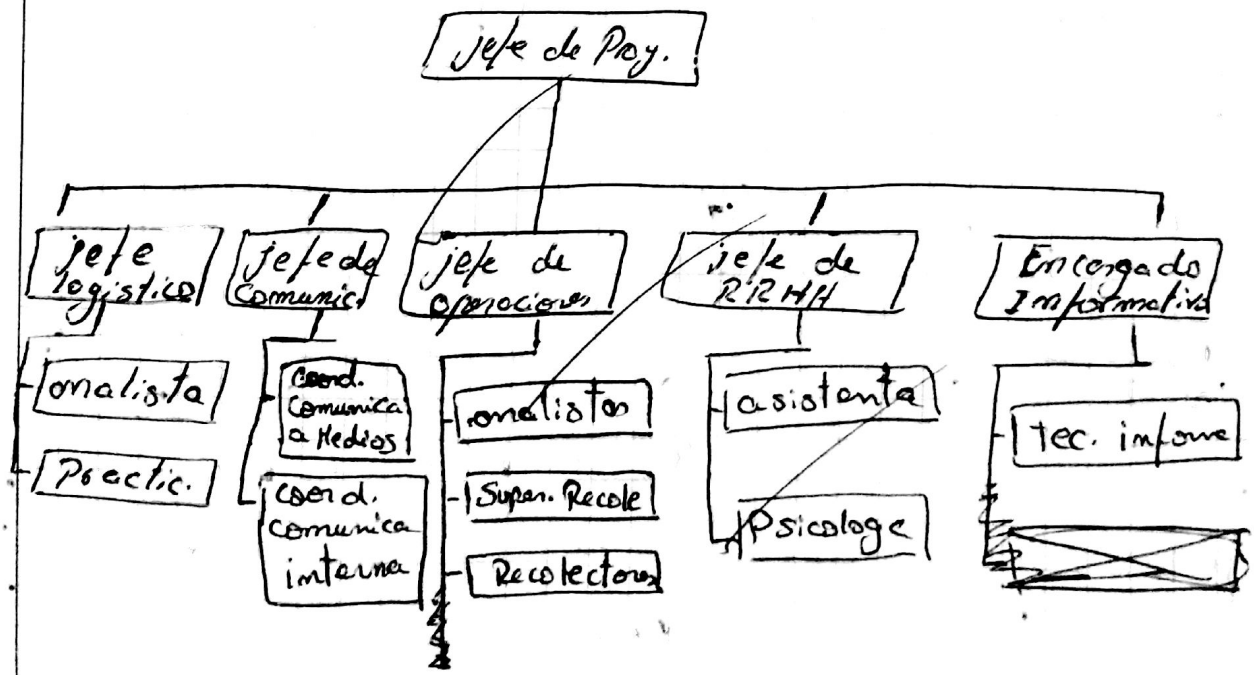

Scanned by CamScanner

• Desarrollo de modificación de alcance:

cálculos y desarrollos (borrador)

• Cronograma preliminar de hitos: se dispone de 120 días.

A)- Reunión con los jefes y encargados para uniformizar metas — 1 días

B)- Busqueda y Contratación de los enlistas, recolectores, etc. — 5 días

C)- Capacitación a recolectores, en metodología estandar para su trabajo — 2 días.

D)- Prueba piloto de recolección de firmas en campo — 7 días.

E)- Evaluación de resultados de prueba — 2 días

F)- Establecimiento de cronograma y objetivos en recolección de firmas — 2 días

G)- ~~(marca)~~ Desarrollo real de recolección de firmas — 80 días


H)- revisión de errores en recolección — 5 días

I)- recolección de firmas faltantes — 7 días

J)- elaboración de informe de resultados — 3 días

K)- entrega a Remec — 1 día

• EDT:

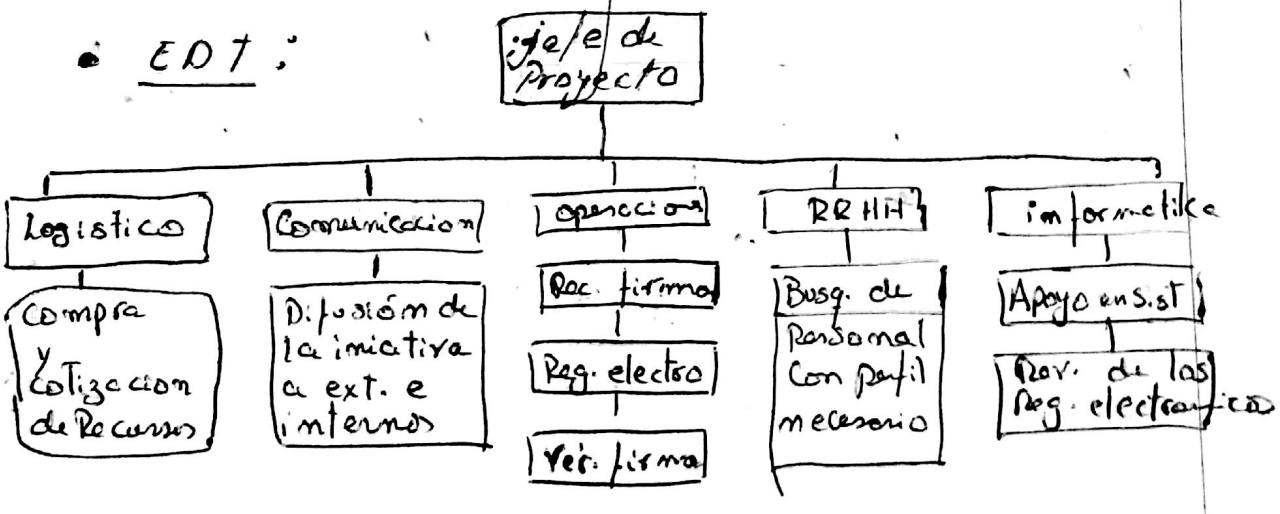

Scanned by CamScanner

Etapa	Requisitos de Comunicación	Por. Responsable	Destinatario	Met. de transmición de información
Inicio	En este periodo la comunicación entre los jefes de cada area con el jefe de proyectos debe ser continua y fluida para alineamiento de objetivos	jefe del Proyecto	jefe de los areas	- Via Correo electronico - persona a persona - via telefonica
Prueba Piloto	debe de ser continua, horizontal en especial con los recolectores para uniformizar criterios	jefe de Operaciones	Recolectores de firmas	- persona - via Correo electronico
Recolección de firmas.	Aqui el fuente ya a ser la comunicación a los interesados y externos para su apoyo con la recolección de firmas.	jefe de Comunicaciones	Interesados y publico en general	- Entrevistas en medios de comunicación para la información del publico
revisión de Resultados	- retroalimentación entre los recolectores y los analistas.	jefe de operaciones / analistas.	analistas / recolectores	- correo electronico - informes - reuniones
Elaboración de Informe	- reunión entre encargados de area y presentación y Discusion de resultados hallados.	jefes de areas	jefe de Proyecto	- reunión - informes

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclu
cálculos y d
(borra

3) Se utilizara cada hito con la letra identificada en el diagrama, adicionalmente se adicionara otros para detallar mayor el proceso.

ruta critica:

A - B - C - D - E - G - i - j - k
F

* leyenda:

hito

- Dia del progreso que el hito se termina

Scanned by CamScanner

clusiva para
y desarrollos
rador)

4)

Sub-etapa	Metricas de Calidad	Entregables
recolección de firmas (en campo)	- elección de personas al azar de diferentes edades, mayores de 18 años	—
revisión o ratificación de datos	- revisión al final de la jordana los datos recolectados con una base de Reniec	- informe diario de # de recolecciones - planilla electronica de firmas recolectadas
revisión de avance de recolección según metas	- constraste de metas con objetivos - feedback buscando Mejora, Metodologia Mejor	- envio de porcentaje de avance según meta establecida semanal.
Controles de Calidad en llenado	- llenado de conteo de errores en llenado para cuantificar posibles # de rechazo	- informe intermedio de hallazgo de errores y cuantificación de firmas necesarias.

5)

Debido a la gran importancia que tienen los recolectores de firmas en este proyecto. Se les dara una capacitación especial.

- Personal interno: Se les dara una presentación del proyecto buscandolos comprometer con el objetivo. Se les hablara del beneficio potenciales del logro de este proyecto. Finalmente se les Objetivos esperados de sus puestos.

Scanned by CamScanner


Presente aquí su trabajo

Zor
cálc

- Recolectores de firmas: Ellos aparte de recibir lo que los anteriores colaboradores recibieron adicionalmente tendrán los siguientes capacitaciones:
  - Metodos de entrevistas en campo (para poder elegir al azar al público)
  - reconocimiento de autenticidad de firma (al momento de ratificación)
  - Capacitación en correcto llenado de planillas.
  - Capa. en uso en medios electrónicos para llenado de planillas.

* a los que se encuentran fuera de lima se les capacitara a través de un consulto externo en los mismos temas.

6)

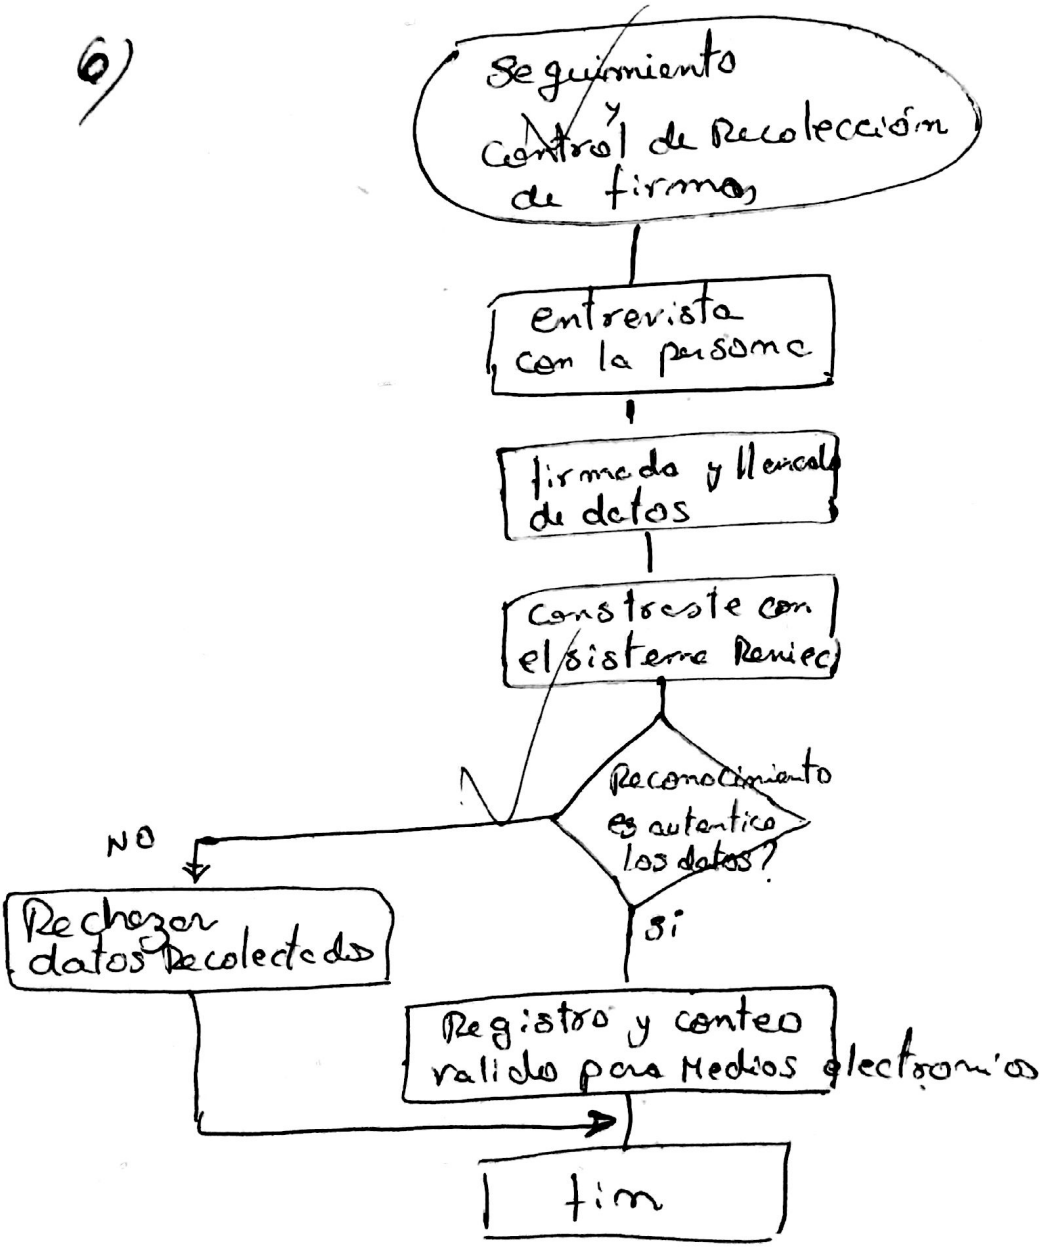

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

7)

de firmas necesarias : 3 000 000

3 de cada 10 adulteraron sus datos, solo hay un 70% de veracidad en firmas

de firmas requeridas : $\frac{3\,000\,000}{70\%} = 4285714,3 \approx 4285715$

Proyectado : $\frac{S/.\ 200\,000}{100\,000 \text{ firmas}} \cdot 4285715 \text{ firmas}$

: S/. 8'571,430

ploneado : $\frac{S/.\ 3800000}{125000 \text{ firma}} \cdot 4285715 \text{ firmas}$

: 13'028,571

Se considero en vez de # 3800 000, se considero S/. 3800 000.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

8)

Riesgos	0 - 100 % Probabilidad	1 - 5 Impacto	P x I
No alcanza de firmas necesarios	0,30	3	1,5
# mayor de firmas invalidas	0,40	3	1,2
# insiciante de recolectores	0,15	3	0,45
Aumento del costo por firma recolectada	0,20	3	0,6
Demora en los plazo planeados	0,20	4	0,8

Planes de Contingencia:

- No alcanzar el numero de firmas: para este riesgo habria que aumentos el numero de recolectores y buscar cubrir areas no consideradas inicialmente en plan proyectado.
- Numero mayor de firmas invalidas: para esto sera necesario aumentar el numero de recolectores y aumentar los controles para evitar el ~~mal~~ numero de rechazos por mal llenado.
- Demora en los plazo planeados: Aqui se buscara establecer apoyo a los encargados de alguna tarea critica para evitar demora en sus plazos de entrega.

Scanned by CamScanner
